



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº599/2023

Mococa, 23 de junho de 2023.

Ref. Requerimento nº65/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>- MOCOCA -</b>		
<b>PROTOCOLO</b>		
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>RÚBRICA</b>
1556	23/06/23	RD

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº65/2023, de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Adriana Batista da Silva, José Antônio Sousa e Thiago José Colpani, aprovado pelo Plenário dessa Casa de Leis, informamos que de acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, o que segue:

“Resposta item 1) Documentação em anexo.

Resposta item 2) Documentação em anexo.

Resposta item 3) Documentação em anexo.

Resposta item 4) Em todas as visitas estavam presentes funcionários, exceto na semana do “Carnaval”, onde não houve por parte da empresa os trabalhos na unidade, em anexo contrato.

Resposta item 5) Reiteramos que todo serviço é comunicado para a empresa, porém ressaltamos que a obra “ainda” não está finalizada.”

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

  
**Eduardo Ribeiro Barison**  
Prefeito Municipal de Mococa

Exmo. Sr.  
**GUILHERME DE SOUZA GOMES**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa  
Nesta



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**Resposta do**  
**Requerimento**  
**65/2023**

**Volume 01/03**

  
Eduardo Ribeiro Barison  
Prefeito Municipal de  
Mococa



# CONSTRUTORA HGB

OFÍCIO 007/2023

Tambaú – SP, 01 de março de 2023.

A  
Prefeitura Municipal de Mococa – SP.  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Tomada de Preços nº 003/2022 – Contrato nº 011/2022 – Processo nº 105/2022  
Objeto: Reforma e Adequação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

## RESPOSTA AO RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

A CONSTRUTORA HGB LTDA., CPF/CNPJ nº 16.898.251/0001-75, com endereço para correspondência à Rod. Padre Donizetti KM 1, S/N – Zona Rural – Tambaú/SP, CEP 13.710-000, telefone para contato (19) 99231-7012, vem através de seu procurador abaixo assinado, em resposta ao relatório de visita técnica conforme documento em anexo, os seguintes itens:

Resposta ao item 1) Os vidros instalados no local onde serão colocados os domus são provisórios, estando ali apenas para proteção da chuva, não sendo o serviço final conforme solicitado em planilha.

Resposta ao item 2) A técnica aplicada com o selador, são justamente para aparecerem as trincas que não são visíveis a olho nu, aparecendo após aplicação do mesmo para que as mesmas sejam reparadas e não haverem problemas futuros.

Resposta ao item 3) Os serviços de pintura interna ainda não estão prontos, sendo o mesmo caso citado na resposta do item 2, as correções serão feitas antes da aplicação da pintura para evitar problemas futuros.

Resposta ao item 4) Sim, os mesmos estão em andamento conforme projeto e memorial, como toda a obra está sendo feita.

Resposta ao item 5) Em reunião feita no dia 27/02/2023 junto ao Diretor do Departamento de Obras o Sr. Renan, foi nos passado que haverá mudança em sala, não sendo mais sala destinada ao atendimento odontológico, sendo que os detalhes poderão ser consultados junto ao Departamento de Obras da Prefeitura de Mococa.

Sem mais para o momento e reiterando os votos de mais elevada estima e consideração.

16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambaú - SP

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

CONSTRUTORA HGB LTDA.

Guilherme Henrique Bueno

Engenheiro Civil

CREA/SP 0010547000

CARIMBO:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Setor de Licitações**

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3656-9800

E-mail: [licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br](mailto:licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br)

**1º TERMO ADITIVO CONTATO 011/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOCOCA E A EMPRESA CONSTRUTORA HGB LTDA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO).**

O MUNICÍPIO DE MOCOCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 44.763.928/0001-01, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **EDUARDO RIBEIRO BARISON**, brasileiro, casado, portador do RG. nº 20.199.044-1 SSP/SP e do CPF/MF nº 158.646.488-41, residente e domiciliado na cidade de Mococa/SP, na Rua Dr. Luiz Antônio Fernandez Dias, n.º 196 – Jardim São Luiz, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA HGB LTDA**, firma estabelecida à Rodovia Padre Donizetti, Km 1, S/N, Zona Rural, Tambaú SP, CEP 13.710-000 inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 16.898.251/0001-75 e Inscrição Estadual 680.020.310.111, representada neste ato por **GUILHERME HENRIQUE BUENO**, portador do CPF 415.549.728-09e do RG 40.032.160-9 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, Nº610, Vila Maria, Tambaú SP, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si certo e ajustado o presente **TERMO ADITIVO**, conforme cláusulas e condições a seguir transcrita: Referente **Processo 105/2022 e Tomada de Preço 003/2022**

**CLAUSULA PRIMEIRA**

Fica **Aditado o Contrato 011/2022**, celebrado entre as partes para **prorrogação do prazo, dando início em 12 de janeiro de 2023 e seu termino em 12 de Abril de 2023.**


**CLAUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas do contrato original e firmado anteriormente mantem-se inalteradas e são nesta oportunidade ratificadas

**CLAUSULA TERCEIRA**

E por estarem juntos e acertados as partes firmam o presente Termo Aditamento em 03 (três) vias de igual teor.

Mococa, 09 de janeiro de 2023

  
**EDUARDO RIBEIRO BARISON**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Contratante

GUILHERME HENRIQUE Assinado de forma digital por  
BUENO:41554972809 GUILHERME HENRIQUE  
BUENO:41554972809  
Dados: 2023.01.09 12:58:32 -03'00'

**CONSTRUTORA HGB LTDA**

Contratado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Setor de Licitações**

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa/SP  
Fone: (19) 3656-9800  
E-mail: [licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br](mailto:licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br)


**TESTEMUNHAS:**


\_\_\_\_\_  
Nome: Jeferson Puciareli Geraldo  
RG: : 30.192.703-0

\_\_\_\_\_  
Nome: Renan Augusto de Carvalho  
CREA/SP 5070103369

GUILHERME  
HENRIQUE  
BUENO41554972809

Assinado de forma digital  
por GUILHERME HENRIQUE  
BUENO41554972809  
Data: 2023.01.09 12:58:45  
-03'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Setor de Licitações**

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3656-9800

E-mail: [licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br](mailto:licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br)

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CONTRATADO: **CONSTRUTORA HGB LTDA**

**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 011/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (UPA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (\*)Eduardo Paulino de Araujo

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mococa, 09 de janeiro de 2023

GUILHERME  
HENRIQUE  
BUENO:41554972  
809

Assinado de forma digital  
por GUILHERME HENRIQUE  
BUENO:41554972809  
Data: 2023.01.09 12:58:59  
-03'00'

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/50

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

10/10/50

SA, NEW YORK

[Illegible]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Setor de Licitações**

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3656-9800

E-mail: [licitacao.cpi@mococa.sp.gov.br](mailto:licitacao.cpi@mococa.sp.gov.br)

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: EDUARDO RIBEIRO BARISON

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 158.646.488-41

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: EDUARDO RIBEIRO BARISON

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 158.646.488-41

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: EDUARDO RIBEIRO BARISON

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 158.646.488-41

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: GUILHERME HENRIQUE BUENO

Cargo: Engenheiro/ Procurador

CPF: 415.549.728-09 GUILHERME HENRIQUE

Assinatura: \_\_\_\_\_

BUENO:41554972809

Assinado de forma digital por

GUILHERME HENRIQUE

BUENO:41554972809

Dados: 2023.01.09 12:59:13 -03'00'

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico

1912  
The Board of Directors  
of the  
Company  
has the honor to  
acknowledge the  
receipt of your  
check for the  
amount of \$100.00  
dated 1/1/12.

Very truly yours,  
The Board of Directors

Enclosed for you are  
the following  
statements of  
account for the  
year ending  
12/31/11.

Yours very truly,  
The Board of Directors

Very truly yours,  
The Board of Directors

Very truly yours,  
The Board of Directors

Very truly yours,  
The Board of Directors

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.18  
0413800413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 130.132-2  
EFETUADO POR: ANTONIO C VITORINO

Convenio ARREC. TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 8166000027-6 39082714202-2  
30330206600-4 00000000943-1  
Data do pagamento 01/03/2023  
Valor em Dinheiro 2.739,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.739,08

DOCUMENTO: 030108  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.616.CF7.A0D.7F6.C20

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO 01/03/2023 13:09:02  
JE664074 ANTONIO C VITORINO 01/03/2023 13:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

G3340213211387271  
02/03/2023 13:30:58



TED

Debitado


Agência 413-8  
Conta corrente 130132-2 PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Valor 83.574,59  
Data transferência 02/03/2023  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 189511404.  
Usuário: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.





## Boletos, convênios e outros

G3380112471841971  
01/03/2023 13:09:02

### Ciente

Agência 413-8  
Conta corrente 130132-2 PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS

Código de barras lido 81660000027390827142023033020660000000000943  
Data pagamento 01/03/2023  
Valor documento 2.739,08

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 189063578.

Usuário: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 413-8  
Conta corrente 130132-2 PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.204  
Valor 83.574,59  
Destinação 0  
Data transferência 02/03/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7423B4AECF1578E2  
Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO  
JE664074 ANTONIO C VITORINO

02/03/2023 13:30:58

02/03/2023 15:01:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho .....: 01410 de 17/01/2023

Processo .....: T00003-20

Fornecedor .....: 07076 CONSTRUTORA HGB LTDA.

Descricao .....: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDI  
MENTO

Classificacao da Despesa No. 00169

Institucional

Orgao .....: 07 S.m de engenharia e infraest.urbana  
Unidade Orcamentaria: 01 Manut s.m de engenharia e infraest.urban  
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 15 Urbanismo  
Subfuncao .....: 452 Servicos urbanos  
Programa .....: 0062 Vias urbanas  
Acao .....: 2010 Manutencao da diretoria de obras

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.51.91 - Obras em andamento

Data Liquidacao .....: 17/01/2023

Responsavel .....: ANTONIO CARLOS VITORINO

Documento Fiscal .....: NOTA FISCAL 0000000975

Data da Exigibilidade.: 28/03/2023

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao... 1100000 GERAL


Antonio Carlos Vitorino  
Secretário Municipal  
de Finanças

Valor da Liquidacao .....:

86.313,67

Nº E	Conta	Banco Brasil
48550	130132-2	LC.M.S.
Ch.		RS 82.574,59
Ch.		RS 2.339,08
Ch.		RS 1.399,99

Sinal  
4376  
c/ 590





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
CONSTRUTORA HGB LTDA.	07076
C.N.P.J.: 16.898.251/0001-75	

Descricao	Data	Processo	Empenho
REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDI MENTO	17/01/2023	T00003-2022	01410

Tipo

ORDINARIO

Fonte	01 TESOURO	Desp	00169
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil

## Classificacao

Institucional

Orgao .....	07	S.m de engenharia e infraest.urbana
Unidade Orcamentaria:	01	Manut s.m de engenharia e infraest.urban
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao .....	15	Urbanismo
Subfuncao .....	452	Servicos urbanos
Programa .....	0062	Vias urbanas
Acao .....	2010	Manutencao da diretoria de obras


Natureza da Despesa...:

4.4.90.51.91	Obras em andamento
--------------	--------------------

Dotacao .....	673.034,39
Saldo Anterior .....	673.034,39
Esta Nota .....	86.313,67
Saldo da Dotacao .....	586.720,72

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

  
 ANTONIO CARLOS VITORINO  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 391.023.438-00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 975
Data de Emissão 17/01/2023
Data e Hora da Competência 17/01/2023 às 13:52:24
Código de Verificação 9522-9362-7538



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 E-mail Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA - XV DE NOVEMBRO Número 360  
 Bairro CENTRO CEP 13730-020  
 Município MOCOCA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	54.781,6300	1,00	5,00	54.781,63
12	MATERIAL	31.532,0400	1,00	0,00	31.532,04

Valor Total dos Serviços - R\$86.313,67

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UPB (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 011/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 NPJ: 16.898.251/0001-75

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2739,08 (3.17%) Fonte IBPT

*Reinvaldo de Carvalho*  
 Diretor do Dep. de Obras  
 CREA 50701/03369

**TRIBUTOS**

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)  
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86.313,67**

Atividade 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O  
 Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto  
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Sim Tomador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Local de Prestação  
 Normal Fora do Município MOCOCA - SP  
 Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)  
 5,0000 54.781,63 31.532,04 2.739,08 2.739,08

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 83.574,59**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/autenticadocumento>)





TED

G3380815313856601  
08/09/2022 15:44:26

Debitado

Agência 413-8  
Conta corrente 10033-1 P M M FUNDO MUNIC SAUDE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Valor 13.955,05  
Data transferência 08/09/2022  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 131887007.

Usuário: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 413-8  
Conta corrente 10033-1 P M M FUNDO MUNIC SAUDE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 90.809  
Valor 13.955,05  
Destinação 0  
Data transferência 08/09/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9346F3CB894AAD83

---

Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO  
JF820521 FABIO DELDUCA SILVA

08/09/2022 15:44:26  
08/09/2022 16:06:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF820521 FABIO DELDUCA SILVA.

144



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nota de Liquidação

Data: 14/07/2022  
Nº da Liquidação: 13719/22  
Ordinário  
Processo: AF-4284/2022

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
Município: Mococa

01/07 OK

Órgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Funcional: 15.451.0070 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 1.048 - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Outras Obras E Instalações  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000665  
Nº Docto. Fiscal: 920  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	10621/22	Liquidações Anteriores	0,00
Valor do empenho:	14.188,61	Valor da liquidação:	14.188,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.188,61	Total (B):	14.188,61
		Saldo (A - B):	0,00

Or: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN - \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75

Cidade: TAMBAU  
Inscr. Est./Ident. Prof.: 680020310111

UF: SP

Especificação: 1

REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP (Licitação Nº: 3/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	14.188,61
------------------------------	--------------	-----------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 14.188,61 (quatorze mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Modelo licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 105/2022 Data: 27/04/2022  
Contrato: 011/2022 Data: 08/05/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 14/07/2022  
Responsável

ANTONIO CARLOS VITORINO  
Diretor de Finanças

Brasil Reforma e Adeq UPA  
0/43.103-6

Nº Bc	Conta	Banco Brasil
48544	10.033-1	Fundo M. R. Saúde
Ch		R\$ 10.555,00
Ch		R\$
Ch		R\$ 200,00

10/11/11

10/11/11



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 4284/2022

Processo Administrativo: 108/2022  
Processo Nr.: 105/2022  
Data do Processo: 11/03/2022  
Data da Homologação: 27/04/2022  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 27/04/2022

TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 3/2022 - TP

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 10621)

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1,SN - \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: TAMBAU - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: Recursos Estadual  
Dotações Utilizadas: 1.048.4.4.90.51.00.00.00.00 (665) - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
Objeto da Compra: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP

Observações:


Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,021	SV	REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (212-06-0315)		682.986,39	14.188,61

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	14.188,61
Desconto:	0,00
Total Líquido:	14.188,61

Mococa, 14 de Julho de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECLARAÇÃO**

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Mococa,  
D

E

C

L

A

R

A para os devidos fins que está de acordo com a 1º medição no valor **R\$ 14.188,61** (quatorze mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) Nota Fiscal nº 920, referente à Prestação de Serviço para realização da Reforma e adaptação do prédio da UPA Unidade de Pronto Atendimento de Mococa-SP. Contrato nº 011/2022, Processo Licitatório nº 105/2022, Tomada de Preço nº 003/2022.

1. Nota fiscal da 1ª medição;
2. Relatório Fotográfico de 1º Medição;
3. Certidão negativa de débitos;
4. Requerimento da Empresa Contratada Solicitando a 1º Medição;
5. Planilha referente à 1ª medição;
6. Certidão positiva de débitos;
7. Documento de arrecadação da Receita Federal.
8. Relatório diário de obra.
9. Relação de funcionários alocado em obra.


Por ser verdade, firma a presente declaração.

Mococa – SP, 11 de Julho de 2022.

RENAN AUGUSTO DE  
CARVALHO:358567158  
61

Assinado de forma digital por  
RENAN AUGUSTO DE  
CARVALHO:35856715861  
Dados: 2022.07.12 11:21:27 -03'00'

**Renan Augusto De Carvalho**  
**Diretor Departamento de Obras**  
**CREA: 5070103369**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	920
Data de Emissão	08/07/2022
Data e Hora da Competência	08/07/2022 às 08:02:10
Código de Verificação	1646-1272-1211

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/E 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAU UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**Autenticação**



CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01

Inscrição Mun. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nome RG/E

E-mail Telefone

Inf. Comp. Número 360  
 Logradouro RUA-XV DE NOVENBRO CEP 13730-020  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Município MOCOCA País BRASIL  
 Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	4.671,25000	1,00	5,00	4.671,25
12	MATERIAL	9.517,36000	1,00	0,00	9.517,36

Valor Total dos Serviços - R\$14.188,61

**INFORMAÇÕES RELEVANTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA AVENIDA MONSENHOR DEMOSTHENES PARANA BRASIL PONTES, Nº 1655 - ÁREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 01/12/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022

DADOS BANCÁRIOS:  
 SICOOB CREDICUJAR  
 AGENCIA 4376  
 CC: 98006-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 233,56 (1,65%) Fonte: IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.188,61**

**Atividade**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Alíquota (%)

5,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.671,25

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

9.517,36

Local de Prestação

MOCOCA - SP

Vlr. Total Retido (R\$)

233,56

Vlr. do ISS (R\$)

233,56

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.955,05**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta cópia deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças - (<http://189.108.183.34:11000/assonine/servlet/autenticadocumento>)

Recibí (emos) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly containing a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, showing further progression of the document.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 96.029,39
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 01004

<b>Data de Débito:</b>	04/05/2023
<b>Data da Operação:</b>	04/05/2023 - 15:18:18
<b>Código da Operação:</b>	44294425

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
391.023.438-00

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho .....: 04110 de 28/03/2023 Processo .....: T00004-2022

Fornecedor .....: 07076 CONSTRUTORA HGB LTDA.

Descricao .....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE  
SERVICOS, NA EXECUCAO DE DIVERSAS OBRAS

## Classificacao da Despesa No. 00995

## Institucional

Orgao .....: 10 S.m de educacao  
Unidade Orcamentaria: 02 Manutencao do ensino fundamental  
Unidade de Despesa ..: 00

## Programa de Trabalho

Funcao .....: 12 Educacao  
Subfuncao .....: 365 Educacao infantil  
Programa .....: 0078 Educacao para todos  
Acao .....: 2064 Manutencao do ensino infantil - pre escolaNatureza da Despesa ...:  
4.4.90.51.91 - Obras em andamento

Data Liquidacao .....: 02/05/2023

Responsavel .....: ANTONIO CARLOS VITORINO

Documento Fiscal .....: NOTA FISCAL 0000001004

Data da Exigibilidade.: 27/05/2023

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao... 2130001 EDUCACAO INFANTIL- PRE ESCOLA - MARIA H S CONVERSO

Nº Bc.	Conta	Caixa Federal
56456	006.672007-2	QSE - FNDE
		R\$
		R\$
		R\$

Valor da Liquidacao .....: 98.363,49

EMITENTE

KESIA MARTINELLI  
FISCAL TRIBUTARIO  
CPF-171.925.848-19

Antonio Carlos Vitorino  
Secretário Municipal  
de Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
CONSTRUTORA HGB LTDA.	07076
C.N.P.J.: 16.898.251/0001-75	

Descricao	Data	Processo	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, NA EXECUCAO DE DIVERSAS OBRAS	28/03/2023	T00004-2022	04110

Tipo

ORDINARIO

Fonte	05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Desp	00995
C.Api	2130001 EDUCACAO INFANTIL- PRE ESCOLA - MARIA H S CONVER		

Processo Contabil

## Classificacao

Institucional

Orgao .....	10	S.m de educacao
Unidade Orcamentaria:	02	Manutencao do ensino fundamental
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao .....	12	Educacao
Subfuncao .....	365	Educacao infantil
Programa .....	0078	Educacao para todos
Acao .....	2064	Manutencao do ensino infantil - pre escola

Natureza da Despesa...


4.4.90.51.91	Obras em andamento
--------------	--------------------


Dotacao .....	391.241,81
Saldo Anterior .....	391.241,81
Esta Nota .....	98.363,49
Saldo da Dotacao .....	292.878,32

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA


ANTONIO CARLOS VITORINO  
DIRETOR DE FINANÇAS  
391.023.438-00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 1004
Data de Emissão 27/04/2023
Data e Hora da Competência 27/04/2023 às 16:15:23
Código de Verificação 4782-3086-1244

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
	CNPJ	16.898.251/0001-75	Cód. Mobiliário	746182
	Nome	CONSTRUTORA HGB LTDA	Insc. Mun.	546768
	Logradouro	RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332	RG/IE	680.020.310.111
	Bairro	ZONA RURAL	Número	0
	Município	TAMBAU	CEP	13710-000
			UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional			
Telefones	3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR			
E-Mail's				



TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	44.763.928/0001-01	RG/IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	Telefone	
E-mail			
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - XV DE NOVEMBRO	Número	360
Bairro	CENTRO	CEP	13730-020
Município	MOCOCA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	46.682,0000	1,00	5,00	46.682,00
12	MATERIAL	51.681,4900	1,00	0,00	51.681,49
Valor Total dos Serviços - R\$98.363,49					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, LOCALIZADA NA EMPG PROF MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, ÁREA RURAL DE MOCOCA - CEP 13.749-899 - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 043/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022  
 PROCESSO Nº 170/2022


PEDIDO DE COMPRA Nº 002522/2023-01  
 PROCESSO T00004/2022  
 EMPENHO: 04110  
 ANOTAÇÕES: 02008/2023

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 69008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

  
**Renan Augusto de Carvalho**  
 Diretor de Dep. de Obras  
 CREA: 0070103389

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2334,10 (2,37%) Fonte IBPT

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Recargas (R\$)	Outros Tributos (R\$)
	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.363,49

Atividade

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

MOCOCA - SP

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Líquido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

5,0000

46.682,00

51.681,49

2.334,10

2.334,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 96.029,39

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/serv/es/haautenticadocumento>)


Recebi(emos) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.271/0001-75

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1004 emitida em 27/04/2023 às 16:15:23 - Cód Verif 4782-3086-1244

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/04/2023 Valor Total R\$ 98.363,49 Valor Líquido R\$ 96.029,39

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 82.688,64
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 01003

<b>Data de Débito:</b>	04/05/2023
<b>Data da Operação:</b>	04/05/2023 - 15:22:59
<b>Código da Operação:</b>	44639561

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
391.023.438-00

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MOCOCA PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00000031-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0413/130132-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 142.300,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	04/05/2023
<b>Data da Operação:</b>	04/05/2023 - 13:40:42
<b>Código da Operação:</b>	37087849

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
391.023.438-00

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**CADASTRAR FAVORECIDO**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MOCOCA PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00000031-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0413/130132-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
<b>CPF/CNPJ</b>	44.763.928/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$142.300,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	04/05/2023
<b>Data da Operação:</b>	04/05/2023
<b>Código da Operação:</b>	00144168
<b>Chave de Segurança:</b>	5KXY223LNPL9VPU8

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	036.377.418-14
	391.023.438-00

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
CONSTRUTORA HGB LTDA.	07076
C.N.P.J.: 16.898.251/0001-75	

Descricao	Data	Processo	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, NA EXECUCAO DE DIVERSAS OBRAS	28/03/2023	T00004-2022	04111

Tipo

ORDINARIO

Fonte	05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Desp	00995
C.Apl	2130001 EDUCACAO INFANTIL- PRE ESCOLA - MARIA H S CONVER		

Processo Contabil

## Classificacao

Institucional

Orgao .....	10	S.m de educacao
Unidade Orcamentaria:	02	Manutencao do ensino fundamental
Unidade de Despesa..:	00	

Programa de Trabalho

Funcao .....	12	Educacao
Subfuncao .....	365	Educacao infantil
Programa .....	0078	Educacao para todos
Acao .....	2064	Manutencao do ensino infantil - pre escola


Natureza da Despesa..:

4.4.90.51.91	Obras em andamento
--------------	--------------------

Dotacao .....	391.241,81
Saldo Anterior .....	292.878,32
Esta Nota .....	84.397,83
Saldo da Dotacao .....	208.480,49

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

  
 ANTONIO CARLOS VITORINO  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 391.023.438-00

1523



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
1003

Data de Emissão  
27/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
27/04/2023 às 16:12:09

Código de Verificação  
1366-1269-5152

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ: 16.898.251/0001-75    Cod. Mobiliário: 746182    Insc. Mun.: 546768  
 Nome: CONSTRUTORA HGB LTDA    RG/IE: 680.020.310.111  
 Logradouro: RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332    Número: 0  
 Bairro: ZONA RURAL    CEP: 13710-000  
 Município: TAMBAÚ    UF: SP

Autenticação



Situação: Não Optante do Simples Nacional  
 Telefone: 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 44.763.928/0001-01    RG/IE: 0  
 Inscrição Mún.:    Cod. Mobiliário: 0  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA    Telefone:  
 E-mail:  
 Inf. Comp.:  
 Logradouro: RUA - XV DE NOVEMBRO    Número: 360  
 Bairro: CENTRO    CEP: 13730-020  
 Município: MOCOCA    UF: SP  
 Complemento:    País: BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	34.183,8600	1,00	5,00	34.183,86
12	MATERIAL	50.213,9700	1,00	0,00	50.213,97

Valor Total dos Serviços - R\$34.397,83

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, LOCALIZADA NA EMPG PROF MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, ÁREA RURAL DE MOCOCA - CEP 13.749-899 - MOCOCA/SP. CONTRATO Nº 043/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022.

PEDIDO DE COMPRA Nº 002523/2023-01  
 PROCESSO T00004/2022  
 EMPENHO: 04111  
 REQUISIÇÕES: 02007/2023


DADOS BANCÁRIOS:  
 SICOB CREDICUAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

*Renan Augusto de Carvalho*  
 Renan Augusto de Carvalho  
 Diretor do Dep. de Obras  
 CREA: 5070103369

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1709,19 (2.03%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84.397,83

Atividade

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação

Uso de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Sim

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Local de Prestação

Normal

Fora do Município

MOCOCA - SP

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

5,0000

34.183,86

50.213,97

1.709,19

1.709,19

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 82.688,64

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/fissonline/servlet/haenticadocumento>)


Recebidor do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1003 emitida em 27/04/2023 às 16:12:09 - Cód Verif 1366-1269-5152

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/04/2023 Valor Total R\$ 84.397,83 Valor Líquido R\$ 82.688,64

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 34.140,50
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 0949

<b>Data de Débito:</b>	29/09/2022
<b>Data da Operação:</b>	29/09/2022 - 15:52:04
<b>Código da Operação:</b>	03916274

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
391.023.438-00

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**CADASTRAR FAVORECIDO**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$34.140,50
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 0949

<b>Data de Débito:</b>	29/09/2022
<b>Data da Operação:</b>	29/09/2022
<b>Código da Operação:</b>	00158856
<b>Chave de Segurança:</b>	LT2MZVL8X74EVTUN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
391.023.438-00
158.603.798-62

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 949
Data de Emissão 22/09/2022
Data e Hora da Competência 22/09/2022 às 16:11:47
Código de Verificação 3611-6530-6291



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAÚ UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 E-mail  
 At. Comp. Telefone  
 Logradouro RUA - XV DE NOVEMBRO Número 360  
 Bairro CENTRO CEP 13730-020  
 Município MOCOCA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	29.179,0500	1,00	5,00	29.179,05
12	MATERIAL	6.420,4000	1,00	0,00	6.420,40

Valor Total dos Serviços - R\$35.599,45

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, LOCALIZADA NA EMPG PROF MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, ÁREA RURAL DE MOCOCA - CEP 13.749-699 - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 043/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022  
 PROCESSO Nº 170/2022

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDICUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 58008-6  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 NPJ: 16.898.251/0001-75

*Christian Alberto L. B. de Freitas*  
 Diretor do Depto. Educação

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1458,95 (4,10%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Christian Alberto L. B. de Freitas  
 Diretor do Depto. Educação  
 RG 19.548.883-0

a.F. 5802  
 emp. 14276  
 proc. 170/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.599,45

2022 1 4

Atividade

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Sim	Tomador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação		
Normal	Fora do Município	MOCOCA - SP		
Aliquota (%)	Base de Calc. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. de IBS (R\$)
5,0000	29.179,05	8.420,40	1.458,95	1.458,95

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 34.140,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://109.103.183.34:11000/issonline/servlet/autenticadocumento>)



Nome(s) da Prestadora: CONSTRUTORA HOB LTDA CNPJ: 16.208.251/0001-73

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 949 emitida em 22/09/2022 às 16:11:47 - Cód Verif 3611-6530-6291

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/09/2022 Valor Total R\$ 35.599,45 Valor Líquido R\$ 34.140,50

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 5802/2022

Processo Administrativo: 173/2022  
Processo Nr.: 170/2022  
Data do Processo: 03/05/2022  
Data da Homologação: 01/06/2022  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 01/06/2022

TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 4/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 14276)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 10 - Departamento de Educação  
Unidade: 02 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: ENSINO INFANTIL FEDERAL  
Dotações Utilizadas: 2.064.4.4.90.51.00.00.00 (358) - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE)  
  
Observações: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,063	SV	REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE) (212-06-8988)		566.429,59	35.599,45

<b>Total Geral:</b>	35.599,45
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	35.599,45

(Valores expressos em Reais R\$)

Mococa, 26 de Setembro de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Nota de Liquidação

Data: 27/09/2022  
Nº da Liquidação: 17593/22  
Ordinário  
Processo : AF-5802/2022

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
Município: Mococa

OK

Órgão: 10 - Departamento de Educação  
Unidade: 10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Funcional: 12.365.0078 - EDUCAÇÃO PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.00.05.0210 (0210) - Outras Obras E Instalações  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000358  
Nº Docto. Fiscal: 949  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	14276/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	35.599,45	Valor da liquidação:	35.599,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	35.599,45	Total (B):	35.599,45
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75

Cidade: Tambaú  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 680020310111  
UF: SP

Especificação: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE) (Licitação Nº: 4/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 35.599,45

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 35.599,45 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 170/2022 Data : 01/06/2022  
Contrato : 043/2022 Data : 06/07/2022


Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 27/09/2022

Responsável

TONIO CARLOS VITORINO  
Diretor de Finanças

Nº Bc.	Conta	Caixa Federal
56456	008.672007-2	QSE - FNDE
		R\$
		R\$ 34.140,51
		R\$

Nº Bc.	Conta	Banco Brasil
48562	14.893-8	Cesse - FNDE
Ch.		R\$
Ch.		R\$ 1.458,95
Ch.		R\$





## Boletos, convênios e outros

G3322916213834371  
29/09/2022 16:31:26

### Cliente

---

Agência 413-8  
Conta corrente 14693-5 PM MOCOCA-QSE

---

Código de barras lido 81640000014589527142022113001316206400000011  
Data pagamento 29/09/2022  
Valor documento 1.458,95

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **139107472**

Usuário: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

---





---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 413-8  
Conta corrente 43948-7 MUNICIPIO UPA 24HS

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 101.701  
Valor 137.090,70  
Destinação 0  
Data transferência 17/10/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2F7EC55B3EF7DBE5

---

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO  
JE664074 ANTONIO C VITORINO


17/10/2022 16:24:09

17/10/2022 16:39:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.53  
0413800413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO UPA 24HS  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 43.948-7  
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS VITORINO

Convenio ARREC TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 8160000008-2 73472714202-2  
21230013170-4 7950000011-2  
Data do pagamento 17/10/2022  
Valor em Dinheiro 873,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 873,47

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.DAB.569.797.386.A6B

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO 17/10/2022 16:25:17  
JE664074 ANTONIO C VITORINO 17/10/2022 16:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência 413-8

Conta corrente 43948-7

Transações pendentes - resumo

Pendência número 144995838

Transação DOC ou TED Eletrônico

Valor 137.090,70

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO 17/10/2022 16:24:09

Resultado Assinatura efetuada com sucesso 17/10/2022 16:39:53

Pendência número 144996752

Transação Pagamento de outros convênios

Valor 873,47

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO 17/10/2022 16:25:17

Resultado Assinatura efetuada com sucesso 17/10/2022 16:39:53

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1864  
1865  
1866

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nota de Liquidação

Data: 13/10/2022  
Nº da Liquidação: 19014/22  
Ordinário  
Processo: AF-6180/2022

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
Município: Mococa

OK

Órgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Funcional: 15.451.0070 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 1.048 - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.02.0100 (0100) - Outras Obras E Instalações  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000665  
Nº Docto. Fiscal: 950  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho: 15591/22	Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho: 137.964,17	Valor da liquidação: 137.964,17
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 137.964,17	Total (B): 137.964,17
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\*  
Cidade: Tambaú  
C.N. 16-898-251/0001-75  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 680020310111  
UF: SP

4376 59008,8

Especificação: 1

REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP (Licitação Nº: 3/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 137.964,17

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 137.964,17 (cento e trinta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 105/2022 Data: 27/04/2022  
Contrato: 011/2022 Data: 08/05/2022


Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data: 13/10/2022

Responsável

ANTONIO CARLOS VITORINO  
Diretor de Finanças

Brasil UPA 24 HS

0/43.948-7



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 6180/2022

Processo Administrativo: 108/2022  
Processo Nr.: 105/2022  
Data do Processo: 11/03/2022  
Data da Homologação: 27/04/2022  
Sequência da Adjudicação: 4  
Data da Adjudicação: 27/04/2022

**TOMADA DE PREÇO**  
Nr.: 3/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 15591)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: Recursos Estadual  
Dotações Utilizadas: 1.048.4.4.90.51.00.00.00.00 (665) - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
Objeto da Compra: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP

Observações:


Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,202	SV	REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (212-06-0315)		682.986,39	137.964,17

<b>Total Geral:</b>	137.964,17
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	137.964,17

(Valores expressos em Reais R\$)

Mococa, 13 de Outubro de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 950
Data de Emissão 06/10/2022
Data e Hora da Competência 06/10/2022 às 16:43:24
Código de Verificação 3938-7685-0951



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAÚ UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Telefone  
 E-mail  
 f. Comp.  
 Logradouro RUA - XV DE NOVEMBRO Número 360  
 Bairro CENTRO CEP 13730-020  
 Município MOCOCA UF SP  
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Coitória	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	17.469,3700	1,00	5,00	17.469,37
12	MATERIAL	120.494,8000	1,00	0,00	120.494,80
Valor Total dos Serviços - R\$137.964,17					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 011/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022


**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 873,47 (0.63%) Fonte IBPT

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

*Renan Augusto de Carvalho*  
**Renan Augusto de Carvalho**  
 Diretor do Dep. de Obras  
 CREA: 5070103369

HF 6180  
 EMP 15591  
 P. 105/2022



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 137.964,17**

<b>Atividade</b> 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O				
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Sim		<b>Responsável pelo imposto</b> Tomador dos Serviços
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Normal		<b>Local do Serviço</b> Fora do Município		<b>Local de Prestação</b> MOCOCA - SP
<b>Aliquota (%)</b> 5,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 17.469,37	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b> 120.494,80	<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b> 873,47	<b>Vlr. do ISS (R\$)</b> 873,47

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 137.090,70**


**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/haautenticadocumento>)

Recebi(emos) do Prestador: **CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.896.251/0001-75**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 950 emitida em 06/10/2022 às 16:43:24 - Cód Verif 3938-7685-0951  
Condições de Pagamento: **Vencimento: 06/10/2022 Valor Total R\$ 137.964,17 Valor Líquido R\$ 137.090,70**

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 413-8  
Conta corrente 43948-7 MUNICIPIO UPA 24HS

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 100.601  
Valor 54.605,05  
Destinação 0  
Data transferência 06/10/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3C4107DE35B6130C

Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO 06/10/2022 15:03:52  
J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO 06/10/2022 15:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

### Assinatura de transação pendente - resumo

#### Origem

Agência 413-8  
Conta corrente 43948-7

#### Transações pendentes - resumo

Pendência número 141570426  
Transação DOC ou TED Eletrônico  
Valor 54.605,05  
Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO 06/10/2022 15:03:52  
Resultado Assinatura efetuada com sucesso 06/10/2022 15:21:31  
Pendência número 141571284  
Transação Pagamento de outros convênios  
Valor 430.74  
Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO 06/10/2022 15:04:51  
Resultado Assinatura efetuada com sucesso 06/10/2022 15:21:31

Transação efetuada com sucesso por: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.31  
0413800413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO UPA 24HS  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 43.948-7  
EFETUADO POR: REGINALDO DONIZETE DE M

=====  
Convenio ARREC TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 81600000004-1 30742714202-0  
21130013166-4 24300000011-3  
Data do pagamento 06/10/2022  
Valor em Dinheiro 430,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 430,74  
=====


DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.1E8.E87.436.EC4.690

Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO  
J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO

06/10/2022 15:04:51  
06/10/2022 15:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nota de Liquidação

Data: 19/09/2022  
Nº de Liquidação: 17346/22  
Ordinário  
Processo: AF-5678/2022

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
Município: Mococa

Orgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Funcional: 15.451.0070 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 1.048 - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.02.0100 (0100) - Outras Obras E Instalações  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000665  
Nº Docto. Fiscal: 943  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	14029/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	55.035,79	Valor da liquidação:	55.035,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.035,79	Total (B):	55.035,79
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\*  
Cidade: Tambaú  
C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 680020310111  
UF: SP

Especificação: 1

REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP (Licitação Nº: 3/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 55.035,79

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 55.035,79 (cinquenta e cinco mil trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
Contrato: 011/2022

Número: 105/2022

Data: 27/04/2022

Data: 08/05/2022

Declaração para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 19/09/2022

Responsável

ANTONIO CARLOS VITORINO  
Diretor de Finanças

*Brasil UPA 24hrs*  
*Bco 56460 0/43 3-8-2*  
*21 56.605,05*  
*21 490,00*

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇA**

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 5678/2022

Processo Administrativo: 108/2022  
Processo Nr.: 105/2022  
Data do Processo: 11/03/2022  
Data da Homologação: 27/04/2022  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 27/04/2022

**TOMADA DE PREÇO**  
Nr.: 3/2022 - TP

Empenho Ordinário nr.: 14029

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: Recursos Estadual  
Dotações Utilizadas: 1.048.4.4.90.51.00.00.00.00 (665) - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOÇA - -  
Objeto da Compra: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOÇA-SP

Observações:


Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,081	SV	REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (212-06-0315)		682.986,39	55.035,79

<b>Total Geral:</b>	55.035,79
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	55.035,79

(Valores expressos em Reais R\$)

Mococa, 19 de Setembro de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 943
Data de Emissão 06/09/2022
Data e Hora da Competência 06/09/2022 às 16:57:39
Código de Verificação 9456-1524-6855



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAÚ UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Telefone  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA -XV DE NOVEMBRO Número 360  
 Bairro CENTRO CEP 13730-020  
 Município MOCOCA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	8.614,7200	1,00	5,00	8.614,72
12	MATERIAL	46.421,0700	1,00	0,00	46.421,07

Valor Total dos Serviços - R\$55.035,79

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 011/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 C/PJ: 16.898.251/0001-75

*Assinatura de Carvalho*  
 CREA: 507040555

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 430,74 (0,78%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COPINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
COFE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.035,79**

Atividade 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Sim	Responsável pelo imposto Tomador dos Serviços	Situação da Nota Fiscal Normal	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação MOCOCA - SP
Aliquota (%) 5,0000	Base de Cálculo (RS) 8.614,72	Vir. Total das Deduções (RS) 46.421,07	Vir. Total Retido (RS) 430,74	Vir. de ISS (RS) 430,74		
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 54.605,05</b>						

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/serviel/autenticadocumento>)

Receb(emos) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75





G3330717011668351  
07/12/2022 17:15:55

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
97/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.51  
0413800413

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MOCOCA-QSE  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 14.693-5  
EFETUADO POR: CYNTHIA APARECIDA TREPO

Convenio ARREC TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 8164000008-8 80162714202-0  
21212013550-5 11400000011-6  
Data do pagamento 07/12/2022  
Valor em Dinheiro 880,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 880,16

DOCUMENTO: 120702  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.900.CCF.7A7.159.349

Assinada por JE664074ANTONIO C VITORINO 07/12/2022 17:13:33  
JG390586CYNTHIA T HONORATO 07/12/2022 17:15:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG390586 CYNTHIA T HONORATO.

## Assinatura de transação pendente - resumo

Origem	
Agência	413-8
Conta corrente	14693-5
Transações pendentes - resumo	
Pendência número	162232845
Transação	Pagamento de outros convênios
Valor	880,16
Assinada por	JE664074ANTONIO C VITORINO 07/12/2022 17:13:33
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso 07/12/2022 17:15:51

Transação efetuada com sucesso por: JG390586 CYNTHIA T HONORATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01


<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$38.150,93
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 00962

<b>Data de Débito:</b>	07/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	07/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	00177591
<b>Chave de Segurança:</b>	YRLSWNK7030KJ9MK

<b>CPFs Autorizadores:</b>
391.023.438-00
268.266.148-39

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.





**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 38.150,93
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 00962

<b>Data de Débito:</b>	07/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	07/12/2022 - 15:11:07
<b>Código da Operação:</b>	69905813

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
391.023.438-00

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**


**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**CADASTRAR FAVORECIDO**





## Boletos, convênios e outros

G3340717101950471  
07/12/2022 17:13:33

### Cliente

---

Agência 413-8  
Conta corrente 14693-5 PM MOCOCA-QSE

---


Código de barras lido 8164000008801627142022121201355011400000011  
Data pagamento 07/12/2022  
Valor documento 880,16

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **162232845**.

Usuário: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

---



ESTADO DE SÃO PAULO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Nota de Liquidação

Data: 30/11/22  
 Nº da Liquidação: 2130  
 Ordinário  
 Processo: AF-6837/2

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
 Município: Mococa

OK

Órgão: 10 - Departamento de Educação  
 Unidade: 10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental  
 Funcional: 12.365.0078 - EDUCAÇÃO PARA TODOS  
 Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
 Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.05.0210 (0210) - Outras Obras E Instalações  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000358  
 Nº Docto. Fiscal: 962  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho: 17401/22  
 Valor do empenho: 39.031,09  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 39.031,09

Liquidações Anteriores: 0  
 Valor da liquidação: 39.031  
 Valor Anulado: 0  
 Total (B): 39.031  
 Saldo (A - B): 0

Endereço: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\*  
 C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75

Cidade: Tambaú  
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 680020310111

4376 / 59008-8

UF: S

Especificação: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI  
 CONVERSO (FAZENDA ASPASE) (Licitação Nº: 4/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 39.031,09

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 39.031,09 (trinta e nove mil trinta e um reais e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
 Contrato: 043/2022

Número: 170/2022

Data: 01/06/2022

Data: 06/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)


Responsável

Data: 30/11/2022

  
 ANTONIO CARLOS VITORINO  
 Diretor de Finanças

Nº Bc.	Conta	Banco Brasil
48562	14.693-5	Qese - FNDE
Ch.		R\$
Ch.		R\$ 880,16
Ch.		R\$

Nº Bc.	Conta	Caixa Federal
56456	006.672007-2	QSE - FNDE
		R\$
		R\$ 38.150,93
		R\$



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 6837/2022

Processo Administrativo: 173/2022  
Processo Nr.: 170/2022  
Data do Processo: 03/05/2022  
Data da Homologação: 01/06/2022  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 01/06/2022

**TOMADA DE PREÇO**  
Nr.: 4/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 17401)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 10 - Departamento de Educação  
Unidade: 02 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: ENSINO INFANTIL FEDERAL  
Dotações Utilizadas: 2.064.4.4.90.51.00.00.00.00 (358) - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE)  
  
Observações: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,069	SV	REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE) (212-06-8988)		566.429,59	39.031,09

(Valores expressos em Reais R\$)

<b>Total Geral:</b>	39.031,09
<b>-Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	39.031,09

Mococa, 30 de Novembro de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 962
Data de Emissão 25/11/2022
Data e Hora da Competência 25/11/2022 às 14:23:31
Código de Verificação 2611-7941-6000

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAU UF SP

**Autenticação**



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORA HGB@CONSTRUTORA HGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Cód. Mobiliário 0  
 Nome E-mail Telefone  
 Comp.  
 Logradouro RUA - XV DE NOVEMBRO Número 360  
 Bairro CENTRO CEP 13730-020  
 Município MOCOCA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Qtde	Valor Total (R\$)	
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	17.603,2600	1,00	5,00	17.603,26
12	MATERIAL	21.427,8300	1,00	0,00	21.427,83

Valor Total dos Serviços - R\$59.031,09

**INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, LOCALIZADA NA EMPG PROF MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, ÁREA RURAL DE MOCOCA - CEP 13.749-899 - MOCOCA/SP. CONTRATO Nº 043/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 PROCESSO Nº 170/2022

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

*Renan Augusto de Carvalho*  
 Renan Augusto de Carvalho  
 Diretor do Dep. de Obras  
 CREA: 5070103369

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 880,16 (2,26%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

AF6837

Emp 17401

P. 170/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.031,09

**Atividade**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Sim

**Responsável pelo imposto**

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

MOCOCA - SP

**Aliquota (%)**

5,0000

**Base de Cálculo (R\$)**

17.603,26

**Vlr. Total das Deduções (R\$)**

21.427,83

**Vlr. Total Retido (R\$)**

880,16

**Vlr. do ISS (R\$)**

880,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 38.150,93

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/autenticadocumento>)



Recebemos do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 962 emitida em 25/11/2022 às 14:23:31 - Cód Verif 2611-7941-6000

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/11/2022 Valor Total R\$ 39.031,09 Valor Líquido R\$ 38.150,93

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 413-8  
Conta corrente 43948-7 MUNICIPIO UPA 24HS

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 122.701  
Valor 72.582,27  
Destinação 0  
Data transferência 27/12/2022  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D641D5A8DC89C7EC

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO  
JE664074 ANTONIO C VITORINO

27/12/2022 16:16:53

27/12/2022 16:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.48  
0413800413

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO UPA 24HS  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 43.948-7  
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS VITORINO

=====  
Convenio ARREC TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 8168000010-0 77692714202-1  
21230013565-5 7760000011-2  
Data do pagamento 27/12/2022  
Valor em Dinheiro 1.077,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.077,69  
=====

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.568.381.098.4C4.EAC

Assinada por J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO  
JE664074 ANTONIO C VITORINO

27/12/2022 16:18:00

27/12/2022 16:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664074 ANTONIO C VITORINO.



**TED**

**Debitado**

Agência 413-8  
Conta corrente 43948-7 MUNICIPIO UPA 24HS

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Valor 72.582,27  
Data transferência 27/12/2022  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **169915760.**

Usuário: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.



**Boletos, convênios e outros**

**Cliente**

Agência 413-8  
Conta corrente 43948-7 MUNICIPIO UPA 24HS

Código de barras digitado 816800000100 776927142021 212300135655 776000000112  
Data pagamento 27/12/2022  
Valor documento 1.077,69

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **169916457.**

Usuário: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Diretoria de Finanças

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETEN 4400

Visto:

Guia de Recolhimento

Pedido: 52372423

cod\_economico: 11730 Usuário: LCLSiqueira

Exercício: 2022

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Valor da Parcela

CNPJ: 44.763.928/0001-01

CPF: . . . . .

1.077,69

Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, 360

Bairro CENTRO

CEP: 13.730-900 MOCOCA - SP

**Descrição:**

Vlr. mref. ISS Retido s/ NF 959 de 18/11/22 - R\$ 21.553,73 - Construtora HGB Ltda

**Descrição Valores:**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETI 1.077,69

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**RECIBO DO SACADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	
NOSSO NÚMERO 13565776	VENCIMENTO 30/12/2022
CÓDIGO CEDENTE	VALOR 1.077,69
Pedido 52372423	ACRESCIMOS
Nº PARCELA Parc01	TOTAL PAGO
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE 1.077,69	
<b>ISSRE / 2022</b>	
Vlr. mref. ISS Retido s/ NF 959 de 18/11/22 - R\$ 21.553,73 - Construtora HGB Ltda	
Inscrição Cadastral: ....	
SACADO 50088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA CNPJ: 44.763.928/0001-01 Rua XV DE NOVEMBRO, 360 CENTRO 13730-900 MOCOCA SP	

LOCAL DE PAGAMENTO BOLETO PAGO SOMENTE ITAÚ, SANTANDER, BB E CAIXA.					VENCIMENTO 30/12/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA					CÓDIGO CEDENTE	
DATA DOCUMENTO 27/12/2022	CÓDIGO REFERENTE	ESP. DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/12/2022	NOSSO NÚMERO 13565776	
USO DO BANCO	CARTEIRA S/R	ESP. MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR 1.077,69	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE COBRANÇA SEM REGISTRO NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO A segunda via da parcela vencida pode ser impressa pelo site www.mococa.sp.gov.br ou pelos balcões de atendimento da Prefeitura.					(-) DESCONTO	
Vlr. mref. ISS Retido s/ NF 959 de 18/11/22 - R\$ 21.553,73					CORREÇÃO	
Inscrição Cadastral: .... Parcela: Parc01					(+/-) MULTA	
SACADO 50088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA CNPJ: 44.763.928/0001-01 Rua XV DE NOVEMBRO, 360 CENTRO 13730-900 MOCOCA SP					(+/-) JUROS	
					(-) VALOR COBRADO	

8168000010-0 77692714202-1 21230013565-5 7760000011-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

texto

OK

CN-SIFPM

CONAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 21869

Pag. 1/ 1

Pague-se a: CONSTRUTORA HGB LTDA. - 07076  
C.N.P.J. : 16.898.251/0001-75  
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 73.659,96  
Setenta e Tres Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Seis centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 27/12/2022  
Emissao 27/12/2022

Proveniente de : REFORMA UPA

Nota de \_\_\_\_\_ DOTACAO \_\_\_\_\_  
Empenho Org/Unid. Nat. Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic Valor  
17294 07.01.00 4.4.90.51.99 15.452.0062 2010 01 1000000 73.659,96

Forma de Pagamento  
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao Valor  
001 0413-8 43.948-7 CV 6460 BCO BRASIL - Av.Deb. 1.077,69  
001 0413-8 43.948-7 CV 6460 BCO BRASIL - Av.Deb. 72.582,27  
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 73.659,96

Responsavel: Emitente  
\_\_\_\_\_  
THIAGO NASCIMENTO FREZARINI  
CPF-393.718.768-59

Ordenador: DIRETOR  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS VITORINO  
DIRETOR DE FINANÇAS  
391.023.438-00

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Rg : \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
End: \_\_\_\_\_  
fone: \_\_\_\_\_  
Pagamento efetuado em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Interessado

• Tesouraria  
Documento de Despesa :  
No. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Tesouraria

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Data: 25/11/2022  
Nº da Liquidação: 21034/22  
Ordinário  
Processo: AF-6776/2022

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
Município: Mococa

18/12 21869

Órgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Funcional: 15.452.0062 - VIAS URBANAS  
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS  
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.01.0110 (0100) - Outras Obras E Instalações  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000126  
Nº Docto. Fiscal: 959  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho: 17294/22  
Valor do empenho: 73.659,96  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 73.659,96

Liquidações Anteriores: 0,0  
Valor da liquidação: 73.659,96  
Valor Anulado: 0,0  
Total (B): 73.659,96  
Saldo (A - B): *lucros* 0,0

Endereço: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75

Cidade: Tambaú  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 680020310111

UF: SP

4376 59008-8

Especificação: 1

REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP (Licitação Nº : 3/2022-TP)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 73.659,96

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 73.659,96 (setenta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
Contrato: 011/2022

Número: 105/2022

Data: 27/04/2022

Data: 08/05/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 25/11/2022

Responsável

*[Assinatura]*  
ANTONIO CARLOS VITORINO  
Diretor de Finanças

Nº Br	Conta	Banco Brasil
50460	43.948-7	UPA 24 horas
Ch.	10	RS 72.582,27
Ch.		RS
Ch.	Debito	RS 1.077,69

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 6776/2022

Processo Administrativo: 108/2022  
Processo Nr.: 105/2022  
Data do Processo: 11/03/2022  
Data da Homologação: 27/04/2022  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 27/04/2022

**TOMADA DE PREÇO**  
Nr.: 3/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 17294)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: GERAL  
Dotações Utilizadas: 2.010.4.4.90.51.00.00.00.00 (126) - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
Objeto da Compra: REFORMA DA UPÁ (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,108	SV	REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ (212-06-0315)		682.986,39	73.659,96

<b>Total Geral:</b>	73.659,96
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	73.659,96

(Valores expressos em Reais R\$)

Mococa, 24 de Novembro de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 959
Data de Emissão 18/11/2022
Data e Hora da Competência 18/11/2022 às 17:31:34
Código de Verificação 7906-4327-9961



**CNPJ** 16.898.251/0001-75 **Cód. Mobiliário** 746182 **Insc. Mun.** 546768  
**Nome** CONSTRUTORA HGB LTDA **RG/IE** 680.020.310.111  
**Logradouro** RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 **Número** 0  
**Bairro** ZONA RURAL **CEP** 13710-000  
**Município** TAMBÁU **UF** SP

**Autenticação**



**Situação** Não Optante do Simples Nacional  
**Telefones** 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORA HGB@CONSTRUTORA HGB.COM.BR  
**E-Mail's**

**CPF/CNPJ** 44.763.928/0001-01 **RG/IE**  
**Inscrição Mun.** **Cód. Mobiliário** 0  
**Nome** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA **Telefone**  
**E-mail**  
**Inf. Comp.**  
**Logradouro** RUA - XV DE NOVEMBRO **Número** 360  
**Bairro** CENTRO **CEP** 13730-020  
**Município** MOCOCA **UF** SP  
**Complemento** **País** BRASIL

Seq.	Descrição	Vl. Emitido	Outr.	Tributos (R\$)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	21.553,7300	1,00	5,00	21.553,73
12	MATERIAL	52.106,2300	1,00	0,00	52.106,23

Valor Total dos Serviços - R\$73.659,96

**5ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP. CONTRATO Nº 011/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 PROCESSO Nº 105/2022**

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

*Renan Augusto de Carvalho*  
**Renan Augusto de Carvalho**  
 Diretor do Dep. de Obras

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1077.69 (1.46%) Fonte IBPT

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPÍ (RS)	ICMS (RS)			

AF6776  
 EMP17294  
 P. 105/2022



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73.659,96

**Atividade**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Sim

**Responsável pelo imposto**

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

MOCOCA - SP

**Aliquota (%)**

5,0000

**Base de Cál. (R\$)**

21.553,73

**Vlr. Total das Deduções (R\$)**

52.106,23

**Vlr. Total Retido (R\$)**

1.077,69

**Vlr. do ISS (R\$)**

1.077,69

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 72.582,27

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/haenticadocumento>)

*J*

Recebi(mos) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 959 emitida em 18/11/2022 às 17:34:34 - Cód Verif 7906-4327-9961  
Condições de Pagamento: Vencimento: 18/11/2022 Valor Total R\$ 73.659,96 Valor Líquido R\$ 72.582,27

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 413-8  
Conta corrente 130132-2 PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4376 SICOOB CREDICUCAR  
Conta corrente (com DV) 590088  
CNPJ 16.898.251/0001-75  
Nome favorecido CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 90.934  
Valor 67.518,56  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C3BA773866CF100

Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO 09/09/2022 16:48:28  
J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO 09/09/2022 16:50:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

**Assinatura de transação pendente - resumo****Origem**

Agência 413-8  
Conta corrente 130132-2

**Transações pendentes - resumo**

Pendência número 132567930  
Transação DOC ou TED Eletrônico  
Valor 67.518,56  
Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO 09/09/2022 16:48:28  
Resultado Assinatura efetuada com sucesso 09/09/2022 16:50:11

---

Pendência número 132568384  
Transação Pagamento de outros convênios  
Valor 837,98  
Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO 09/09/2022 16:49:10  
Resultado Assinatura efetuada com sucesso 09/09/2022 16:50:11

Transação efetuada com sucesso por: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.11  
0413800413

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREF.MUN.DE MOCOCA-C-ICMS  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 130.132-2  
EFETUADO POR: REGINALDO D MELLO

=====  
Convenio ARREC TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 81650000008-7 37982714202-5  
21130013152-4 74800000011-1  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor em Dinheiro 837,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 837,98  
=====

DOCUMENTO: 090935  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.98D.67B.B4B.D3C.B3C

---

Assinada por JE664074 ANTONIO C VITORINO  
J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO


09/09/2022 16:49:10

09/09/2022 16:50:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6336869 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nota de Liquidação

Data: 10/08/2022  
Nº da Liquidação: 15200/22  
Ordinário  
Processo: AF-4899/2022

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
Município: Mococa

OK

Órgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 07.01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Funcional: 15.451.0070 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 1.048 - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS  
Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Outras Obras E Instalações  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000665  
Nº Docto. Fiscal: 936  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	12053/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	68.356,54	Valor da liquidação:	68.356,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	68.356,54	Total (B):	68.356,54
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1. SN, \*\*\*\*\*  
C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75

Cidade: Tambaú  
Inscr. Est./Ident. Prof.: 680020310111  
UF: SP

Especificação: 1

REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP (Licitação Nº: 3/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 68.356,54


Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 68.356,54 (sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 105/2022 Data: 27/04/2022  
Contrato: 011/2022 Data: 08/05/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 10/08/2022  
Responsavel

ANTONIO CARLOS VITORINO  
Diretor de Finanças

N.º Bc.	Conta	Banco Brasil
48550	130132-2	J.C.M.S.
Ch.	780	RS 67.518,54
Ch.		RS
Ch.	780	RS 837,98



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 4899/2022

Processo Administrativo: 108/2022  
Processo Nr.: 105/2022  
Data do Processo: 11/03/2022  
Data da Homologação: 27/04/2022  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 27/04/2022

TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 3/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 12053)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 07 - Departamento de Obras  
Unidade: 01 - Manutenção Diretoria e Dependências  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: Recursos Estadual  
Dotações Utilizadas: 1.048.4.4.90.51.00.00.00 (665) - REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UPA 24HRS

Compl. Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
Condições de Pagto: CONFORME CRONOGRAMA  
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CRONOGRAMA  
Local de Entrega: MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
Objeto da Compra: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM MOCOCA-SP

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,100	SV	REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (212-06-0315)		682.986,39	68.356,54

<b>Total Geral:</b>	68.356,54
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	68.356,54

(Valores expressos em Reais R\$)

Mococa, 10 de Agosto de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO

10-1-19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
936

Data de Emissão  
08/08/2022

Data e Hora da Competência  
08/08/2022 às 17:41:59

Código de Verificação  
3671-6125-3842

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Telefone  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA --XV DE NOVEMBRO Número 360  
 Bairro CENTRO CEP 13730-020  
 Município MOCOCA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	16.759,6800	1,00	5,00	16.759,68
12	MATERIAL	51.596,8600	1,00	0,00	51.596,86

Valor Total dos Serviços - R\$68.356,54

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 011/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022

DADOS BANCÁRIOS:  
 SICCOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

*Renan Augusto de Carvalho*  
 Diretor do Dep. de Obras  
 CREA: 5070103369

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 837,98 (1,23%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68.356,54**

Atividade 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O  
 Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto  
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Sim Tomador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Local de Prestação  
 Normal Fora do Município MOCOCA - SP  
 Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)  
 5,0000 16.759,68 51.596,86 837,98 837,98

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 67.518,56**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/autenticadocumento>)

*af. 4899 emp. 10053 proc. 105/2022*

Recebi(emos) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75





G3343116319616461  
31/10/2022 16:37:09

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.08  
0413800413

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM MOCOCA-QSE  
AGENCIA: 413-8 CONTA: 14.693-5  
EFETUADO POR: CHRISTIAN FREITAS

=====  
Convenio ARREC TRIBUTOS MOCOCA  
Codigo de Barras 81680000030-8 40292714202-4  
21230013174-6 30500000011-0  
Data do pagamento 31/10/2022  
Valor em Dinheiro 2.040,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.040,29  
=====

DOCUMENTO: 103101

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---


Assinada por JE664074ANTONIO C VITORINO  
JE692353CHRISTIAN FREITAS

31/10/202216:35:13  
31/10/202216:37:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692353 CHRISTIAN FREITAS.



## Assinatura de transação pendente - resumo

Origem		
Agência	413-8	
Conta corrente	14693-5	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	149633792	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	3.040,29	
Assinada por	JE664074ANTONIO C VITORINO	31/10/202216:35:13
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	31/10/202216:37:08

Transação efetuada com sucesso por: JE692353 CHRISTIAN FREITAS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Boletos, convênios e outros

G3310916416207711  
09/11/2022 16:48:29

### Cliente

Agência 413-8  
Conta corrente 14693-5 PM MOCOCA-QSE

Código de barras lido 81680000030402927142022123001317430500000011  
Data pagamento 09/11/2022  
Valor documento 3.040,29

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 152637974.  
Usuário: JE664074 ANTONIO C VITORINO.



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 101.639,76
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 0951

<b>Data de Débito:</b>	31/10/2022
<b>Data da Operação:</b>	31/10/2022 - 15:17:30
<b>Código da Operação:</b>	83074801

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
391.023.438-00

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**


**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**CADASTRAR FAVORECIDO**



IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE MOCOCA
<b>Conta Origem:</b>	0322/006/00672007-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.763.928/0001-01


<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	4376/59008-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	16.898.251/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$191.639,76
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	REF PGTO FORNEC NF 0951

<b>Data de Débito:</b>	31/10/2022
<b>Data da Operação:</b>	31/10/2022
<b>Código da Operação:</b>	00163299
<b>Chave de Segurança:</b>	0587HUZ4SQ0RV18Y

<b>CPFs Autorizadores:</b>
391.023.438-00
158.603.798-62

### Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Nota de Liquidação

Data: 25/10/2022  
 Nº da Liquidação: 19455/22  
 Ordinário  
 Processo : AF-6386/2022

C.N.P.J.: 44.763.928/0001-01  
 Município: Mococa

OK

Órgão: 10 - Departamento de Educação  
 Unidade: 10.02 - Manutenção do Ensino Fundamental  
 Funcional: 12.365.0078 - EDUCAÇÃO PARA TODOS  
 Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
 Elemento: 4.4.90.51.99.00.00.00.00.05.0210 (0210) - Outras Obras E Instalações  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000358  
 Nº Docto. Fiscal: 951  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	15911/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	104.680,05	Valor da liquidação:	104.680,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	104.680,05	Total (B):	104.680,05
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7076 CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\*  
 C.N.P.J.: 16-898-251/0001-75

Cidade: Tambaú  
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 680020310111

*Acordo 756 Reg. 4376*  
*o/ 59.008-8* UF: SP

Especificação: 1


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE) (Licitação Nº : 4/2022-TP)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 104.680,05

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 104.680,05 (cento e quatro mil seiscentos e oitenta reais e cinco centavos)


Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 170/2022 Data : 01/06/2022  
 Contrato : 043/2022 Data : 06/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 25/10/2022  
Responsável

  
 ANTONIO CARLOS VITORINO  
 Diretor de Finanças

Nº Bc.	Conta	Caixa Federal
56456	006.672007-2	QSE - FNDE
		R\$
		R\$ 101.659,74
		R\$

Nº Bc.	Conta	Banco Brasil
48562	14.693-8	Qese - FNDE
		R\$
		R\$ 3.040,29
		R\$



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Fone: 193656-9800 Fax: 19  
Rua XV de Novembro, 360  
C.E.P.: 13730-020 - Mococa - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 6386/2022

Processo Administrativo: 173/2022  
Processo Nr.: 170/2022  
Data do Processo: 03/05/2022  
Data da Homologação: 01/06/2022  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 01/06/2022

**TOMADA DE PREÇO**  
Nr.: 4/2022 - TP

Empenho Ordinário nr.: 15911)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA HGB LTDA.** Código: 7076 Telefone: 1936733021  
Endereço: ROD PADRE DONIZETTI KM 1, SN, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Tambaú - SP - CEP: 13710-000 Agência:  
CNPJ: 16.898.251/0001-75 Inscrição Estadual: 680020310111 Conta Corrente:  
E-mail: construtorahgb@construtorahgb.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


**Órgão:** 10 - Departamento de Educação  
**Unidade:** 02 - Manutenção do Ensino Fundamental  
**Centro de Custo:**  
**Fonte de Recurso:** ENSINO INFANTIL FEDERAL  
**Dotações Utilizadas:** 2.064.4.4.90.51.00.00.00.00 (358) - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
  
**Compl. Elemento:** 4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras E Instalações  
**Condições de Pagto:** CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
**Prazo Entrega/Exec.:** CONFORME CRONOGRAMA  
**Local de Entrega:** MUNICIPIO DE MOCOCA - -  
**Objeto da Compra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE)  
  
**Observações:** AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,185	SV	REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO (FAZENDA ASPASE) (212-06-8988)		566.429,59	104.680,05
					<b>Total Geral:</b>	104.680,05
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	104.680,05

(Valores expressos em Reais R\$)

Mococa, 25 de Outubro de 2022

AUTORIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 951
Data de Emissão 21/10/2022
Data e Hora da Competência 21/10/2022 às 13:19:52
Código de Verificação 7149-5707-5954

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CNPJ 16.898.251/0001-75	Cód. Mobiliário 746182	Insc. Mun. 546763	Autenticação
Nome CONSTRUTORA HGB LTDA	RG/E 680.020.310.111			
Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332	Número 0			
Bairro ZONA RURAL	CEP 13710-000			
Município TAMBAU	UF SP			
Situação Não Optante do Simples Nacional				
Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR				
E-Mail's				

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01	RG/E
Inscrição Mun.	Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	Telefone
E-mail	
uf. Comp.	
Logradouro RUA - XV DE NOVEMBRO	Número 360
Bairro CENTRO	CEP 13730-020
Município MOCOCA	UF SP
Complemento	País BRASIL

*Renan Augusto de Carvalho  
 Diretor do Dep. de Obras  
 CPF: 6070103369*

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	60.805,8700	1,00	5,00	60.805,87
12	MATERIAL	43.874,1800	1,00	0,00	43.874,18
Valor Total dos Serviços - R\$104.680,05					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, LOCALIZADA NA EMPG PROF MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO, ÁREA RURAL DE MOCOCA - CEP 13.749-899 - MOCOCA/SP. CONTRATO Nº 043/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 PROCESSO Nº 170/2022

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 SICOOB CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4376  
 C/C: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3040,29 (2,90%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

AF: 6386/22  
 emp: 15941  
 P: 170/22

11  
12  
13





ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
Comprovante de Confirmação de Processo

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0013811/2022

Organograma de origem: 001.001.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Organograma de destino: 001.001.008 - SETOR DE LICITAÇÕES

Usuário de origem: obras\_mococa

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0013811/2022	MEDIÇÃO		12/07/2022 11:46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Súmula: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2022 - CONTRATO 11/2022  
REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

Total de processos: 1

*Recb*  
*12/07/22*  
*[Signature]*

X \_\_\_\_\_  
Responsável

Hora: 11:46

1

1

1

1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECLARAÇÃO**

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Mococa,

D

E

C

L

A

R

A para os devidos fins que está de acordo com a 1ª medição no valor **R\$ 14.188,61** (quatorze mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) Nota Fiscal nº 920, referente à Prestação de Serviço para realização da Reforma e adaptação do prédio da UPA Unidade de Pronto Atendimento de Mococa-SP. Contrato nº 011/2022, Processo Licitatório nº 105/2022, Tomada de Preço nº 003/2022.

1. Nota fiscal da 1ª medição;
2. Relatório Fotográfico de 1º Medição;
3. Certidão negativa de débitos;
4. Requerimento da Empresa Contratada Solicitando a 1º Medição;
5. Planilha referente à 1ª medição;
6. Certidão positiva de débitos;
7. Documento de arrecadação da Receita Federal.
8. Relatório diário de obra.
9. Relação de funcionários alocado em obra.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Mococa – SP, 11 de Julho de 2022.

RENAN AUGUSTO DE  
CARVALHO:358567158  
61

Assinado de forma digital por  
RENAN AUGUSTO DE  
CARVALHO:35856715861  
Dados: 2022.07.12 11:21:27 -03'00'

**Renan Augusto De Carvalho**  
**Diretor Departamento de Obras**  
**CREA: 5070103369**

**CÓPIA**

1






ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório


Número do processo: 0013811/2022

Número do 0013811/2022 Número 701.607.F7C-15  
Solicitação: 240 - MEDIÇÃO  
Beneficiário: 25305 - CONSTRUTORA HGB LTDA ME  
CNPJ do beneficiário:  
Requerente: 25305 - CONSTRUTORA HGB LTDA ME  
CNPJ do requerente: 16.898.251/0001-75  
Endereço: Rodovia PADRE DONIZETTI Nº S/N - CEP: 13710-000 Bairro: ZONA RURAL  
Complemento: KM 1  
Loteamento: Condomínio:  
Município: Tambaú - SP  
Telefone: (19) 3673-3021 Celular: Fax:  
E-mail:  
Local da protocolização: 001.001.001 - PROTOCOLO GERAL  
Protocolado por: Antonio Celso de Souza  
Situação: Em trâmite Procedênc Interna Prioridade: Normal  
Protocolado em: 08/07/2022 14:12 Previsto Concluído  
Súmula: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA 1º MEDIÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2022 - CONTRATO 11/2022  
REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)  
Observação:

  
Antonio Celso de Souza  
(Protocolado por)

  
CONSTRUTORA HGB LTDA ME  
(Requerente)

Hora: 14:12:5





# CONSTRUTORA HGB

## RECIBO DE ENTREGA DE MEDIÇÕES

À Prefeitura Municipal de Mococa - SP  
Departamento de Obras

REF.: Entrega de Documentação da 1ª Medição.  
Tomada de Preços nº 03/2022 – CONTRATO Nº 011/2022.  
OBRA: REFORMA DA UPÁ (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

A CONSTRUTORA HGB LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 16.898.251/0001-75, sediada na Rod. Padre Donizetti KM 1, S/N, Zona Rural, Tambaú – SP, vem através de seu representante legal abaixo assinado, apresentar a documentação anexada, referente a 1ª Medição da obra em destaque.

### Documentos Anexados:

- Planilha de Medição (02 vias).
- Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 920 (02 vias).
- Diário de Obras – Dia 12/05/2022 à 05/07/2022 (02 vias).
- Relatório Fotográfico (02 vias).
- Certidão Negativa de Débitos Federais (01 vias).
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (01 vias).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (01 vias).
- Certidão de Débitos Estaduais (01 vias).
- Certidão de Débitos Municipais (01 vias).
- Relação de Funcionários alocados em obra (01 via).
- GEFIP (01 via).
- LTCAT/ PCMSO/ PPRA/ Atest. De Saúde Ocupacional / Fichas de EPI.
- Comprovante de pagamento de Guias INSS e FGTS (01 via).

Atenciosamente,

Tambaú – SP, 06 de julho de 2022.

CONSTRUTORA HGB LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-000 - Tambaú - SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
(Carimbo e assinatura)





# CONSTRUTORA HGB

## CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

LICEP 13710-000 - Tambau - SP

### BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOL. MEDIÇÃO N°: 07

FOLHA:

DATA: 06/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

OBRA: REFORMA DA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022

CONTRATO N° 011/2022 - PROCESSO N° 105/2022

SALDO ANTERIOR:

DATA: 06/07/2022

VALOR:

R\$ 14.188,61

SALDO:

R\$

R\$ 682.986,39

668.797,79


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	R\$ 682.986,39		ESTA MEDIÇÃO		R\$ 14.188,61		SALDO:		R\$		668.797,79		
						CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL			TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	
1		SERVIÇO PRELIMINARES				966,59	6.331,88	7.298,46										
1.1	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP OBRAS	UNMES	6,00	107,69	678,18	783,87	4.703,22	0,00	R\$	1,00	R\$ 783,87	1,00	R\$ 783,87	5,00	R\$ 3.918,35	
1.2	02.08.020	Placa de identificação para obra	SP OBRAS	M2	4,50	71,21	505,51	576,72	2.595,24	0,00	R\$	4,50	R\$ 2.595,24	4,50	R\$ 2.595,24	0,00	R\$	
						56.251,48	244.367,89	300.819,37										
2		COBERTURA, LAJE IMPERMEABILIZADA E DOMUS																
2.1	04.02.140	Retirada de estrutura metálica 102,0 m² x 15,00 kg/m² = 1.530,0 kg - Área das Ambulancias	SP OBRAS	KG	1.530,00	0,00	1,62	1,62	2.478,60	0,00	R\$	1.530,00	R\$ 2.478,60	1.530,00	R\$ 2.478,60	0,00	R\$	
2.2	04.03.040	Retirada de telhado perfil e material qualquer, exceto barro - Área das Ambulancias	SP OBRAS	M2	102,00	6,20	0,00	6,20	632,40	0,00	R\$	102,00	R\$ 632,40	102,00	R\$ 632,40	0,00	R\$	
2.3	04.02.140	Retirada de estrutura metálica 46,0 m² x 20,00 kg/m² = 920,0 Kg - Cortar beiral	SP OBRAS	KG	920,00	0,00	1,62	1,62	1.480,40	0,00	R\$	920,00	R\$ 1.480,40	920,00	R\$ 1.480,40	0,00	R\$	
2.4	04.03.040	Retirada de telhado perfil e material qualquer, exceto barro - Cortar beiral	SP OBRAS	M2	46,00	6,20	0,00	6,20	285,20	0,00	R\$	46,00	R\$ 285,20	46,00	R\$ 285,20	0,00	R\$	
2.5	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	27,00	51,55	112,99	164,54	4.442,58	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	27,00	R\$ 4.442,58	
2.6	10.01.040	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	KG	282,00	1,99	8,63	10,82	3.051,24	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	282,00	R\$ 3.051,24	
2.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - Pilares = cinta de Amarração	SP OBRAS	KG	282,00	1,99	8,63	10,82	3.051,24	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$ 741,76	
2.7	11.01.320	Concreto usinado fck = 30 MPa - para bombeamento - Pilares + cinta amarração	SP OBRAS	M3	2,00	0,00	370,88	370,88	741,76	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$ 275,42	
2.8	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	SP OBRAS	M3	2,00	99,74	37,97	137,71	275,42	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	36,00	R\$ 2.180,52	
2.8	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	SP OBRAS	M2	36,00	27,32	33,25	60,57	2.180,52	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	71,00	R\$ 582,91	
2.9	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - 59,0 mts x 0,60 mts	SP OBRAS	M2	71,00	3,63	4,58	8,21	582,91	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	71,00	R\$ 1.425,68	
2.10	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	71,00	13,74	8,34	20,08	1.425,68	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	59,00	R\$ 2.234,33	
2.11	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M	59,00	18,06	18,81	37,87	2.234,33	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	
2.12	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	59,00	18,06	18,81	37,87	2.234,33	0,00	R\$	10,00	R\$ 620,40	10,00	R\$ 620,40	0,00	R\$	
2.13	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	SP OBRAS	M3	10,00	62,04	0,00	62,04	820,40	0,00	R\$	10,00	R\$ 677,00	10,00	R\$ 677,00	0,00	R\$	
2.13	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	SP OBRAS	M3	10,00	9,31	78,39	87,70	877,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	35,50	R\$ 5.841,17	
2.14	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	SP OBRAS	M3	10,00	9,31	78,39	87,70	877,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	560,00	R\$ 6.058,20	
2.14	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	SP OBRAS	M2	35,50	51,55	112,99	164,54	5.841,17	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	3,60	R\$ 1.335,17	
2.15	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura - Reutilização e aproveitamento de 50%	SP OBRAS	KG	960,00	1,99	8,63	10,82	6.058,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	3,60	R\$ 495,76	
2.16	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - Pilares = cinta de Amarração	SP OBRAS	M3	3,60	0,00	370,88	370,88	1.335,17	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	
2.17	11.01.320	Concreto usinado fck = 30 MPa - para bombeamento - Pilares + cinta amarração	SP OBRAS	M3	3,60	99,74	37,97	137,71	495,76	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	82,00	R\$ 4.966,74	
2.18	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	SP OBRAS	M2	82,00	27,32	33,25	60,57	4.966,74	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	164,00	R\$ 1.346,44	
2.19	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - (57,0x0,60 x 48,0x 1,0 mts)	SP OBRAS	M2	164,00	3,83	4,58	8,21	1.346,44	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	164,00	R\$ 2.027,04	
2.20	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	164,00	8,48	3,90	12,36	2.027,04	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	57,00	R\$ 2.158,59	
2.21	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M	164,00	19,06	18,81	37,87	2.158,59	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	57,00	R\$ 710,79	
2.22	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	57,00	19,06	18,81	37,87	2.158,59	0,00	R\$	80,00	R\$ 997,60	80,00	R\$ 997,60	57,00	R\$	
2.23	03.09.020	Demolição manual de camada impermeabilizante	SP OBRAS	M2	137,00	12,47	0,00	12,47	1.708,39	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	182,00	R\$ 846,30	
2.24	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	SP OBRAS	M2	162,00	4,65	0,00	4,65	846,30	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	182,00	R\$	

Rod Padre Donizetti KM 1, s/n - Zona Rural - Tambau/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13.710-000

16.898.251/0001-75 - Inscrição Estadual 680.020.310.111

Email: construtora.hgb@construtorahgb.com.br - www.construtorahgb.com.br Fone: (19) 1-7012

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA n° 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

## CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambau - SP

### BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOL. MEDIÇÃO Nº: 01

FOLHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 OBRA: REFORMA DA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)  
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 105/2022

DATA: 06/07/2022 VALOR: R\$ 682.986,39


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	R\$ 682.986,39		ESTA MEDIÇÃO		R\$ 14.188,61		R\$		R\$ 682.986,39		668.797,79			
						CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO				
						MÃO DE OBRA	MATERIAL												
2.25	04.03.090	Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação	SP OBRAS	M2	5,40	9,43	0,00	9,43	50,92	0,00	R\$	5,40	R\$	50,92	5,40	R\$	50,92	0,00	R\$
2.26	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	182,00	3,63	4,58	8,21	1.494,22	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	182,00	R\$	1.494,22	
2.27	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M2	182,00	13,74	6,34	20,08	3.654,56	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	182,00	R\$	3.654,56	
2.28	32.15.100	Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica (Laje Rebasada e Guarita)	SP OBRAS	M2	202,00	18,84	88,88	107,72	21.758,44	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	202,00	R\$	21.758,44	
2.29	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	SP OBRAS	M2	182,00	6,20	6,49	12,69	2.309,58	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	182,00	R\$	2.309,58	
2.30	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	SP OBRAS	M2	5,40	0,00	613,87	613,87	3.314,90	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	5,40	R\$	3.314,90	
2.31	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura - Área das Ambulancias	SP OBRAS	M2	11,00	51,55	112,99	164,54	1.809,94	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	1.809,94	
2.32	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - Área das Ambulancias	SP OBRAS	KG	60,00	1,99	8,83	10,82	649,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	60,00	R\$	649,20	
2.33	11.01.320	Concreto usinado fck = 30 MPa - para bombeamento - Área das Ambulancias	SP OBRAS	M3	1,00	0,00	370,88	370,88	370,88	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	370,88	
2.34	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (Área das Ambulancias) - 3 brocas	SP OBRAS	M	9,00	37,63	21,96	59,59	536,31	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	9,00	R\$	536,31	
2.35	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	11,00	3,63	4,58	8,21	90,31	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	90,31	
2.36	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M2	11,00	13,74	6,34	20,08	220,88	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	220,88	
2.37	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro 1.1/4" x 1/4" x 2,00 mts - 24 metros	SP OBRAS	KG	70,00	12,19	9,04	21,23	1.486,10	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	70,00	R\$	1.486,10	
2.38	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura( Telhado das Ambulancias) Peso estrutura = Área(102,0 m²) x 15,0 kg/m² = 1.530,0 kgs	SP OBRAS	KG	1.530,00	0,00	15,19	15,19	23.240,70	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.530,00	R\$	23.240,70	
2.39	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	SP OBRAS	M2	102,00	14,53	269,51	284,04	26.972,08	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	102,00	R\$	26.972,08	
2.40	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura( Telhado Principal) Peso estrutura = Área (275,0 m²) x 20,0 kg/m² = 5.500,0 kgs	SP OBRAS	KG	5.500,00	0,00	15,19	15,19	83.545,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	5.500,00	R\$	83.545,00	
2.41	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	SP OBRAS	M2	275,00	12,77	99,62	112,39	30.907,25	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	275,00	R\$	30.907,25	
2.42	14.20.020	Cimaísta em concreto com pingadeira	SP OBRAS	M	120,00	8,88	2,58	8,46	1.015,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	120,00	R\$	1.015,20	
2.43	16.33.102	Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m - Caixa	SP OBRAS	M	170,00	50,54	53,29	103,83	17.851,10	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	170,00	R\$	17.851,10	
2.44	16.33.102	Caixa, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m - Rufo de encaixto	SP OBRAS	M	190,00	50,54	53,29	103,83	16.727,70	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	190,00	R\$	16.727,70	
2.45	46.03.050	Tubo de PVC rígido PE8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 100 mm, inclusive conexões - Condutores	SP OBRAS	M	42,00	42,77	44,44	87,21	3.962,82	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	42,00	R\$	3.962,82	
2.46	46.03.050	Tubo de PVC rígido PE8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 150 mm, inclusive conexões - Condutores	SP OBRAS	M	48,00	42,77	83,21	125,98	6.047,04	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	48,00	R\$	6.047,04	
						2.626,84	4.070,88	6.700,71	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	6.700,71		
3	CORREÇÃO DE TRINÇAS E FISSURAS																		
3.1	33.01.280	Reparo de trinças rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	64,00	19,06	18,81	37,87	2.423,68	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	64,00	R\$	2.423,68	
3.2	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	SP OBRAS	M2	11,00	9,31	0,00	9,31	102,41	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	102,41	
3.3	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	11,00	3,63	4,58	8,21	90,31	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	90,31	
3.4	17.02.120	Emboço comum	SP OBRAS	M2	11,00	9,97	6,34	16,31	176,41	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	176,41	
3.5	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada até 2,20 metros	SP OBRAS	M2	11,00	17,51	60,74	78,25	860,75	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	11,00	R\$	860,75	

Rod Padre Donizetti KM 1, s/n - Zona Rural - Tambau/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13.710-000

CP 16.898.251/0001-75 - Inscrição Estadual 680.020.310.111

Email: construtorahgb@construtorahgb.com.br - www.construtorahgb.com.br Fone: (19) 91 - 7012

Guilherme Henrique Bueno  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

WWW.WWW.HGB.COM.BR  
**CONSTRUTORA HGB LTDA**  
 Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
 Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambau - SP

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)  
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 105/2022

FOLHA: \_\_\_\_\_

DATA: 06/07/2022

BOL. MEDIÇÃO Nº: 01

VALOR: R\$ 682.866,39

VALOR: R\$ 14.188,61

VALOR: R\$ 682.866,39

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.6	33.01.280	Reparo de flocos rasos até 5,0 mm de largura, na massa (Áreas revestidas)	SP OBRAS	M	22,00	19,06	18,81	37,87	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,14	833,14
3.7	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	5,30	51,55	112,89	164,54	872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,06	872,06
3.8	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) Yk = 500 Mpa - (Saia de Aplicação)	SP OBRAS	KG	36,00	1,89	8,93	10,82	389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,52	389,52
3.9	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,40	0,00	328,09	131,88	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	131,88
3.10	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	3,10	51,55	112,98	164,54	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,07	510,07
3.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) Yk = 500 Mpa - (Futura Odontol)	SP OBRAS	KG	20,80	1,99	8,83	10,82	225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,08	225,08
3.12	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,25	2.055,04	6.878,83	329,69	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	82,47
4	ADRIGO DE GLP - (Será utilizado parte do subleito ao fundo lado direito)					2.055,04	6.878,83	329,69	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	82,47
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - 56 0 mts x 0,60 mts	SP OBRAS	M2	7,15	27,32	33,25	60,97	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08	433,08
4.2	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	10,15	3,63	4,59	8,21	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
4.3	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliester	SP OBRAS	M2	10,15	13,74	6,34	20,08	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,81	203,81
4.4	24.02.270	Perfil de 2 folhas, tubular em laje de aço galvanizado, composto	SP OBRAS	M2	5,12	65,38	520,01	585,39	2.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,20	2.897,20
4.5	28.06.060	Corteado de laje com cilindro - treva dupla - 50mm	SP OBRAS	UN	1,00	0,00	40,54	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54
4.6	17.03.020	Cimentado desempenado	SP OBRAS	M2	3,70	16,90	6,82	25,72	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	95,16
4.7	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	SP OBRAS	UN	1,00	1.278,72	3.602,71	4.881,43	4.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,43	4.881,43
5	ADREÇAÇÃO DA SALA DE ESPERA INFANTIL E ATENDIMENTO					187,62	541,27	82,04	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71
5.1	01.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	SP OBRAS	M3	0,38	82,04	0,00	82,04	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71
5.2	25.08.050	Porte lisas com laterais madeira - 80 x 210 cm ( 1,00 x 2,10)	SP OBRAS	UN	1,00	98,22	343,24	439,46	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,46	439,46
5.3	28.01.040	Ferragem completa com maçarana tipo elevanca, para porta interna com 1 folha	SP OBRAS	CJ	1,06	51,55	184,47	218,02	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	218,02
5.4	23.20.120	Guarnição de madeira	SP OBRAS	M	10,20	1,72	3,29	5,01	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10
6	ADREÇAÇÃO PARA SALA DE ODONTOLOGIA					820,49	1.230,38	8,31	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31
6.1	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - Piso	SP OBRAS	M2	12,60	9,31	0,00	8,31	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31
6.2	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação - Contra Piso	SP OBRAS	M3	0,70	62,04	151,24	213,28	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30	148,30
6.3	06.12.020	Alto manual apoiado de área interna com mago de 30 kg	SP OBRAS	M3	0,70	47,91	0,00	47,91	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
6.4	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,70	0,00	328,69	328,69	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,78	230,78
6.5	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em laje ou acabamento	SP OBRAS	M3	0,70	65,38	0,00	65,38	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	45,77
6.6	17.01.060	Regularização de piso com reba de cimento e branco	SP OBRAS	M2	12,80	18,74	5,66	24,42	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,69	307,69
6.7	18.06.102	Piça cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de esboço (lib. - restrição quinta B) assentado com argamassa colante industrializada	SP OBRAS	M2	13,30	11,70	24,76	36,48	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,16	485,16

Guilherme Henrique de Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREMA nº 50705471600

Rod. Padre Donizetti Km 1, s/n - Zona Rural - Tambau/SP - Caixa Postal 08 - CEP 13.710-000

CNPJ: 06.998.251/0001-75 - Inscricão Estadual 680.020.310.111  
 Email: construtora@hgbconstrutorahgb.com.br - www.construtorahgb.com.br Fone: (19) 992... /012



# CONSTRUTORA HGB


**CONSTRUTORA HGB LTDA**  
 Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
 Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambau - SP

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALOR:		BOL. MEDIÇÃO N°: 01		FOLHA:						
ORGAO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		DATA: 06/07/2022		R\$ 682.886,39		R\$ 14.185,61		R\$ 682.886,39						
OBRA: REFORMA DA LUPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)		DATA: 06/07/2022		R\$ 682.886,39		R\$ 14.185,61		R\$ 682.886,39						
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N° 03/2022		DATA: 06/07/2022		R\$ 682.886,39		R\$ 14.185,61		R\$ 682.886,39						
CONTRATO N° 011/2022 - PROCESSO N° 105/2022		DATA: 06/07/2022		R\$ 682.886,39		R\$ 14.185,61		R\$ 682.886,39						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO ANTERIOR		VALOR:		ACUMULADO ATUAL		SALDO
						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	R\$	R\$	R\$	R\$	
6.8	18.06.410	Revestimento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte juntas acima de 3 até 5 mm.	SP OBRAS	M2	12,60	8,44	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	R\$ 116,94
6.9	19.01.064	Bancas / painéis em granito, espess. 2 cm e largura 21 x 30cm. acabamento polido	SP OBRAS	M	2,20	129,03	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	R\$ 303,96
6.10	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	SP OBRAS	M	6,00	25,69	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 154,14
6.11	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4 - linha especial	SP OBRAS	UN	1,00	89,82	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 89,82
6.12	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçambas metálicas - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeiras, papéis, plásticos e metais	SP OBRAS	M3	1,00	87,70	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 87,70
7		<b>ADEQUAÇÃO PARA SALA DE CADAVERES</b>				<b>988,96</b>	<b>1.905,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 1.905,41</b>
7.1	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	SP OBRAS	UN	1,00	330,45	330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 330,45
7.2	44.02.062	Tempobancada em granito com frontão espessura de 2 cm polido - (120 cm x 80,0 cm)	SP OBRAS	M2	0,72	505,57	364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	R\$ 364,01
7.3	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e esfeador em latão fundido cromado	SP OBRAS	UN	1,00	157,16	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 157,16
7.4	44.20.620	Valvula Americana	SP OBRAS	UN	1,00	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 44,58
7.5	44.20.100	Engate Resilve medido DN= 1/2	SP OBRAS	UN	1,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 35,64
7.6	44.20.010	Sifão plástico sanitonado universal de 1	SP OBRAS	UN	1,00	26,61	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 26,61
7.7	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	SP OBRAS	M	6,00	25,69	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 154,14
7.8	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4 - linha especial	SP OBRAS	UN	1,00	89,82	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 89,82
8		<b>ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA GERADOR</b>				<b>9.338,17</b>	<b>10.530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 10.530,31</b>
8.1	03.01.250	Demol. mediada de pavimento ou piso concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	SP OBRAS	M2	3,50	21,32	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	R\$ 74,62
8.2	06.12.020	Alterar manual apoiado de área interna com mão de 30 liga	SP OBRAS	M3	0,35	47,81	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	R\$ 16,77
8.3	12.01.041	Bronca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa - 4 broncas com 3,0 mts - 12,0 mts	SP OBRAS	M	12,00	37,63	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 451,56
8.4	54.01.210	Base de bota graduada	SP OBRAS	M3	0,20	148,96	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	R\$ 29,79
8.5	10.01.040	Armador em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/4" = 500 Mpa	SP OBRAS	KG	22,00	10,82	238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	R\$ 238,04
8.6	06.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	1,65	112,99	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	R\$ 186,44
8.7	11.01.160	Concreto armado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,70	329,69	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	R\$ 230,78
8.8	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro sobre enchimento	SP OBRAS	M3	0,70	66,38	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	R\$ 46,47
8.9	17.02.040	Chapeado com Branco	SP OBRAS	M2	1,65	3,03	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	R\$ 4,99
8.10	17.02.140	Emboço desampanado com espuma de polietileno	SP OBRAS	M2	1,65	13,74	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	R\$ 22,58
8.11	34.05.310	Gradi de ferro perfurado tipo parque - incluindo portão	SP OBRAS	M2	6,60	30,61	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	R\$ 201,96
8.12	28.05.090	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm	SP OBRAS	UN	1,00	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 40,54
8.13	19.03.030	Fornecimento e montagem de estruturas em aço ASTM-A36, sem pintura Piso estrutural - Área(21,0 m² x 10,0 m) = 210,0 m²	SP OBRAS	KG	210,00	15,19	3189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	R\$ 3189,90

Guilherme Henrique Bueno  
 Engenheiro Civil  
 CREA n° 5070547600





CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CONSTRUTORA HGB

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ORÇÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 106/2022

FOLHA:

DATA: 06/07/2022

DATA: 06/07/2022

BOL. MEDIÇÃO Nº: 01

VALOR: R\$ 14.186,61


SALDO ANTERIOR: R\$ 682.986,39

VALOR: R\$ 14.186,61

688.797,79

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	FONTE	DESCRIÇÃO	R\$ 682.986,39		ESTA MEDIÇÃO		VALOR:		R\$ 682.986,39		SALDO	
						CUSTO DIRETO (R\$)	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL
8.14	16.12.090	M2	23,00	SP OBRAS	Revestimento em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster, perf. trapézoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm.	12,77	99,82	112,39	2.554,67	0,00	0,00	0,00	2.554,67	23,00	R\$ 2.554,67
9		M2	70,00	SP OBRAS	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NA COBERTURA DA ENTRADA	873,40	4.083,90	9,92	4.736,96	0,00	0,00	873,40	4.083,90	70,00	R\$ 4.083,90
9.1	04.07.020	M2	70,00	SP OBRAS	Reforço de forro qualquer em placas ou liras fixadas	0,00	58,05	84,05	4.083,90	0,00	0,00	873,40	4.083,90	70,00	R\$ 4.083,90
9.2	22.03.070	M2	70,00	SP OBRAS	Forro em lâmina de PVC cor branca	1.811,95	14.487,84	17,19	85,95	0,00	0,00	873,40	16.409,30	70,00	R\$ 16.409,30
10		UN	5,00	SP OBRAS	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS	17,19	0,00	17,19	85,95	0,00	0,00	873,40	85,95	5,00	R\$ 85,95
10.1	04.08.020	M2	7,04	SP OBRAS	Retirada de folha de esquadria em madeira	34,36	0,00	34,36	241,89	0,00	0,00	873,40	241,89	7,04	R\$ 241,89
10.2	04.14.040	M2	4,00	SP OBRAS	Retirada de Esquadria de Vidro 3,35 x 2,10 mts (Ponta Entrada Principal)	51,55	178,20	228,81	919,24	0,00	0,00	873,40	919,24	4,00	R\$ 919,24
10.3	23.20.340	UN	7,04	SP OBRAS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm - Aproveitar Ferragens	103,06	914,81	1.017,89	7.165,95	0,00	0,00	873,40	7.165,95	7,04	R\$ 7.165,95
10.4	25.02.040	M2	4,51	SP OBRAS	porta de conter em alumínio sob medida 3,35 x 2,10 mts (Ponta Entrada Principal)	34,36	0,00	34,36	154,96	0,00	0,00	873,40	154,96	4,51	R\$ 154,96
10.5	04.14.040	M2	4,51	SP OBRAS	Retirada de Esquadria de Vidro 2,15 x 2,10 mts (Ponta Acesso Corredor Principal)	51,55	178,20	228,81	229,81	0,00	0,00	873,40	229,81	4,51	R\$ 229,81
10.6	23.20.340	UN	1,00	SP OBRAS	Folha de porta lisa comum - 1,10 x 210 cm - Aproveitar Ferragens	0,00	253,43	253,43	1.142,97	0,00	0,00	873,40	1.142,97	1,00	R\$ 1.142,97
10.7	26.02.060	M2	4,51	SP OBRAS	Vidro temperado incolor de 10 mm 2,15 x 2,10 mts (Ponta Acesso Corredor Principal)	7,00	66,95	73,95	147,80	0,00	0,00	873,40	147,80	4,51	R\$ 147,80
10.8	26.20.220	UN	2,00	SP OBRAS	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	7,47	52,66	60,13	120,26	0,00	0,00	873,40	120,26	2,00	R\$ 120,26
10.9	26.20.230	UN	2,00	SP OBRAS	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	7,00	164,82	171,82	687,28	0,00	0,00	873,40	687,28	2,00	R\$ 687,28
10.10	26.20.770	UN	4,00	SP OBRAS	Trinco de pino para porta de vidro temperado	0,00	306,59	306,59	831,17	0,00	0,00	873,40	831,17	4,00	R\$ 831,17
10.11	30.04.060	M	2,15	SP OBRAS	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	34,36	0,00	34,36	108,23	0,00	0,00	873,40	108,23	2,15	R\$ 108,23
10.12	04.14.040	M2	3,15	SP OBRAS	Retirada de Esquadria de Vidro 1,50 x 2,10 mts (Ponta Acesso Corredor Secundário)	0,00	171,42	171,42	322,27	0,00	0,00	873,40	322,27	3,15	R\$ 322,27
10.13	26.02.020	M2	1,88	SP OBRAS	Vidro temperado incolor de 6 mm - Substituição de 2 vidros	0,00	253,43	253,43	798,30	0,00	0,00	873,40	798,30	1,88	R\$ 798,30
10.14	26.02.060	M2	3,15	SP OBRAS	Vidro temperado incolor de 10 mm 1,50 x 2,10 mts (Ponta Acesso Corredor Secundário)	0,00	5,52	52,26	88,25	0,00	0,00	873,40	88,25	3,15	R\$ 88,25
10.15	26.20.020	M2	1,88	SP OBRAS	Recocação de vidro inclusive emassamento ou reconicação de baguetes	46,74	66,85	73,95	147,90	0,00	0,00	873,40	147,90	1,88	R\$ 147,90
10.16	26.20.220	UN	2,00	SP OBRAS	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	7,00	52,66	59,66	119,32	0,00	0,00	873,40	119,32	2,00	R\$ 119,32
10.17	26.20.230	UN	2,00	SP OBRAS	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	7,00	164,82	171,82	687,28	0,00	0,00	873,40	687,28	2,00	R\$ 687,28
10.18	26.20.770	UN	4,00	SP OBRAS	Trinco de pino para porta de vidro temperado	0,00	306,59	306,59	579,89	0,00	0,00	873,40	579,89	4,00	R\$ 579,89
10.19	30.04.060	M	1,50	SP OBRAS	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	0,00	386,59	386,59	773,16	0,00	0,00	873,40	773,16	1,50	R\$ 773,16
10.20	30.04.060	M	2,00	SP OBRAS	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	0,00	386,59	386,59	773,16	0,00	0,00	873,40	773,16	2,00	R\$ 773,16
10.21	26.01.030	KG	2,50	SP OBRAS	Parafusos em alumínio natural - Substituir Ferragens Trilho superior danificada	54,55	31,00	86,45	216,13	0,00	0,00	873,40	216,13	2,50	R\$ 216,13
10.22	30.04.060	M	2,15	SP OBRAS	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	0,00	386,59	386,59	831,17	0,00	0,00	873,40	831,17	2,15	R\$ 831,17
11					AMBIENTES EXISTENTES NO SUBSÓLO	1.130,92	895,12	2.026,04	2.026,04	0,00	0,00	2.026,04	2.026,04		R\$ 2.026,04

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

10.030.231/0001-75  
CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambaú - SP

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOL. MEDIÇÃO N°: 01

FOLHA: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DATA: 06/07/2022

ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

OBRA: REFORMA DA UPB (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022

CONTRATO N° 011/2022 - PROCESSO N° 105/2022

DATA: 06/07/2022

VALOR:

R\$ 682.986,39

668.797,79


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	R\$ 682.986,39		ESTA MEDIÇÃO		R\$ 14.188,61		SALDO:		R\$		668.797,79		
						CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL			TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	
11.1	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	36,00	3,63	4,58	8,21	295,56	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	36,00	R\$	295,56
11.2	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	20,00	18,06	18,81	37,87	757,40	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	20,00	R\$	757,40
11.3	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M2	36,00	13,74	6,34	20,08	722,88	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	36,00	R\$	722,88
11.4	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	SP OBRAS	M2	20,00	6,20	6,49	12,69	253,80	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	20,00	R\$	253,80
12		SERVIÇO NA ÁREA EXTERNA NO SUBSOLO				798,38	10.948,50		11.746,78	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	11.746,78
12.1	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,43	0,00	329,69	329,69	141,77	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,43	R\$	141,77
12.2	17.03.020	Cimentado desempenado	SP OBRAS	M2	7,20	18,90	6,82	25,72	185,18	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	7,20	R\$	185,18
12.3	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	SP OBRAS	M2	1.067,00	0,12	2,53	2,65	2.827,55	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.067,00	R\$	2.827,55
12.4	54.01.220	Base de bica corrida	SP OBRAS	M3	64,00	2,39	120,03	122,42	7.834,68	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	64,00	R\$	7.834,68
12.5	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	20,00	18,06	18,81	37,87	757,40	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	20,00	R\$	757,40
13		SERVIÇOS DE ELÉTRICA COM APROVEITAMENTO				28.051,37	36.588,53		64.639,90	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	64.639,90
13.1	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	SP OBRAS	UN	135,00	15,55	0,00	15,55	2.099,25	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	135,00	R\$	2.099,25
13.2	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	SP OBRAS	UN	50,00	9,72	0,00	9,72	486,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	50,00	R\$	486,00
13.3	01.06.021	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 KVA	SP OBRAS	UN	1,00	6.539,24	0,00	6.539,24	6.539,24	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	6.539,24
13.4	29.03.010	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm) - 12 BWG	SP OBRAS	M	4,00	10,31	7,48	17,80	71,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	4,00	R\$	71,20
13.5	29.03.010	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm) - 14 BWG	SP OBRAS	M	2,00	10,31	7,48	17,80	35,60	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	35,60
13.6	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	SP OBRAS	UN	1,00	13,80	42,33	55,93	55,93	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	55,93
13.7	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R - 1 Estribo	SP OBRAS	UN	2,00	111,88	63,16	195,04	390,08	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	390,08
13.8	69.20.040	Isolador soldana em porcelana de 72 x 72 mm	SP OBRAS	UN	2,00	7,77	5,54	13,31	26,62	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	26,62
13.9	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos - 13A	SP OBRAS	UN	12,00	9,72	180,19	189,91	2.278,92	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	12,00	R\$	2.278,92
13.10	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos - 10A	SP OBRAS	UN	6,00	9,72	180,19	189,91	1.139,46	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	6,00	R\$	1.139,46
13.11	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos - 20A	SP OBRAS	UN	2,00	9,72	180,19	189,91	379,82	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	379,82
13.12	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos - 25A	SP OBRAS	UN	1,00	9,72	180,19	189,91	189,91	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	189,91
13.13	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	SP OBRAS	UN	8,00	23,33	65,42	108,75	870,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	8,00	R\$	870,00
13.14	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	SP OBRAS	UN	1,00	34,99	112,80	147,79	147,79	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	147,79
13.15	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 80 A até 100 A	SP OBRAS	UN	1,00	34,99	112,80	147,79	147,79	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	147,79
13.16	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	SP OBRAS	M	2,00	18,45	5,04	24,49	48,98	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	48,98
13.17	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	SP OBRAS	M	2,00	27,22	10,96	38,18	76,36	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	76,36
13.18	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	SP OBRAS	M	440,00	11,66	2,42	14,08	6.195,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	440,00	R\$	6.195,20
13.19	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	SP OBRAS	M	135,00	11,66	3,93	15,59	2.104,65	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	135,00	R\$	2.104,65
13.20	97669	Eletroduto de PVC corrugado flexível PEAD, diâmetro 3" - SINAPI	SINAPI	M	75,00	5,24	9,45	14,69	1.101,75	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	75,00	R\$	1.101,75
13.21	97670	Eletroduto de PVC corrugado flexível PEAD, diâmetro 4" - SINAPI	SINAPI	M	15,00	6,28	13,09	19,37	290,55	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	15,00	R\$	290,55
13.22	39.26.010	Cabo de cobre flex. de 1,5 mm², isolam. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. fumaça e gases	SP OBRAS	M	65,00	1,55	2,45	4,00	260,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	65,00	R\$	260,00
13.23	39.26.020	Cabo de cobre flex. de 2,5 mm², isolam. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. fumaça e gases	SP OBRAS	M	1.867,00	1,85	3,41	5,36	10.007,12	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.867,00	R\$	10.007,12
13.24	39.26.030	Cabo de cobre flex. de 4 mm², isolam. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. de fumaça e gases	SP OBRAS	M	450,00	2,33	4,76	7,09	3.190,50	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	450,00	R\$	3.190,50
13.25	39.26.040	Cabo de cobre flex. de 6 mm², isol. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. de fumaça e gases	SP OBRAS	M	248,00	2,73	6,62	9,35	2.318,80	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	248,00	R\$	2.318,80
13.26	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	SP OBRAS	M	278,00	5,84	29,30	35,14	9.768,92	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	278,00	R\$	9.768,92
13.27	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	SP OBRAS	M	106,00	3,89	19,21	23,10	2.448,60	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	106,00	R\$	2.448,60

Rod Padre Donizetti KM 1, s/n - Zona Rural - Tambaú/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13.710-000

CN 5.898.251/0001-75 - Inscrição Estadual 680.020.310.111

Email: construtorahgb@construtorahgb.com.br - www.construtorahgb.com.br Fone: (19) 9921-7012

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA n° 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

10.000.201/0001-10  
**CONSTRUTORA HGB LTDA**  
Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-000 - Tambau - SP

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 OBRA: REFORMA DA UPÁ (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)  
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 105/2022

DATA: 06/07/2022

BOL. MEDIÇÃO Nº 01


FOLHA:

VALOR: R\$ 682.966,39

R\$ 668.797,79

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL		SALDO			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL					R\$	R\$	R\$	R\$		
						R\$ 682.966,39						ESTA MEDIÇÃO		R\$ 14.188,61		SALDO:	
13.28	COMP-01345638	Cabo Quadruplex aluminio Isolação XLPE 0,6/1,0 kv. 120 mm²	PRÓPRIA	unid	15,00	0,00	123,60	123,60	1.857,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 1.857,00
13.29	40 04 450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	SP OBRAS	C.J	68,00	11,66	10,49	22,15	1.506,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	68,00	R\$ 1.506,20
13.30	40 05 020	Interruptor com 1 teca simples e placa	SP OBRAS	C.J	22,00	13,22	8,00	21,22	466,84	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	22,00	R\$ 466,84
13.31	40 05 080	Interruptor com 1 teca paralelo e placa	SP OBRAS	C.J	7,00	10,50	11,37	21,87	153,09	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 153,09
13.32	40 07 010	Caixa em PVC de 4 x 2	SP OBRAS	UN	40,00	9,72	2,92	12,64	505,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 505,60
13.33	40 07 040	Caixa em PVC octogonal de 4 x 4	SP OBRAS	UN	137,00	9,72	7,00	16,78	2.298,86	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	137,00	R\$ 2.298,86
13.34	COMP-69897171	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 5W	PRÓPRIA	unid	2,00	0,00	6,58	6,58	13,16	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 13,16
13.35	COMP-81774361	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 7W	PRÓPRIA	unid	1,00	0,00	7,75	7,75	7,75	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 7,75
13.36	COMP-89690676	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 9W	PRÓPRIA	unid	2,00	0,00	6,41	6,41	12,82	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 12,82
13.37	COMP-22474995	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 12W	PRÓPRIA	unid	9,00	0,00	9,72	9,72	87,48	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 87,48
13.38	COMP-44085738	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 15W	PRÓPRIA	unid	3,00	0,00	12,27	12,27	36,81	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 36,81
13.39	COMP-18543806	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 20W	PRÓPRIA	unid	29,00	0,00	18,53	18,53	537,37	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	29,00	R\$ 537,37
13.40	COMP-36174703	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 30W	PRÓPRIA	unid	69,00	0,00	30,42	30,42	2.098,98	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	69,00	R\$ 2.098,98
13.41	COMP-16555179	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 40W	PRÓPRIA	unid	8,00	0,00	43,63	43,63	350,84	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 350,84
13.42	COMP-91000144	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 50W	PRÓPRIA	unid	11,00	0,00	96,02	96,02	616,22	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 616,22
13.43	COMP-91000144	Lampada LED Formato Bulbo soquete E27 - 50W	PRÓPRIA	unid	3,00	0,00	56,02	56,02	168,06	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 168,06
13.44	41 04 020	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27	SP OBRAS	UN	137,00	3,12	3,84	6,96	953,52	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	137,00	R\$ 953,52
13.45	42 05 200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 mts	SP OBRAS	UN	2,00	19,45	99,71	119,16	238,32	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 238,32
13.46	42 05 310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	SP OBRAS	UN	2,00	9,72	20,30	30,02	60,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 60,04
14	<b>SERVIÇOS DE PINTURA</b>					<b>70.482,82</b>	<b>33.760,90</b>		<b>104.243,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 104.243,72</b>
14.1	88485	Aplicação de Fundo Selador Acrílico - Sinapi	SINAPI	M2	136,00	0,80	1,21	2,01	279,39	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	136,00	R\$ 279,39
14.2	33 10 030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Paredes internas	SP OBRAS	M2	1.337,00	16,37	7,26	23,63	31.593,31	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.337,00	R\$ 31.593,31
14.3	33 10 030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Tetos internos	SP OBRAS	M2	953,00	16,37	7,26	23,63	22.519,39	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	953,00	R\$ 22.519,39
14.4	33 10 030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Paredes externas	SP OBRAS	M2	825,00	16,37	7,26	23,63	19.494,75	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	825,00	R\$ 19.494,75
14.5	33 10 041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo - Barrado na altura de 2,20 mts	SP OBRAS	M2	337,00	16,37	9,37	25,74	8.674,38	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	337,00	R\$ 8.674,38
14.6	33 02 060	Massa corrida à base de PVA	SP OBRAS	M2	20,00	9,17	2,09	11,26	225,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 225,20
14.7	33 01 350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	SP OBRAS	M2	377,00	7,26	5,32	12,60	4.750,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	377,00	R\$ 4.750,20
14.8	33 11 050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	SP OBRAS	M2	102,00	22,86	11,89	34,75	3.544,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	102,00	R\$ 3.544,50

Guilherme Henrique Bueno  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA										BOL. MEDIÇÃO N°: 01							
ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA										DATA: 06/07/2022							
OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)										FOLHA:							
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022										VALOR: R\$ 682.986,39							
CONTRATO N° 011/2022 - PROCESSO N° 105/2022										DATA: 06/07/2022							
SALDO ANTERIOR: R\$ 682.986,39										ESTA MEDIÇÃO: R\$ 14.188,61							
SALDO ANTERIOR: R\$ 682.986,39										SALDO: R\$ 668.797,79							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
14.9	33 11 050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	SP OBRAS	M2	50,00	22,86	11,89	34,75	1.737,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	50,00	R\$	1.737,50	
14.10	33 12 011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	SP OBRAS	M2	325,00	22,86	12,20	35,06	11.394,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	325,00	R\$	11.394,50	
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA					11.104,89	0,00		11.104,89	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$	11.104,89	
15.1	55 01 020	Limpeza final da obra	SP OBRAS	M2	1.022,55	10,86	0,00	10,86	11.104,89	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.022,55	R\$	11.104,89	
VALOR BDI TOTAL:									130.140,03	BDI ACUM. ANT.	R\$0,00	BDI MED.	R\$2.703,36	BDI ACUM. ATUAL	R\$2.703,36	BDI SALD. TOT.	R\$127.843,48
VALOR ORÇAMENTO:									552.846,36	S/BDI	R\$0,00	MED. S/BDI	R\$11.485,03	ACUM. S/BDI AT.	R\$11.485,03	SALDO TOTAL	R\$541.361,33
VALOR TOTAL:									682.986,39	ACUM. ANTERIOR	R\$0,00	TOTAL MEDIÇÃO	R\$14.188,61	TOTAL ACUMUL. ATUAL	R\$14.188,61	SALDO TOTAL	R\$668.797,79

Tambaú - SP, 06 de julho de 2022.

TOTAL MEDIDO MÃO DE OBRA	R\$4.671,25
TOTAL MEDIDO MATERIAL	R\$9.517,36

CONSTRUTORA HGB LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambaú - SP



16.896.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LIDA

Rod Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambau - SP



CONSTRUTORA HGB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
ORÇÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 106/2022

BOL. MEDIÇÃO Nº: 01

DATA: 06/07/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 06/07/2022

VALOR: R\$ 14.188,61


R\$ 682.886,39

R\$ 682.886,39

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MÃO DE OBRA MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ESTA MEDIÇÃO		VALOR:		R\$		SALDO: R\$ 682.886,39	
										PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ATUAL		
SALDO ANTERIOR:																	
1		SERVIÇO PRELIMINARES				946,59	6.331,86		7.298,44								
1.1	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiros - área mínima de 13,80 m²	SP OBRAS	UNMS	6,00	107,69	676,16	783,67	4.703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 783,67	4.703,22	0,00
1.2	02.08.020	Placa de identificação para obra	SP OBRAS	M2	4,50	71,21	505,51	516,72	2.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	R\$ 2.595,24	2.595,24	0,00
2		COBERTURA LAJE IMPERMEABILIZADA E DOMIUS				56.251,48	244.387,89		300.639,37								
2.1	04.02.140	Retirada de estrutura metálica 102,0 m² x 15,00 kg/m³ = 1.530,0 kg - Área das Ambulâncias	SP OBRAS	KG	1.530,00	0,00	1,62	1,62	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	R\$ 2.478,60	2.478,60	0,00
2.2	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer - anexo barro - Área das Ambulâncias	SP OBRAS	M2	102,00	6,20	0,00	6,20	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	R\$ 632,40	632,40	0,00
2.3	04.02.140	Retirada de estrutura metálica 48,0 m² x 20,00 kg/m³ = 960,0 kg - Cortar baral	SP OBRAS	KG	920,00	0,00	1,62	1,62	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	R\$ 1.490,40	1.490,40	0,00
2.4	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer - anexo barro - Cortar baral	SP OBRAS	M2	46,00	6,20	0,00	6,20	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	R\$ 285,20	285,20	0,00
2.5	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	27,00	51,56	112,96	164,54	4.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4.442,56	27,00
2.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) Yk = 500 Mpa - Pilares = cinta de Amarração	SP OBRAS	KG	262,00	1,89	6,83	10,82	2.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.851,24	262,00
2.7	1.1.01.320	Concreto usinado fck = 30 MPa - para bombeamento - Pilares + cinta amarração	SP OBRAS	M3	2,00	0,00	370,86	370,86	741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	741,76	2,00
2.8	1.1.16.080	Levanteamento e adiantamento de concreto uso massa por bombeamento	SP OBRAS	M3	2,00	99,74	37,87	137,71	275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	275,42	2,00
2.9	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - 59,0 m³ x 0,80 m³	SP OBRAS	M2	36,00	27,32	33,25	60,57	2.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.180,52	36,00
2.10	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	71,00	3,63	4,56	6,21	562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	562,91	71,00
2.11	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliester	SP OBRAS	M2	71,00	13,74	6,34	20,08	1.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1.425,68	71,00
2.12	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	59,00	10,06	16,81	37,87	2.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.234,33	59,00
2.13	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	SP OBRAS	M3	10,00	62,04	0,00	62,04	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 620,40	620,40	0,00
2.14	05.07.050	Remoção de estufo de obra com cerâmica metálica - material volumoso e misturado por alvenaria terra, madeira, gesso, plástico e metal	SP OBRAS	M3	10,00	9,31	76,39	87,70	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 877,00	877,00	0,00
2.15	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura - Reutilização e aproveitamento de 50%	SP OBRAS	M2	35,50	51,55	112,96	164,54	5.841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5.841,17	35,50
2.16	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) Yk = 500 Mpa - Pilares + cinta de Amarração	SP OBRAS	KG	560,00	1,89	6,83	10,82	6.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6.059,20	560,00
2.17	1.1.01.320	Concreto usinado fck = 30 MPa - para bombeamento - Pilares + cinta amarração	SP OBRAS	M3	3,60	0,00	370,86	370,86	1.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1.335,17	3,60
2.18	1.1.16.080	Levanteamento e adiantamento de concreto uso massa por bombeamento	SP OBRAS	M3	3,60	99,74	37,87	137,71	465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	465,76	3,60
2.19	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - (57,00,00 - 48,00 x 1,0 m³)	SP OBRAS	M2	82,00	27,32	33,25	60,57	4.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4.966,74	82,00
2.20	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	164,00	3,63	4,56	6,21	1.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1.346,44	164,00
2.21	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliester	SP OBRAS	M2	164,00	8,46	3,90	12,36	2.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.027,04	164,00
2.22	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	57,00	19,06	16,81	37,87	2.156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.156,99	57,00
2.23	03.09.020	Demolição manual de camada impermeabilizante	SP OBRAS	M2	137,00	12,47	0,00	12,47	1.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1.708,39	137,00
2.24	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	SP OBRAS	M2	182,00	4,65	0,00	4,65	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	846,30	182,00

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 070547800

Rod Padre Donizetti Km 1, s/n - Zona Rural - Tambau/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13.710-000  
CNPJ 16.896.251/0001-75 - Inscricao Estadual 660.020.310.111  
www.construtorahgb.com.br - Fone: (18) 99231-7012



10.070.631/0001-13

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-000 - Tambau - SP




CONSTRUTORA HGB

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	R\$ 612.986,39		ESTA MEDIÇÃO		VALOR:		R\$ 682.986,39		
						SAÍDA DE OBRA	CUSTO DIRETO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
2 25	04.03.000	Reboco de alvenaria de acabamento, inclusive perfis metálicos de fixação	SP OBRAS	M2	5,40	9,43	0,00	9,43	50,92	5,40	50,92	0,00	R\$	
2 26	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	182,00	3,83	4,56	8,21	1.494,22	0,00	8,21	1.494,22	0,00	R\$
2 27	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M2	182,00	13,74	6,34	20,08	3.854,56	0,00	20,08	3.854,56	0,00	R\$
2 28	32.15.100	Impermeabilização em massa asfáltica plástica com armadura, tipo III - espessura de 4 mm, face externa em geotêxtil com membrana asfáltica (Laje Releasada e Guardia)	SP OBRAS	M2	202,00	18,84	88,88	107,72	21.750,44	0,00	107,72	21.750,44	0,00	R\$
2 29	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	SP OBRAS	M2	182,00	6,20	6,48	12,08	2.308,56	0,00	12,08	2.308,56	0,00	R\$
2 30	16.30.020	Domio de acrílico fixado em perfis de alumínio	SP OBRAS	M2	5,40	0,00	613,87	613,87	3.314,80	0,00	613,87	3.314,80	0,00	R\$
2 31	08.01.030	Forma em madeira comum para esbultura - Área das Ambulancias	SP OBRAS	M2	11,00	51,55	112,86	164,44	1.809,94	0,00	164,44	1.809,94	0,00	R\$
2 32	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - Área das Ambulancias	SP OBRAS	KG	60,00	1,99	8,63	10,62	940,20	0,00	10,62	940,20	0,00	R\$
2 33	11.01.320	Concreto usinado fyk = 30 MPa - para bombardeio - Área das Ambulancias	SP OBRAS	M3	1,00	0,00	370,86	370,86	370,86	0,00	370,86	370,86	0,00	R\$
2 34	12.01.041	Bricks em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (Área das Ambulancias) - 3 bricks	SP OBRAS	M	9,00	37,63	21,06	58,69	530,31	0,00	58,69	530,31	0,00	R\$
2 35	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	11,00	3,03	4,56	8,21	90,31	0,00	8,21	90,31	0,00	R\$
2 36	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M2	11,00	13,74	6,34	20,08	220,88	0,00	20,08	220,88	0,00	R\$
2 37	26.01.230	Cantoneira e perfis em ferro 1" 1/4" x 1/4" x 2,00 mm - 24 metros	SP OBRAS	KG	70,00	12,19	9,04	21,23	1.486,10	0,00	21,23	1.486,10	0,00	R\$
2 38	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A36 - sem pintura, "Vedado das Ambulancias	SP OBRAS	KG	1.530,00	0,00	15,19	15,19	23.240,70	0,00	15,19	23.240,70	0,00	R\$
2 39	16.13.070	Talhamento em chapas de aço pré-pintado com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha	SP OBRAS	M2	102,00	14,53	269,51	284,04	28.972,08	0,00	284,04	28.972,08	0,00	R\$
2 40	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A36, sem pintura, "Vedado Principal" Peso estrutura = Área (275,0 m²) x 20,0 kg/m² = 5.500,0 kgs	SP OBRAS	KG	5.500,00	0,00	15,19	15,19	83.545,00	0,00	15,19	83.545,00	0,00	R\$
2 41	16.12.060	Talhamento em chapas de aço pré-pintado com epóxi e poliéster, perfil trapozoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	SP OBRAS	M2	275,00	12,77	69,67	112,39	30.907,25	0,00	112,39	30.907,25	0,00	R\$
2 42	14.20.020	Cimilha em concreto com pingadeira	SP OBRAS	M	120,00	5,86	2,58	8,46	1.015,20	0,00	8,46	1.015,20	0,00	R\$
2 43	16.33.102	Caixa, tubo, alça em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m - Caixa	SP OBRAS	M	170,00	90,54	53,26	103,83	17.651,10	0,00	103,83	17.651,10	0,00	R\$
2 44	16.33.102	Caixa, tubo, alça em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m - Rufe de encaosto	SP OBRAS	M	190,00	90,54	53,26	103,83	19.777,70	0,00	103,83	19.777,70	0,00	R\$
2 45	46.03.050	Tubo de PVC rígido PB8 com veda e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R - DN= 100 mm, inclusive conexões - Condições	SP OBRAS	M	42,00	42,77	44,44	87,21	3.962,82	0,00	87,21	3.962,82	0,00	R\$
2 46	46.03.060	Tubo de PVC rígido PB8 com veda e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R - DN= 150 mm, inclusive conexões - Condições	SP OBRAS	M	48,00	42,77	83,21	125,98	6.047,04	0,00	125,98	6.047,04	0,00	R\$
3		<b>CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS</b>				<b>2.828,84</b>	<b>4.676,88</b>		<b>6.700,71</b>		<b>6.700,71</b>		<b>R\$</b>	
3 1	33.01.260	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	64,00	19,06	18,81	37,87	2.423,66	0,00	37,87	2.423,66	0,00	R\$
3 2	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	SP OBRAS	M2	11,00	9,31	0,00	9,31	102,41	0,00	9,31	102,41	0,00	R\$
3 3	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	11,00	3,63	4,56	8,21	90,31	0,00	8,21	90,31	0,00	R\$
3 4	17.02.120	Emboço comum	SP OBRAS	M2	11,00	8,97	6,34	16,31	179,41	0,00	16,31	179,41	0,00	R\$
3 5	18.11.040	Revestimento em placa cerâmica esmalhada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada até 2,20 metros	SP OBRAS	M2	11,00	17,51	80,74	78,25	660,75	0,00	78,25	660,75	0,00	R\$
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.700,71</b>		
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.700,71</b>		

Bueno  
Guilherme Henrique  
Engenheiro Civil  
CREA nº 50709547600



16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tambau - SP



CONSTRUTORA HGB

BOLETIM DE MEDIÇÃO														
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA														
ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA														
OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)														
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 032022														
CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 105/2022														
SALDO ANTERIOR:														
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ESTAB. ANTERIOR	VALOR:	SALDO:	ACUMULADO ATUAL	BALDO
						R\$ 682.985,38			R\$ 14.188,61		R\$ 682.985,38			R\$ 682.985,38
3.6	33.01.280	Reparo de bricas rasas até 5,0 mm de largura, na massa (Áreas revestidas)	SP OBRAS	M	22,00	18,06	18,81	37,87	833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	833,14
3.7	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	5,30	51,55	112,99	194,54	672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	672,06
3.8	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/4" x 500 Mpa - (Sala de Aplicação)	SP OBRAS	KG	36,00	1,99	6,83	10,82	389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	389,52
3.9	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,40	0,00	329,69	329,69	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88
3.10	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	SP OBRAS	M2	3,10	51,55	112,99	194,54	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	510,07
3.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/4" x 500 Mpa - (Futura Odonto)	SP OBRAS	KG	20,80	1,99	6,83	10,82	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06
3.12	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,25	0,00	329,69	329,69	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42
4	ABRIGO DE GLP - (Será utilizado parte do subsolo do anexo lado direito)										TOTAL	R\$ 8.734,65		R\$ 8.734,65
4.1	14.04.210	Alumina de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - 59,0 ms x 0,60 mts	SP OBRAS	M2	7,15	27,32	33,25	80,57	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08
4.2	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	10,15	3,63	4,56	8,21	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
4.3	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliester	SP OBRAS	M2	10,15	13,74	6,34	20,08	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	203,81
4.4	24.02.270	Ponto de 2 lutas, tubular em aço galvanizado, completo	SP OBRAS	M2	5,12	65,38	520,01	585,39	2.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,20
4.5	28.05.060	Cedasto de bloco com cilindro - treva dupla - 50mm	SP OBRAS	UN	1,00	0,00	40,54	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54
4.6	17.03.020	Cimentado desempenado	SP OBRAS	M2	3,70	18,80	6,82	25,72	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
4.7	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 lbs	SP OBRAS	UN	1,00	1.278,72	3.602,71	4.881,43	4.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,43
5	ADEQUAÇÃO DA SALA DE ESPERA INFANTIL E ATENDIMENTO										TOTAL	R\$ 728,29		R\$ 728,29
5.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	SP OBRAS	M3	0,35	197,02	541,27	62,04	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
5.2	23.09.050	Purta lisa com talante madeira - 80 x 210 cm ( 1,00 x 2,10)	SP OBRAS	UN	1,00	96,22	343,24	439,46	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439,46
5.3	28.01.040	Ferragem completa com magreza tipo alavanca, para porta interna com 1 lufa	SP OBRAS	CJ	1,00	51,55	164,47	216,02	216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	216,02
5.4	23.20.120	Quantição de madeira	SP OBRAS	M	10,20	1,72	3,29	5,01	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
6	ADEQUAÇÃO PARA SALA DE ODONTOLOGIA										TOTAL	R\$ 2.150,83		R\$ 2.150,83
6.1	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - Piso	SP OBRAS	M2	12,80	9,31	0,00	9,31	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31
6.2	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação - Contra Piso	SP OBRAS	M3	0,70	62,04	151,24	213,28	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30
6.3	06.12.020	Altera manual aplicado de área interna com mepo de 30 lbs	SP OBRAS	M3	0,70	47,91	0,00	47,91	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54
6.4	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,70	0,00	329,69	329,69	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	230,78
6.5	11.16.020	Largamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	SP OBRAS	M3	0,70	65,38	0,00	65,38	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77
6.6	17.01.060	Regularização de piso com rebe de concreto e branco	SP OBRAS	M2	12,60	16,74	5,89	24,42	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	307,69
6.7	18.06.102	Faixa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Bib. -resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	SP OBRAS	M2	13,30	11,70	24,76	36,46	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	485,16

Guilherme Henrique Civil  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural

CEP 13710-000 - Tamboá - SP



CONSTRUTORA HGB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ORÇÃO OU ENTADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 105/2022

SALDO ANTERIOR:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOL. MEDIÇÃO Nº: 01

FOLHA:

DATA: 06/07/2022

VALOR: R\$ 14.188,61

DATA: 06/07/2022

VALOR: R\$ 682.986,39

DATA: 06/07/2022

VALOR: R\$ 682.986,39

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	R\$ 682.986,39		R\$ 14.188,61		R\$ 682.986,39		
						QUANTO OBRAS	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACRÉDITO ANTERIOR	MEDIÇÃO	ACRÉDITO ATUAL
6.8	18.08.410	Regulamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para espinha, juntas soma de 3 até 3 mm	SP OBRAS	M2	12,00	7,91	1,03	9,44	118,94	0,00	RS	118,94
6.9	19.01.094	Socora / pedreira em granito, espess. 2 cm e largura 21 x 30cm, acabamento polido	SP OBRAS	M	2,20	21,27	129,03	150,30	330,00	0,00	RS	330,00
6.10	46.01.020	Tubo de PVC rígido viridave marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	SP OBRAS	M	6,00	18,45	6,24	25,09	154,14	0,00	RS	154,14
6.11	47.02.020	Registro de gaveta em laito fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	SP OBRAS	UN	1,00	17,50	72,32	89,82	89,82	0,00	RS	89,82
6.12	05.07.060	Remoção de estufo de obra com sacaneca metálica - material volumoso e misturado por areia, terra, madeira, papel, plástico e metal	SP OBRAS	M3	1,00	8,31	78,39	87,70	87,70	0,00	RS	87,70
7		ADEQUAÇÃO PARA SALA DE CADAVÉRES				230,55	948,86		1.205,41	TOTAL	RS	1.205,41
7.1	44.09.390	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	SP OBRAS	UN	1,00	18,45	311,00	330,45	330,45	0,00	RS	330,45
7.2	44.02.062	Tempoalcanca em granito com frontão espessura de 2 cm polido - (120 cm x 60,0 cm)	SP OBRAS	M2	0,72	64,42	44,15	505,57	364,01	0,00	RS	364,01
7.3	44.03.590	Tonreira de mesa para pia com boca móvel e ejetor em laito fundido cromado	SP OBRAS	UN	1,00	14,77	142,39	157,16	157,16	0,00	RS	157,16
7.4	44.20.620	Veículo Americana	SP OBRAS	UN	1,00	1,95	43,03	44,98	44,98	0,00	RS	44,98
7.5	44.20.100	Engate Realvil metálico DN= 1/2"	SP OBRAS	UN	1,00	4,65	30,99	35,64	35,64	0,00	RS	35,64
7.6	44.20.010	Sifão plástico sanitizado universal de 1"	SP OBRAS	UN	1,00	15,55	14,06	29,61	29,61	0,00	RS	29,61
7.7	48.01.020	Tubo de PVC rígido viridave marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	SP OBRAS	M	6,00	19,45	6,24	25,09	154,14	0,00	RS	154,14
7.8	47.02.020	Registro de gaveta em laito fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	SP OBRAS	UN	1,00	17,50	72,32	89,82	89,82	0,00	RS	89,82
8		ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA GERADOR				1.192,14	9.338,17		10.530,31	TOTAL	RS	10.530,31
8.1	03.01.250	Demol. mecanizada permitindo o piso concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	SP OBRAS	M2	3,50	6,20	15,12	21,32	74,62	0,00	RS	74,62
8.2	06.12.020	Muro manual aplicado de área interna com mapa de 30 lgs	SP OBRAS	M3	0,35	47,91	0,00	47,91	16,77	0,00	RS	16,77
8.3	12.01.041	Bloco em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa - 4 bricas com 3,0 mts - 12,0 mts	SP OBRAS	M	12,00	37,63	21,86	98,98	715,08	0,00	RS	715,08
8.4	54.01.210	Base de brita graduada	SP OBRAS	M3	0,20	15,51	131,35	146,86	29,37	0,00	RS	29,37
8.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/4" = 500 Mpa	SP OBRAS	KG	22,00	1,99	6,63	10,82	238,04	0,00	RS	238,04
8.6	08.01.030	Forma em madeira comum para estruturas	SP OBRAS	M2	1,65	51,55	112,89	164,54	271,49	0,00	RS	271,49
8.7	11.01.160	Concreto usinado, fcs = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,70	0,00	329,09	329,09	230,76	0,00	RS	230,76
8.8	11.18.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em laito e/ou enchimento	SP OBRAS	M3	0,70	65,38	0,00	65,38	45,77	0,00	RS	45,77
8.9	17.02.040	Chapeado com Branco	SP OBRAS	M2	1,65	3,63	4,58	8,21	13,55	0,00	RS	13,55
8.10	17.02.140	Emboço despenhado com espuma de poliéster	SP OBRAS	M2	1,65	13,14	6,34	20,08	33,13	0,00	RS	33,13
8.11	34.05.310	Gradi de ferro perfurado, tipo parque - incluindo portão	SP OBRAS	M2	6,60	30,81	430,95	461,56	3.046,30	0,00	RS	3.046,30
8.12	26.05.060	Cereteado de laito com cilindro - trave dupl. - 50mm	SP OBRAS	UN	1,00	0,00	40,54	40,54	40,54	0,00	RS	40,54
8.13	15.03.030	Fornecimento e montagem de estruturas em aço ASTM-A36, sem pintura Piso estrutura = Aço 210 (m <sup>2</sup> ) x 10,0 lgs/m <sup>2</sup> = 210,0 lgs	SP OBRAS	KG	210,00	0,00	15,18	15,18	3.189,90	0,00	RS	3.189,90

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

Rod. Padre Donizetti KM 1, s/nº - Zona Rural - Tamboá/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13.710-000  
CNPJ 16.898.251/0001-75 - Inscrição Estadual 680.020.310.111

16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LIDA

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-600 - Tambau

CONSTRUTORA HGB



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)	MÃO DE OBRA MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	VALOR:		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL	SALDO:	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	SALDO:	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL	SALDO:	
										R\$	R\$		R\$	R\$							R\$	R\$			R\$
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA                  ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA                  OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)                  LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022                  CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 106/2022</p>																									
SALDO ANTERIOR:						R\$ 682.986,39	DATA: 06/07/2022		R\$ 14.188,61		VALOR:		R\$ 682.986,39		R\$ 682.986,39										
8.14	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com espessura de 0,50 mm e altura de 40 cm.	SP OBRAS	M2	23,00	12,77	99,82	112,36	2.584,97	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	2.584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,97
9	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	SP OBRAS	M2	70,00	9,62	673,40	9,62	673,40	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,40
9.2	22.03.070	Forro em lâmina de PVC cor branca	SP OBRAS	M2	70,00	0,00	58,05	58,05	4.063,50	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	4.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,50
10	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS					1.911,85	14.487,84		16.400,30		R\$				R\$			16.400,30							16.400,30
10.1	04.08.020	Retirada de folha de estuque em madeira	SP OBRAS	UN	5,00	17,19	0,00	17,19	85,95	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
10.2	04.14.040	Retirada de Esquadria de Vidro 3,35 x 2,10 mts (Porta Entrada Principal)	SP OBRAS	M2	7,04	34,36	0,00	34,36	241,89	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,89
10.3	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm - Aproveitar Ferragens	SP OBRAS	UN	4,00	51,55	178,20	229,81	919,24	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24
10.4	26.02.040	Porta de correr em alumínio sub medida 3,35 x 2,10 mts (Porta Entrada Principal)	SP OBRAS	M2	7,04	103,08	914,81	1.017,89	7.165,95	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	7.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,95
10.5	04.14.040	Retirada de Esquadria de Vidro 2,15 x 2,10 mts (Porta Acesso Corredor Principal)	SP OBRAS	M2	4,51	34,36	0,00	34,36	154,96	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,96
10.6	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 1,10 x 210 cm - Aproveitar Ferragens	SP OBRAS	UN	1,00	51,55	178,20	229,81	229,81	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,81
10.7	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm 2,15 x 2,10 mts (Porta Acesso Corredor Principal)	SP OBRAS	M2	4,51	0,00	253,43	253,43	1.142,97	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	1.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,97
10.8	28.20.220	Dobradilha inferior para porta de vidro temperado	SP OBRAS	UN	2,00	7,00	66,95	73,95	147,90	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
10.9	28.20.230	Dobradilha superior para porta de vidro temperado	SP OBRAS	UN	2,00	7,47	52,86	60,13	120,26	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26
10.10	28.20.770	Tinco de piso para porta de vidro temperado	SP OBRAS	UN	4,00	7,00	164,82	171,82	687,28	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28
10.11	30.04.090	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	SP OBRAS	M	2,15	0,00	386,59	386,59	831,17	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,17
10.12	04.14.040	Retirada de Esquadria de Vidro 1,50 x 2,10 mts (Porta Acesso Corredor Secundário)	SP OBRAS	M2	3,15	34,36	0,00	34,36	109,23	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23
10.13	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm - Substituição de 2 vidros	SP OBRAS	M2	1,88	0,00	171,42	171,42	322,27	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27
10.14	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm 1,50 x 2,10 mts (Porta Acesso Corredor Secundário)	SP OBRAS	M2	3,15	0,00	253,43	253,43	798,30	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,30
10.15	26.20.020	Recalcação de vidro inclusive emassamento e recolocação de baguetes	SP OBRAS	M2	1,88	46,74	5,52	52,26	98,25	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
10.16	28.20.220	Dobradilha inferior para porta de vidro temperado	SP OBRAS	UN	2,00	7,00	66,95	73,95	147,90	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
10.17	28.20.230	Dobradilha superior para porta de vidro temperado	SP OBRAS	UN	2,00	7,00	52,86	59,66	119,32	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,32
10.18	28.20.770	Tinco de piso para porta de vidro temperado	SP OBRAS	UN	4,00	7,00	164,82	171,82	687,28	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28
10.19	30.04.090	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	SP OBRAS	M	1,50	0,00	386,59	386,59	579,89	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,89
10.20	30.04.090	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm 2,00 x 2,10 mts (Porta de Acesso Área de Ambulatório)	SP OBRAS	M	2,00	0,00	386,59	386,59	773,18	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,18
10.21	26.01.030	Perfil em alumínio natural - Substituir Ferragens Trilho superior danificada	SP OBRAS	KG	2,50	54,55	31,90	86,45	216,13	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,13
10.22	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm 2,10 mts (Porta no Corredor Principal)	SP OBRAS	M	2,15	0,00	386,59	386,59	831,17	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,17
11	AMBIENTES EXISTENTES NO SUBSOLO					1.130,52	899,12		2.029,64		R\$				R\$			2.029,64							2.029,64

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 15070547/600

Rod. Padre Donizetti KM 1, s/nº - Zona Rural - Tambau/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13 710-000

CNPJ 16.898.251/0001-75 - Inscrição Estadual 680.020.310.111

www.construtorahgb.com.br Fone: (19) 99231-7012



16.898.251/0001-75

CONSTRUTORA HGB LTDA

Rod Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-000 - Tambau - SP



CONSTRUTORA HGB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
ORÇÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
OBRA: REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 106/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 06/07/2022

DATA: 06/07/2022

VALOR: R\$ 682.986,39

VALOR: R\$ 14.188,41

VALOR: R\$ 682.986,39

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACIMADO ANTERIOR	MEDICÇÃO	SALDO	R\$	ACIMADO ATUAL	SALDO
11.1	17.02.040	Chapisco com Branco	SP OBRAS	M2	36,00	3,63	10.908,00	8,21	295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,56
11.2	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	20,00	18,06	18,06	37,87	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,40
11.3	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliester	SP OBRAS	M2	36,00	13,74	6,34	20,08	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,88
11.4	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	SP OBRAS	M2	20,00	6,20	10.948,90	12,09	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80
12	SERVIÇO NA ÁREA EXTERNA NO SUBSOLO					798,28	10.948,90	11.746,78	11.746,78	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	11.746,78
12.1	11.01.100	Concreto usinado, fck = 30 MPa	SP OBRAS	M3	0,43	0,00	329,08	329,08	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,77
12.2	17.03.020	Cimentado desempenado	SP OBRAS	M2	7,20	16,90	6,82	25,72	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,18
12.3	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfícies, sem contêido do prator normal	SP OBRAS	M3	1.087,00	0,12	2,53	2,85	2.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,55
12.4	54.01.220	Base de bica corrida	SP OBRAS	M3	64,00	2,39	120,03	122,42	7.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,88
12.5	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	SP OBRAS	M	20,00	18,06	18,06	37,87	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,40
13	SERVIÇOS DE ELÉTRICA COM APROVEITAMENTO					28.051,27	36.986,53	64.837,80	64.837,80	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	64.837,80
13.1	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, prao ou parede	SP OBRAS	UN	135,00	15,55	0,00	15,55	2.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,25
13.2	04.19.000	Remoção de diâmetro termomagnético	SP OBRAS	UN	50,00	9,72	0,00	9,72	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
13.3	01.06.021	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 KVA	SP OBRAS	UN	1,00	6.539,24	0,00	6.539,24	6.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,24
13.4	29.03.010	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16 (4,76 mm) - 12 BVWG	SP OBRAS	M	4,00	10,31	7,49	17,80	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
13.5	29.03.010	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16 (4,76 mm) - 14 BVWG	SP OBRAS	M	2,00	10,31	7,49	17,80	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
13.6	69.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	SP OBRAS	UN	1,00	13,60	42,33	55,93	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
13.7	66.02.105	Armação secundária tipo TC - 2R - 1 Estírio	SP OBRAS	UN	2,00	111,86	83,16	195,04	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,08
13.8	69.20.040	Isolador isoléris em porcelana de 72 x 172 mm	SP OBRAS	UN	2,00	7,77	5,54	13,31	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
13.9	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos - 13A	SP OBRAS	UN	12,00	9,72	180,19	189,91	2.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,92
13.10	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos - 10A	SP OBRAS	UN	6,00	9,72	180,19	189,91	1.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,46
13.11	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos - 20A	SP OBRAS	UN	2,00	9,72	180,19	189,91	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,82
13.12	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos - 25A	SP OBRAS	UN	1,00	9,72	180,19	189,91	189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,91
13.13	37.13.630	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	SP OBRAS	UN	8,00	23,33	85,47	198,75	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
13.14	37.13.690	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	SP OBRAS	UN	1,00	34,99	112,80	147,79	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,79
13.15	38.01.040	Elétrodo de PVC rígido rosqueável de 3/4" - com acessórios	SP OBRAS	M	2,00	19,45	5,04	24,49	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
13.16	38.01.040	Elétrodo de PVC rígido rosqueável de 1/2" - com acessórios	SP OBRAS	M	2,00	27,22	10,96	38,18	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36
13.17	38.18.030	Elétrodo de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	SP OBRAS	M	440,00	11,66	2,42	14,08	6.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,20
13.18	38.18.040	Elétrodo de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	SP OBRAS	M	135,00	11,66	3,93	15,59	2.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,05
13.20	07969	Elétrodo de PVC corrugado flexível PEAD, diâmetro 3" - SINAPI	SINAPI	M	75,00	5,24	9,45	14,69	1.101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,75
13.21	07970	Elétrodo de PVC corrugado flexível PEAD, diâmetro 4" - SINAPI	SINAPI	M	15,00	6,28	13,09	19,37	290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,55
13.22	39.26.010	Cabo de cobre flex. de 1,5 mm², isolam. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. fumaça e gases	SP OBRAS	M	65,00	1,55	2,45	4,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
13.23	39.26.020	Cabo de cobre flex. de 2,5 mm², isolam. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. fumaça e gases	SP OBRAS	M	1.867,00	1,85	3,41	5,36	10.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,12
13.24	39.26.030	Cabo de cobre flex. de 4 mm², isolam. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. fumaça e gases	SP OBRAS	M	450,00	2,33	4,76	7,09	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,50
13.25	39.26.040	Cabo de cobre flex. de 6 mm², isol. 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emiss. fumaça e gases	SP OBRAS	M	248,00	2,73	6,62	9,35	2.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,80
13.26	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	SP OBRAS	M	278,00	5,84	28,30	35,14	9.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,92
13.27	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	SP OBRAS	M	106,00	3,89	19,21	23,10	2.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,60

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

Rod Padre Donizetti Km 1, s/n - Zona Rural - Tambau/SP - CAIXA POSTAL 08 - CEP 13.710-000

CNPJ 16.898.251/0001-75 - Inscrição Estadual 680.020.310.111

www.construtorahgb.com.br Fone: (19) 99231-7012









**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
920

Data de Emissão  
06/07/2022

Data e Hora da  
Competência  
06/07/2022 às 08:02:10

Código de Verificação  
1646-1272-1211

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 748182 Insc. Mun. 546768  
 Nome CONSTRUTORA HGB LTDA RG/E 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAÚ UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/E  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Telefone  
 E-mail  
 Inf. Comp. Número 360  
 Logradouro RUA-XV DE NOVEMBRO CEP 13730-020  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Município MOCOCA País BRASIL  
 Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	4.671,2500	1,00	5,00	4.671,25
12	MATERIAL	9.517,3600	1,00	0,00	9.517,36

Valor Total dos Serviços - R\$14.188,61

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA LIPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 011/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022

DADOS BANCÁRIOS:  
 SICOCB CREDIÇUJAR  
 AGÊNCIA: 4378  
 CC: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 233,56 (1,65%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.188,61**

Atividade

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)  
5,0000

Base de Cálculo (R\$)  
4.671,25

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
9.517,36

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

MOCOCA - SP

Vlr. Total Retido (R\$)  
233,56

Vlr. do ISS (R\$)  
233,56

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.955,05**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/autenticadocumento>)

*J*

Recebi(emos) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota  
920Data de Emissão  
06/07/2022Data e Hora da  
Competência  
06/07/2022 às 08:02:10Código de Verificação  
1646-1272-1211**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 16.898.251/0001-75 Cód. Mobiliário 746182 Insc. Mun. 546758  
 Name CONSTRUTORA HGB LTDA RG/IE 680.020.310.111  
 Logradouro RODOVIA-PADRE DONIZETTI - SP 332 Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 13710-000  
 Município TAMBAU UF SP

**Autenticação**

Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3673-3021 ; 019 3666 5757 ; CONSTRUTORAHGB@CONSTRUTORAHGB.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.763.928/0001-01 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
 E-mail Telefone  
 Inf. Comp. Número 360  
 Logradouro RUA-XV DE NOVEMBRO CEP 13730-020  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Município MOCOCA País BRASIL  
 Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Val. Listado	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA	4.671,2500	1,00	5,00	4.671,25
12	MATERIAL	9.517,3600	1,00	0,00	9.517,36

Valor Total dos Serviços - R\$14.188,61

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA LIPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA Avenida MONSENHOR DEMOSTHENES PARANÁ BRASIL PONTES, Nº 1655 - AREA A4 - ENTRE AS RUAS PEDRO DIAS DE LIMA E JOANA Z. NAUFEL - CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI - MOCOCA/SP.  
 CONTRATO Nº 011/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  
 PROCESSO Nº 105/2022

DADOS BANCÁRIOS:  
 SICOOS CREDIÇUCAR  
 AGÊNCIA: 4378  
 CIC: 59008-8  
 TITULAR: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CNPJ: 16.898.251/0001-75

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 233,56 (1,65%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.188,61****Atividade**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

MOCOCA - SP

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cál. (R\$)

4.671,25

Vir. Total das Deduções (R\$)

9.517,36

Vir. Total Retido (R\$)

233,56

Vir. do ISS (R\$)

233,56

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.955,05****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/autenticadocumento>)

Recebi(estes) do Prestador: CONSTRUTORA HGB LTDA CNPJ: 16.898.251/0001-75





**CONSTRUTORA HGB LTDA.**  
ROD. PE. DONIZETTI KM 01, S/Nº, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP  
[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

**TERMO DE ABERTURA DIÁRIO DE OBRA**

DATA: 12/05/2022 Nº 0

OBRA: Reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil  
Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto  
Rosseti - Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

**CONTRATADA**

CONTRATADA CONSTRUTORA HGB LTDA.

ENDEREÇO Rodovia Padre Donizetti KM 01, S/Nº - Zona Rural - Tambaú/SP.

EMAIL [construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

CNPJ 16.898.251/0001-75

**CONTRATANTE**


CONTRATADA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA


ENDEREÇO Rua Quinze de Novembro, nº 360, Centro - Mococa/SP.

SITE [www.mococa.sp.gov.br](http://www.mococa.sp.gov.br)

CNPJ 44.763.928/0001-01

**ASSINATURAS**

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 1

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 12/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 2

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 13/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
ANEXILIAO ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 3

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 15/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS


- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902218

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 4

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TECNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 17/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				


TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 5

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 18/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 6

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 19/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
ANXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 7

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ENDEREÇO: ATENDIMENTO Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 20/05/2022  
MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE



MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
MPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS


- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 8

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TECNICO: GUILHERME H. BUENO
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 23/05/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

Table with 6 columns: Mão de Obra Indireta (Função/Cargo, Qtde), Mão de Obra Direta (Função/Cargo, Qtde), Equipamentos (Descrição, Qtde). Rows include Gerente de Contrato, Engenheiro de Produção, Técnico de Segurança, etc.

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
2) INSTALAÇÃO DE CONTAINER
3) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
4)
5)
6)
7)
8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno
Engenheiro Civil
CREA nº 5070547600
GUILHERME HENRIQUE BUENO
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno
Engenheiro Civil
CREA nº 5070547600
CONSTRUTORA HGB LTDA.
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO
CREA Nº 5070103369
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 9

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INICIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA:  
24/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA:  
25/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				


TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 26/05/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

Table with 6 columns: Mão de Obra Indireta (Função/Cargo, Qtde), Mão de Obra Direta (Função/Cargo, Qtde), Equipamentos (Descrição, Qtde). Rows include Gerente de Contrato, Engenheiro de Produção, Técnico de Segurança, Auxiliar Administrativo, Comprador, Orçamentista, Ajudante Geral, Armador, Carpinteiro, Pedreiro, Soldador, Escavadeira Hidráulica, Retro Escavadeira, Caminhão Basculante, Caminhão Munck, Guindaste.

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
4) RETIRADA DE DOMUS
5)
6)
7)
8)
9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

Handwritten signature of Guilherme Henrique Bueno and stamp: Engenheiro Civil CREA nº 5070547600

Handwritten signature of Guilherme Henrique Bueno and stamp: Engenheiro Civil CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO
CREA Nº 5070103369
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
CONTRATO: 011/2022  
INÍCIO: 12/05/2022  
PRAZO: 05 MESES  
RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
Nº CREA-SP: 5070547600  
Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 27/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
ANEXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				


TAREFAS REALIZADAS


- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mocooca/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 30/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

*Guilherme Henrique Bueno*  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

*Guilherme Henrique Bueno*  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: REFORMA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
CONTRATO: 011/2022  
INÍCIO: 12/05/2022  
PRAZO: 05 MESES  
RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
Nº CREA-SP: 5070547600  
Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 31/05/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FRONTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP. INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 01/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

## OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS


Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 02/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS


- 1) CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Parana Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 03/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
OPERADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM GRÁFICA
- 2) CORTES PARA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO EM TRINCAS
- 3) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 4) RETIRADA DE DOMUS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

*Guilherme Henrique Bueno*  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

*Guilherme Henrique Bueno*  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 18

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 06/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				


## TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE PLACA EM OBRA
- 2) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 3) RETIRADA DE DOMUS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)


## OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

\_\_\_\_\_  
RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 19

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mocooca/SP.  
CONTRATO: 011/2022  
INÍCIO: 12/05/2022  
PRAZO: 05 MESES  
RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
Nº CREA-SP: 5070547600  
Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: \*  
07/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				


TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE PLACA EM OBRA
- 2) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 3) RETIRADA DE DOMUS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1802118

\_\_\_\_\_  
RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 20

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Portes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP.

CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA:  
08/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
ARMADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 21

REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO

Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/Sp

CONTRATO:

011/2022

RESP. TÉCNICO:

GUILHERME H. BUENO

INÍCIO:

12/05/2022

Nº CREA-SP:

5070547600

PRAZO:

05 MESES

Nº DA ART:

28027230220768908

DATA: 09/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

MÃO DE OBRA DIRETA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

GERENTE DE CONTRATO -  
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO -  
TÉCNICO DE SEGURANÇA 1  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1  
APRADOR 1  
ORÇAMENTISTA 1

AJUDANTE GERAL  
ARMADOR  
CARPINTEIRO  
PEDREIRO  
SOLDADOR

2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
- RETRO ESCAVADEIRA  
- CAMINHÃO BASCULANTE  
1 CAMINHÃO MUNCK  
- GUINDASTE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMIUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CRB nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 22

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti -  
Mococa/SP. INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 10/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

\_\_\_\_\_  
RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

[construtorahgb@construtorahgb.com.br](mailto:construtorahgb@construtorahgb.com.br)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 23

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 20/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TECNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 Á 19/06/2022 HOUVE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 24

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ENDEREÇO: ATENDIMENTO Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: \*  
21/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 À 19/06/2022 HOUVE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 25

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA:  
22/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 Á 19/06/2022 HOUE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 26

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
 ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
 CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
 INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
 PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 23/06/2022  
 MANHÃ: X  
 TARDE: X  
 NOITE: X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TECNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 Á 19/06/2022 HOUE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


Guilherme Henrique Bueno  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
 CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
 CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
 CREA Nº 5070103369  
 Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 27

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mocooca/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 24/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TECNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 7)


## OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 Á 19/06/2022 HOUE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

\_\_\_\_\_  
RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 28

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 27/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

## OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 Á 19/06/2022 HOUE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369

Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 29

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mocooca/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 28/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE COBERTURA DE AMBULÂNCIAS
- 2) RETIRADA DE DOMUS
- 3) CORTE DE TELHAS DO BEIRAL
- 4) CORTE DE ESTRUTURA METÁLICA BEIRAL
- 5)
- 6)
- 8)

## OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 À 19/06/2022 HOUVE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 30

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP. INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 29/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TECNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA
- 2) LEVANTE DE ALVENARIA EM PLATIBANDA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 8)

## OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 Á 19/06/2022 HOUE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 31

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, n° 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 30/06/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILHADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA
- 2) LEVANTE DE ALVENARIA EM PLATIBANDA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

## OCORRÊNCIAS

- 1) PERÍODO ENTRE 11/06/2022 À 19/06/2022 HOUVE UM SURTO DE PNEUMONIA NOS COLABORADORES ALOCADOS EM
- 2) OBRA, SENDO NECESSÁRIO A PARALIZAÇÃO DOS MESMOS PARA DEVIDA RECUPERAÇÃO E VOLTA AO TRABALHO, SENDO
- 3) O DIRETOR DE OBRAS RENAN INFORMADO SOBRE A SITUAÇÃO.
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 32

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP. INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 01/07/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTROLE PRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS


- 1) RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA
- 2) LEVANTE DE ALVENARIA EM PLATIBANDA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

## OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600  
CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras





CONSTRUTORA HGB LTDA.

ROD. PE. DONIZETTI KM 01, ZONA RURAL, TAMBAÚ - SP

construtorahgb@construtorahgb.com.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 33

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes, nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti - Mococa/SP.  
INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 04/07/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA
- 2) LEVANTE DE ALVENARIA EM PLATIBANDA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 34

OBRA: REFORMA UPA - UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
CONTRATO: 011/2022 RESP. TÉCNICO: GUILHERME H. BUENO  
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Demosthenes Paraná Brasil Pontes,  
nº 1655 - Conjunto Habitacional Gilberto Rosseti -  
Mococa/SP. INÍCIO: 12/05/2022 Nº CREA-SP: 5070547600  
PRAZO: 05 MESES Nº DA ART: 28027230220768908

DATA: 04/07/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-
CONTABILISTA	1	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA
- 2) LEVANTE DE ALVENARIA EM PLATIBANDA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

## OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

## ASSINATURAS

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070547600

GUILHERME HENRIQUE BUENO  
CREA Nº 5070547600

CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CREA Nº 1902118

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO  
CREA Nº 5070103369  
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras



CONSTRUTORA HGB

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO CONSTRUTORA HGB LTDA.





Obra: Reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Relatório fotográfico de serviços executados na obra. Instalação de Placa de Obra, instalação de container em obras, serviços de demolições em cobertura, laje impermeabilizante e domus. Levante de alvenaria em platibanda.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600



# CONSTRUTORA HGB

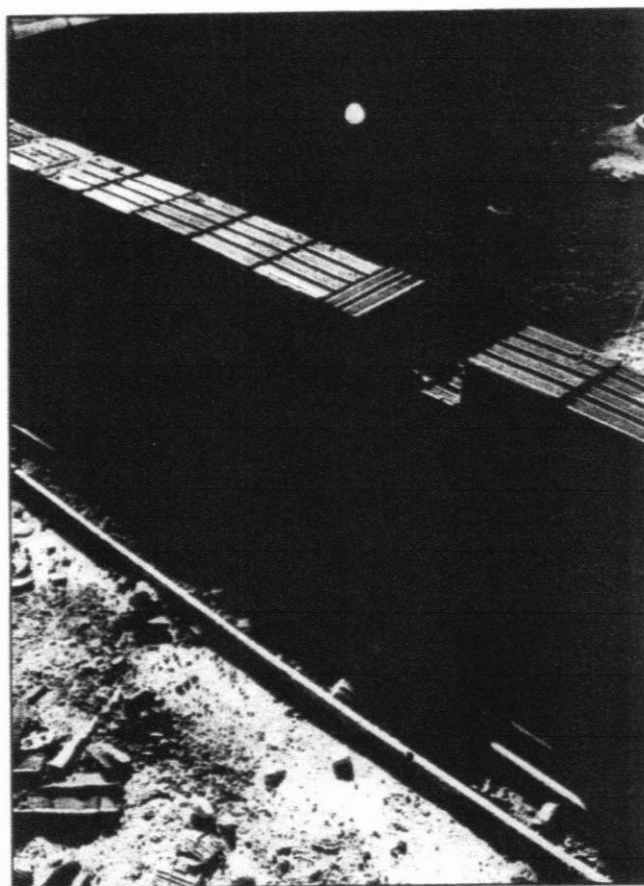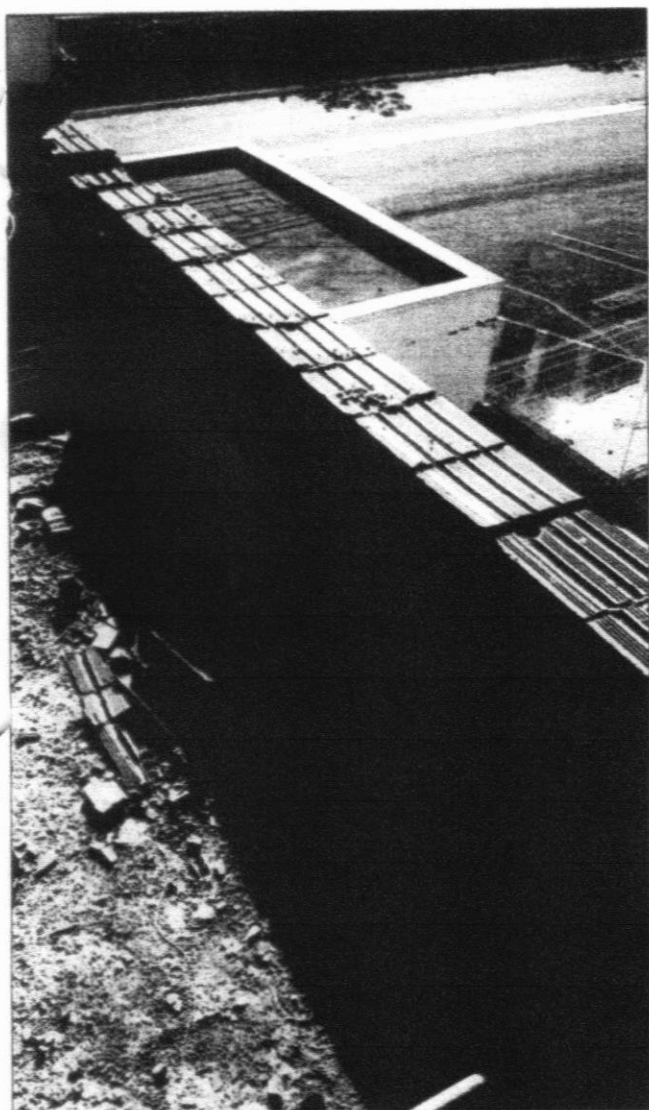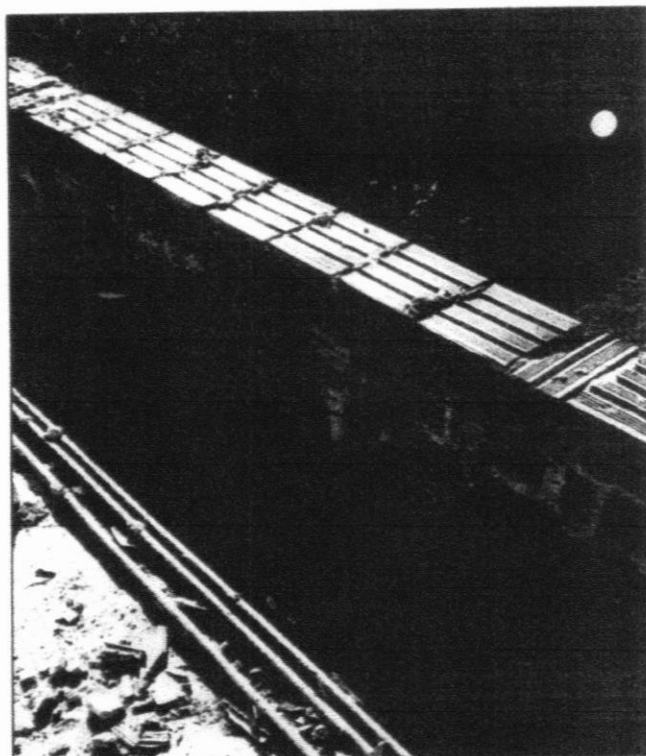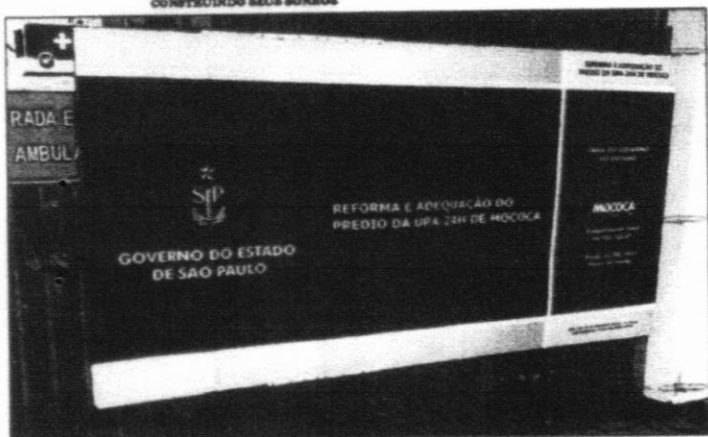

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/nº - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000

CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113

Email: buenoebueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461

BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.





[Faint, illegible text block on the left side of the page]

[Faint, illegible text block on the right side of the page]





# CONSTRUTORA HGB

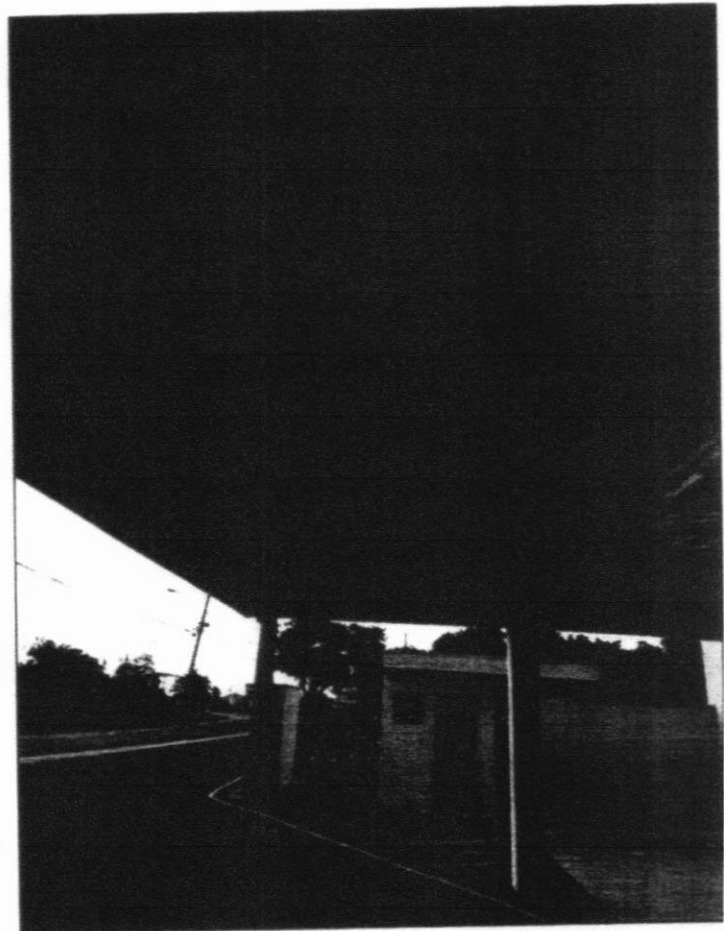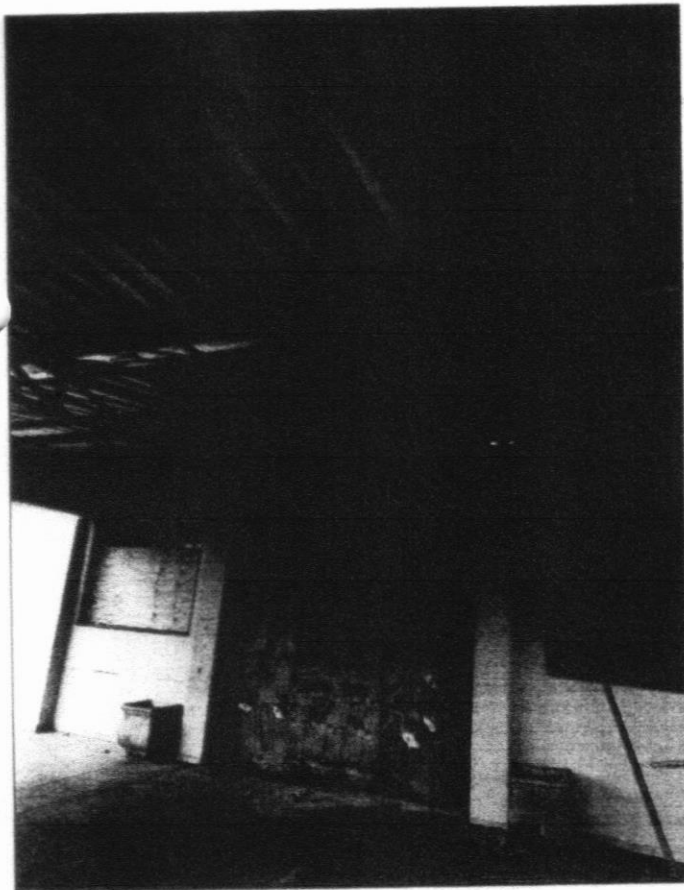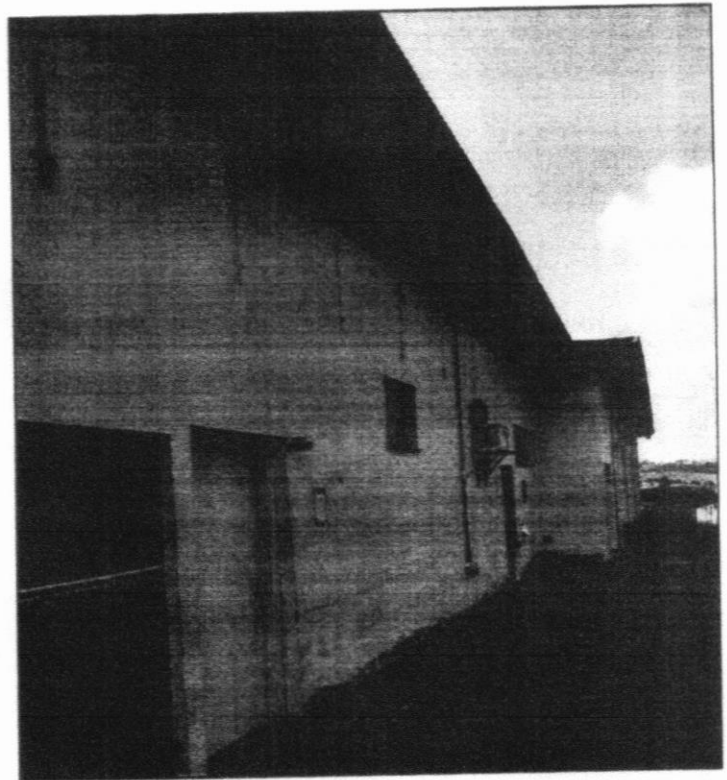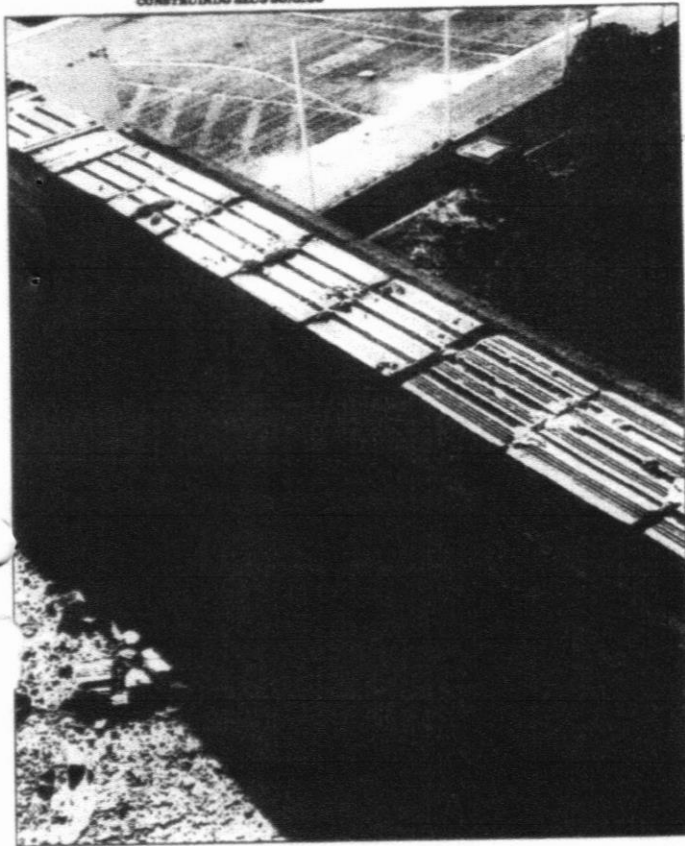

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547800

1950

[Faded text block]

[Faded text block]




[Faded text block]

[Faded text block]







# CONSTRUTORA HGB

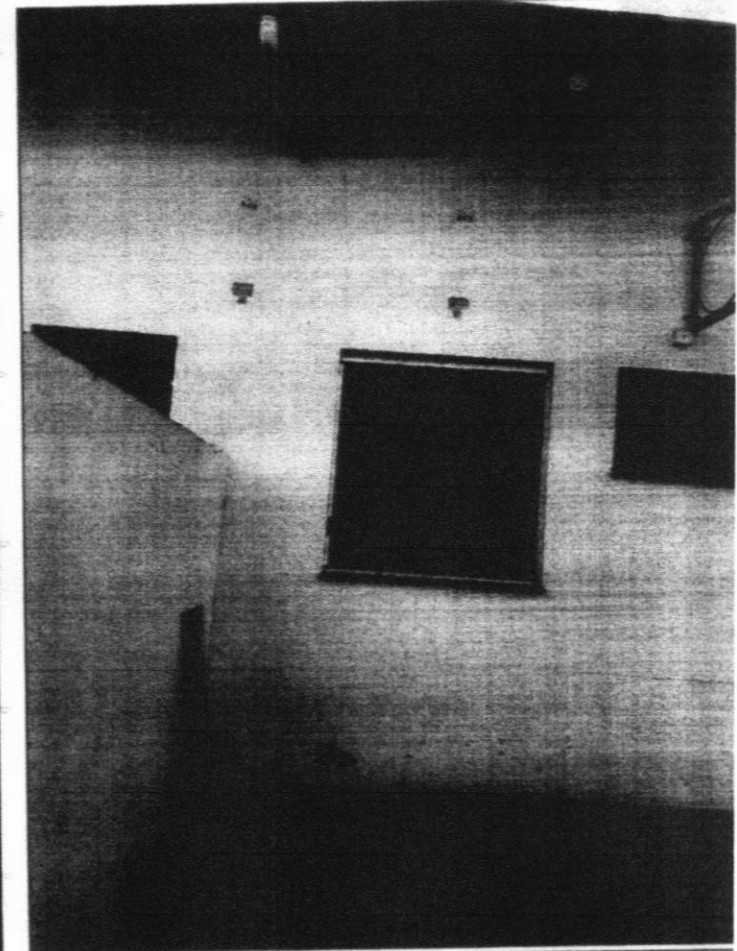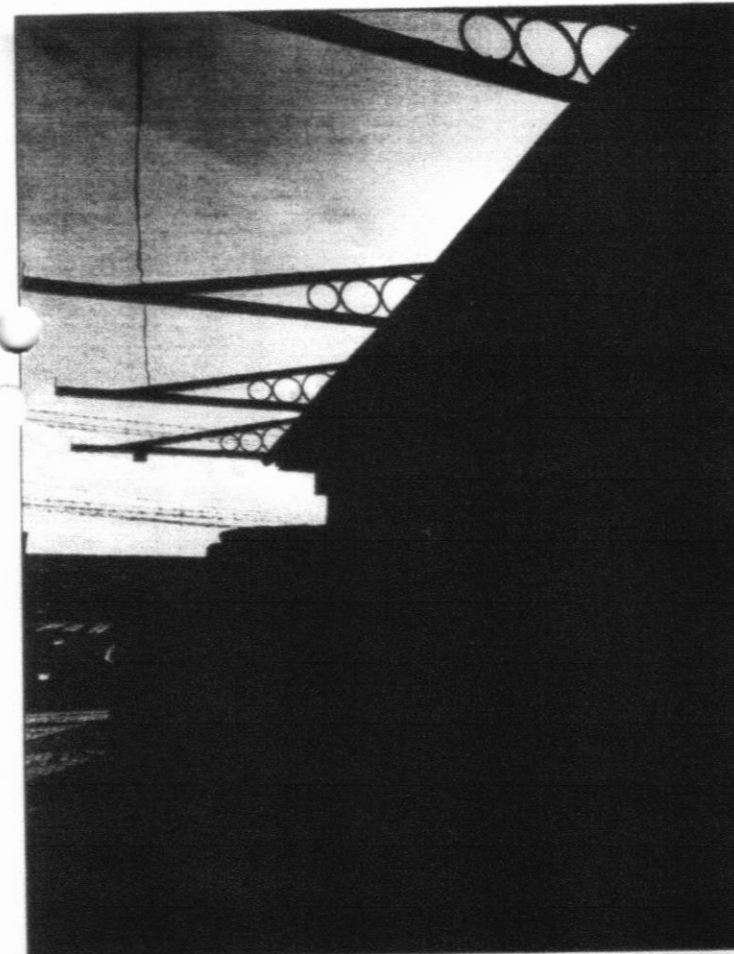

Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/n° - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000  
CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113  
Email: buenoebueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461  
BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.




Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA n° 5070547600

110





# CONSTRUTORA HGB

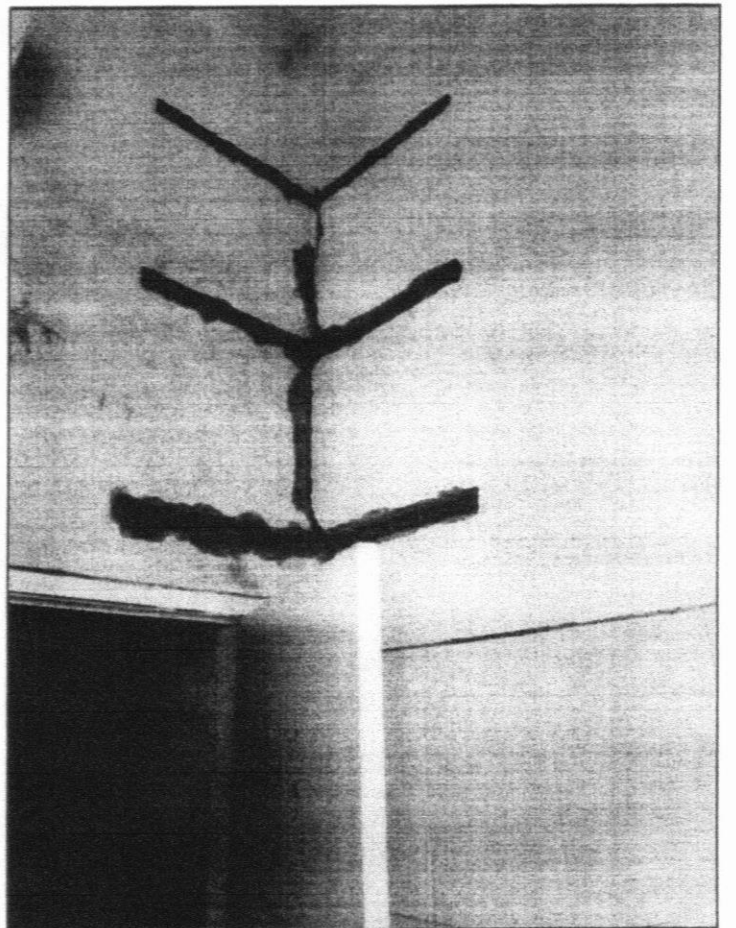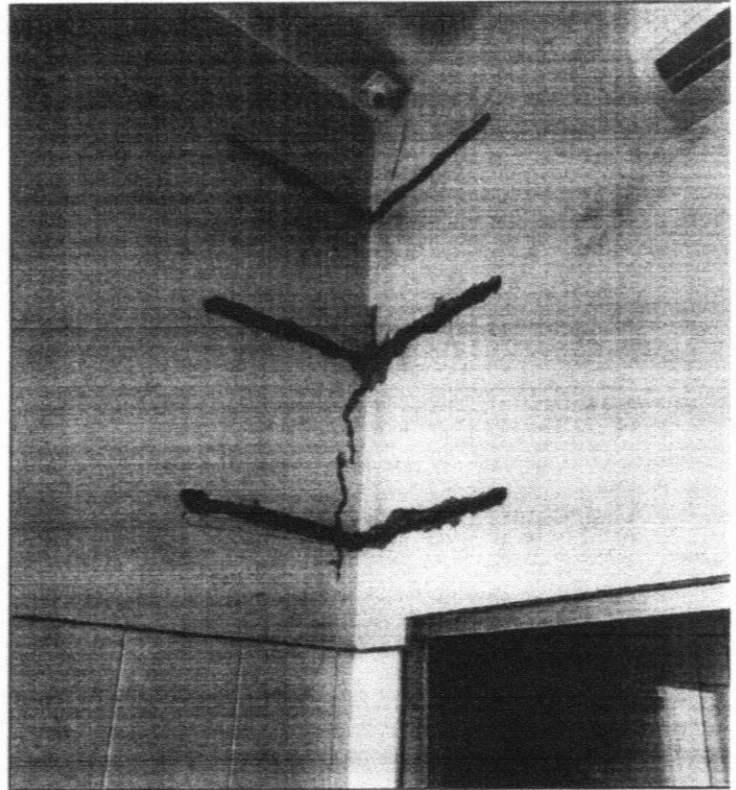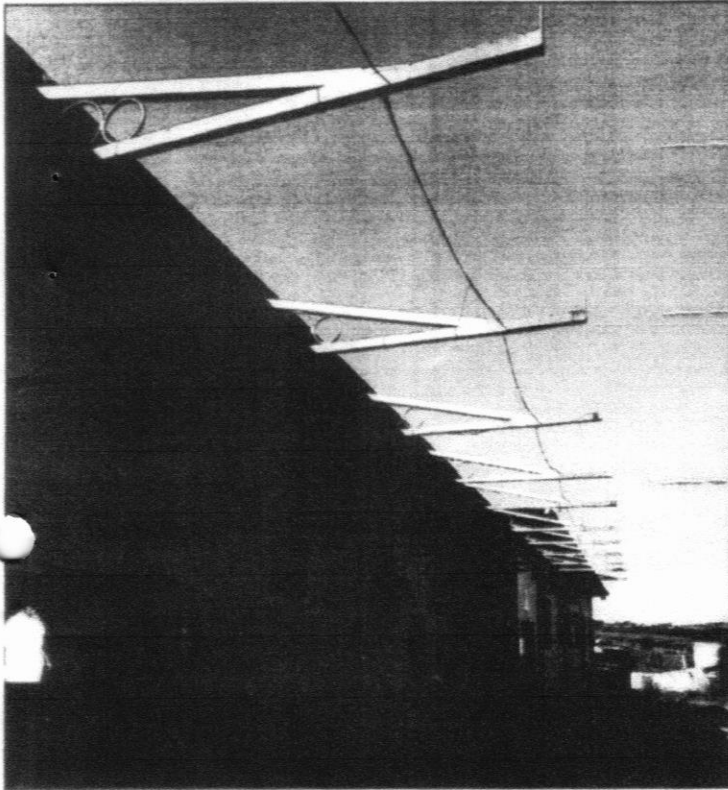





Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/n° - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000  
CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113  
Email: buenoebueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461  
BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600







# CONSTRUTORA HGB


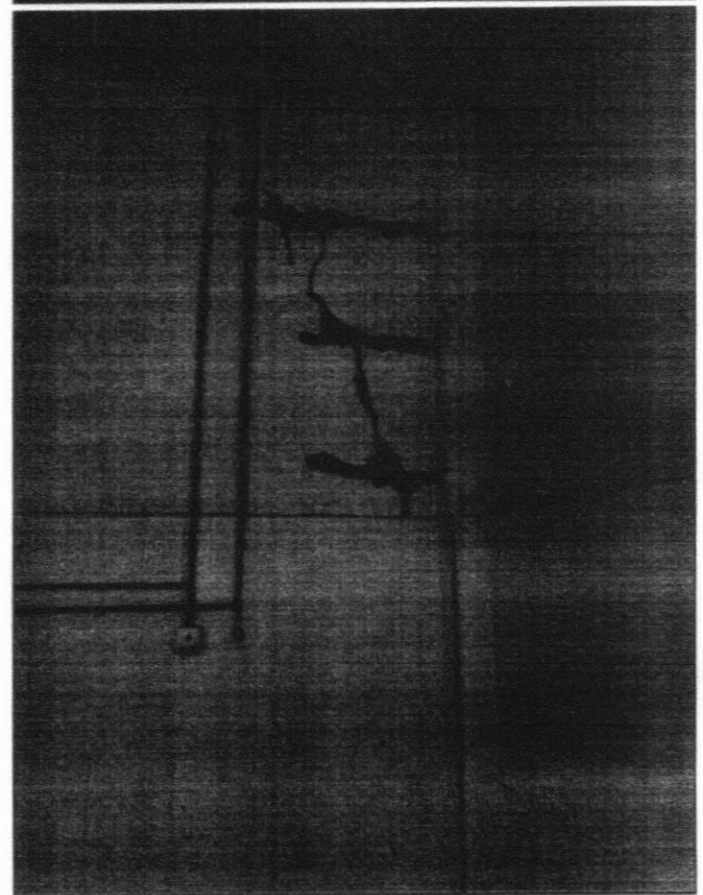
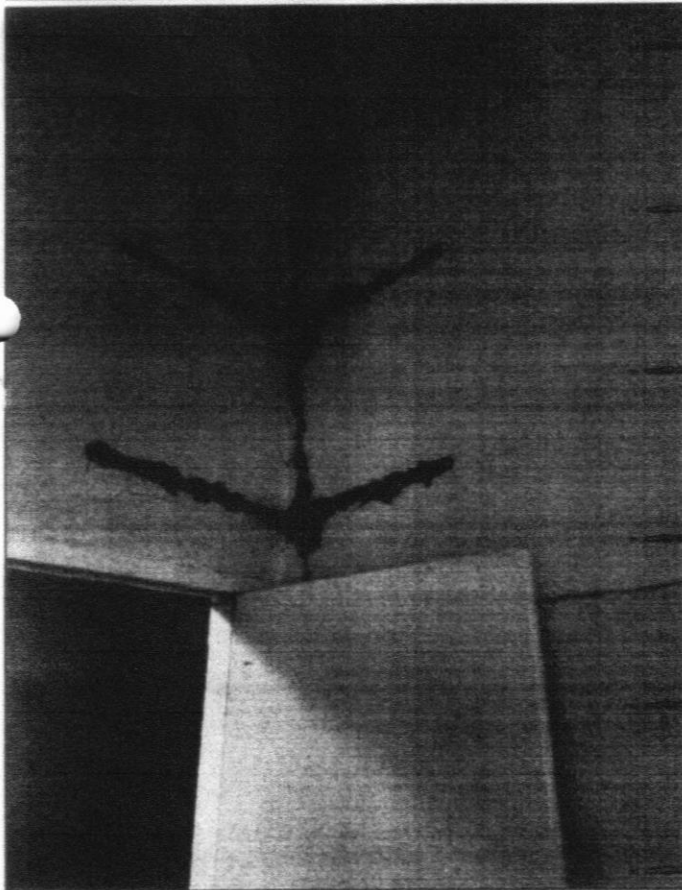
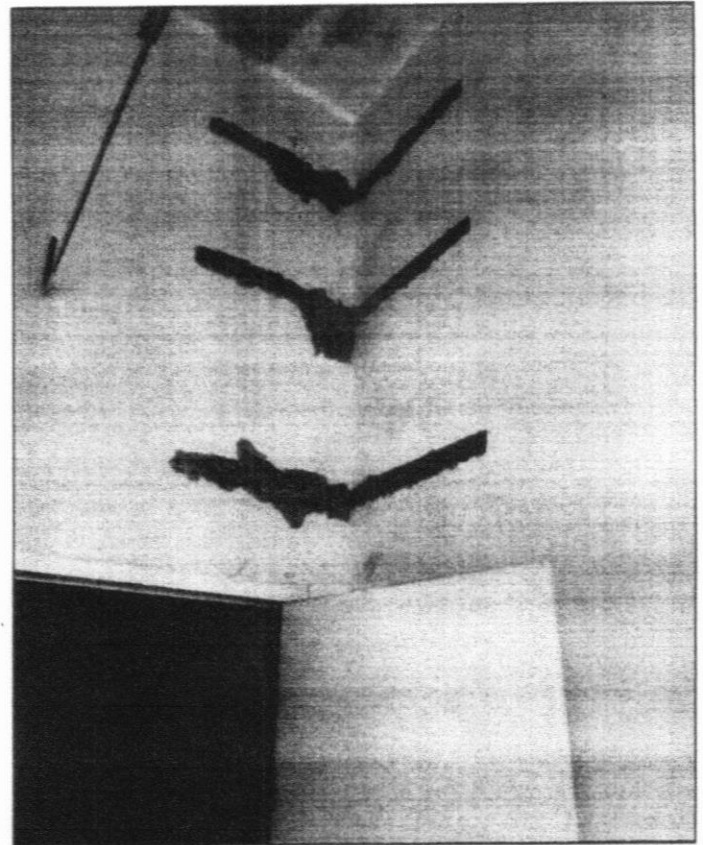
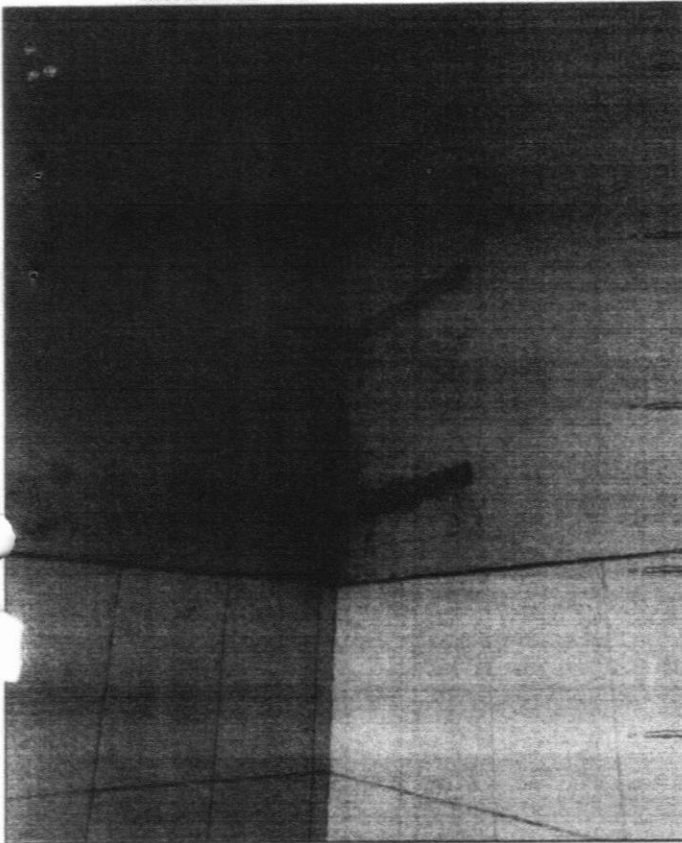


Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.





# CONSTRUTORA HGB

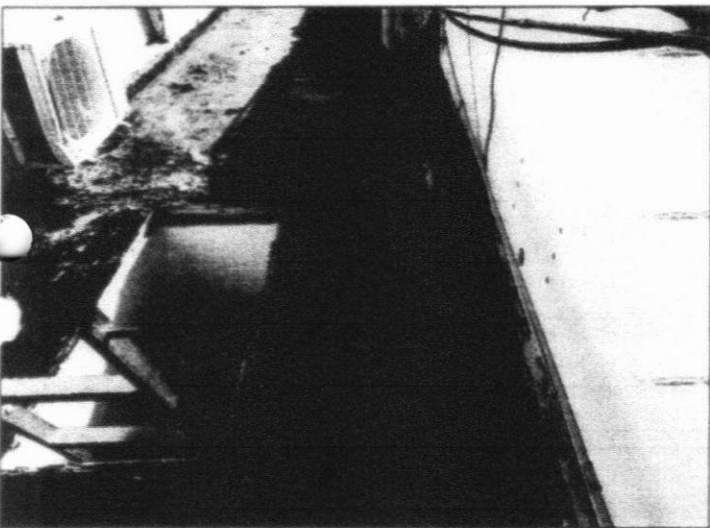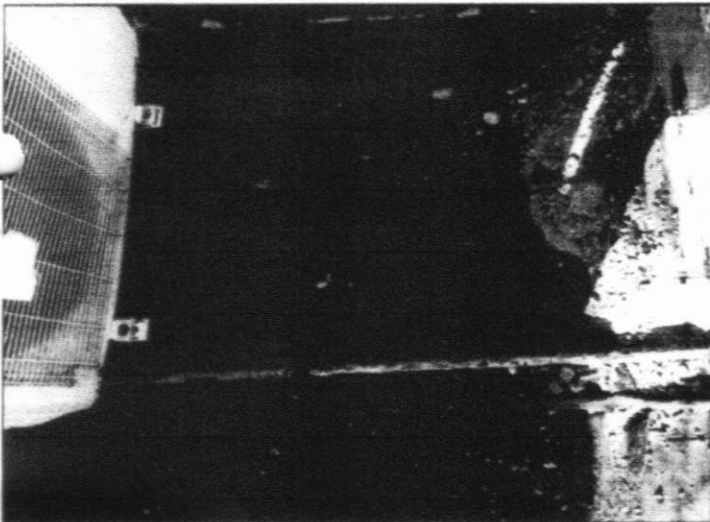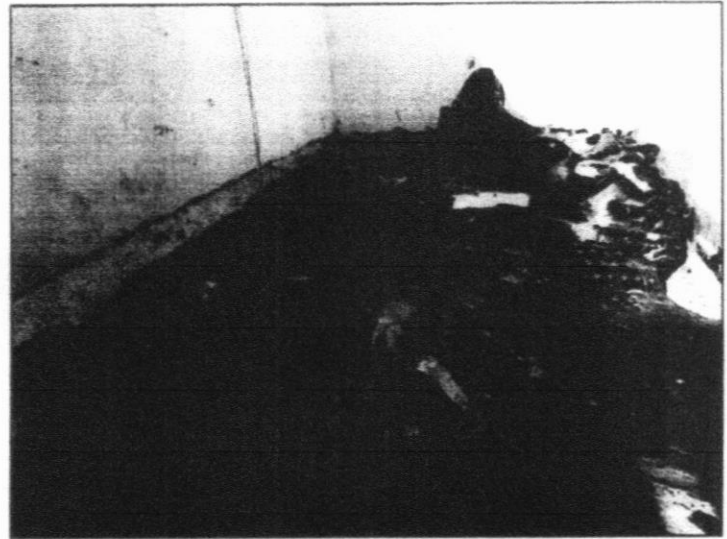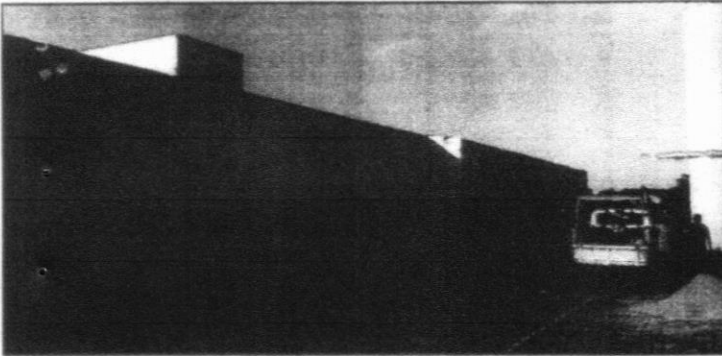

Tambaú – SP, 06 de julho de 2022.

  
**CONSTRUTORA HGB LTDA.**  
Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

16.898.251/0001-75  
CONSTRUTORA HGB LTDA  
Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-000 - Tambaú - SP





CONSTRUTORA HGB




# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO CONSTRUTORA HGB LTDA.

Obra: Reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Relatório fotográfico de serviços executados na obra. Instalação de Placa de Obra, instalação de container em obras, serviços de demolições em cobertura, laje impermeabilizante e domus. Levante de alvenaria em platibanda.






# CONSTRUTORA HGB

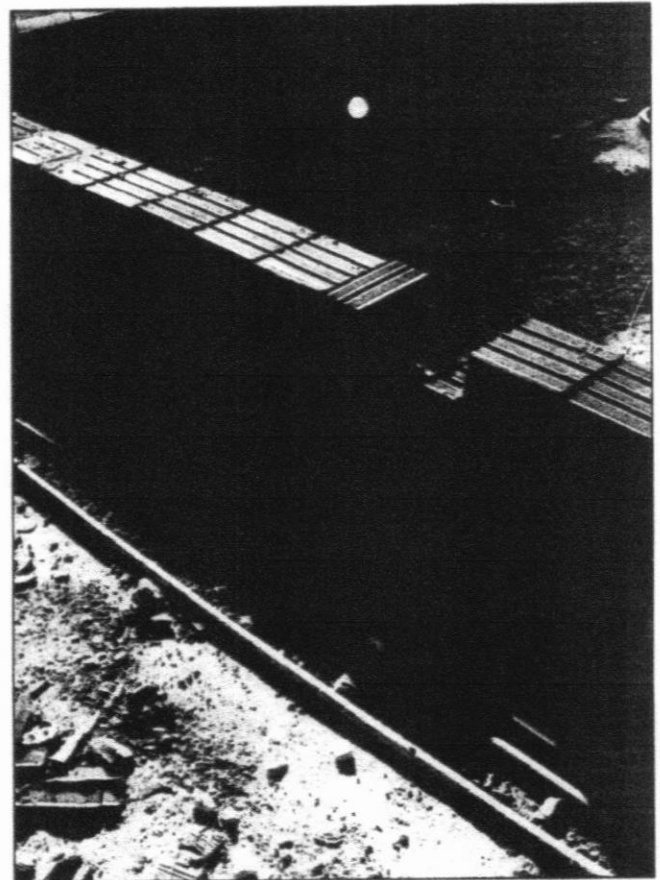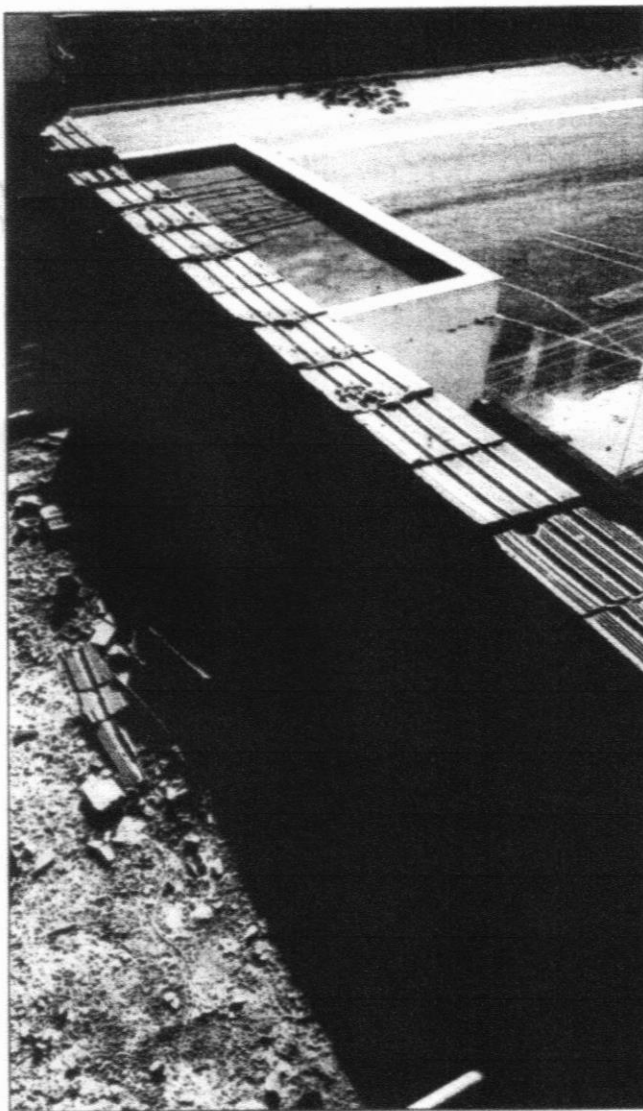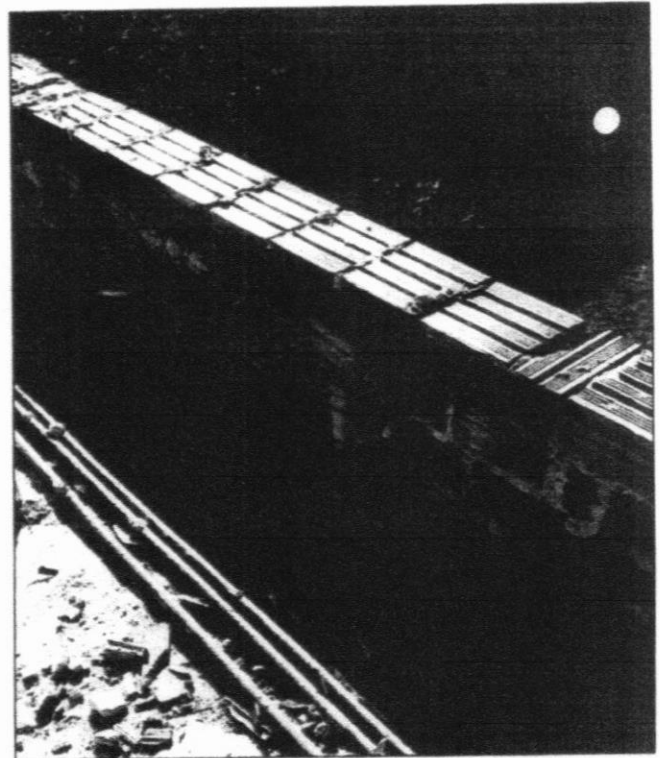

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 50705/17600




# CONSTRUTORA HGB

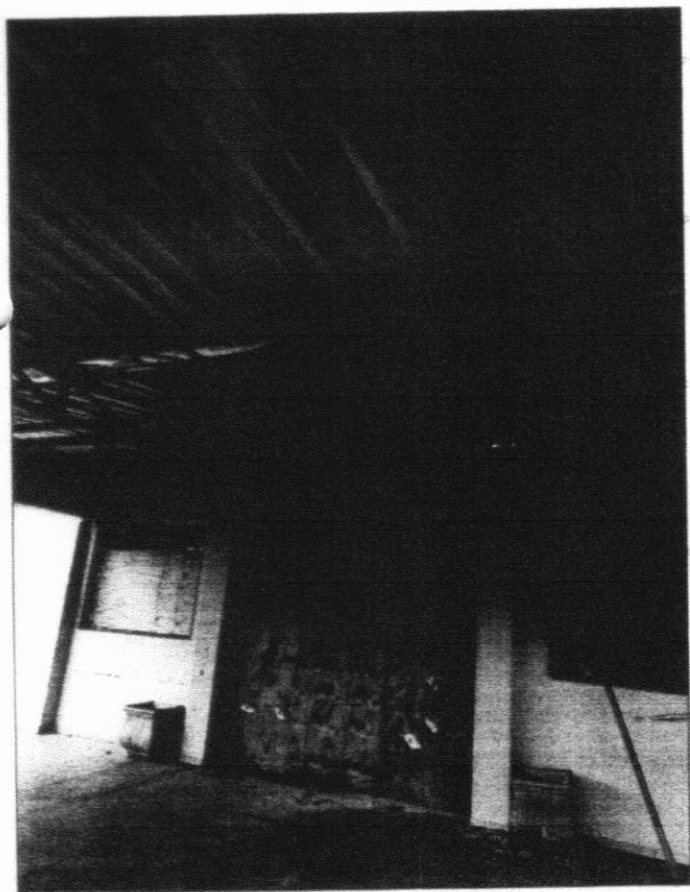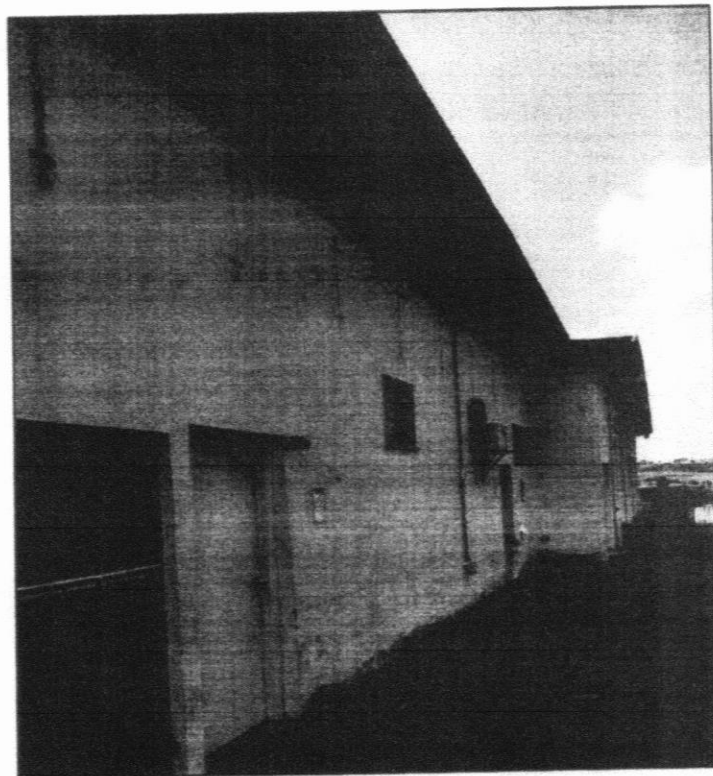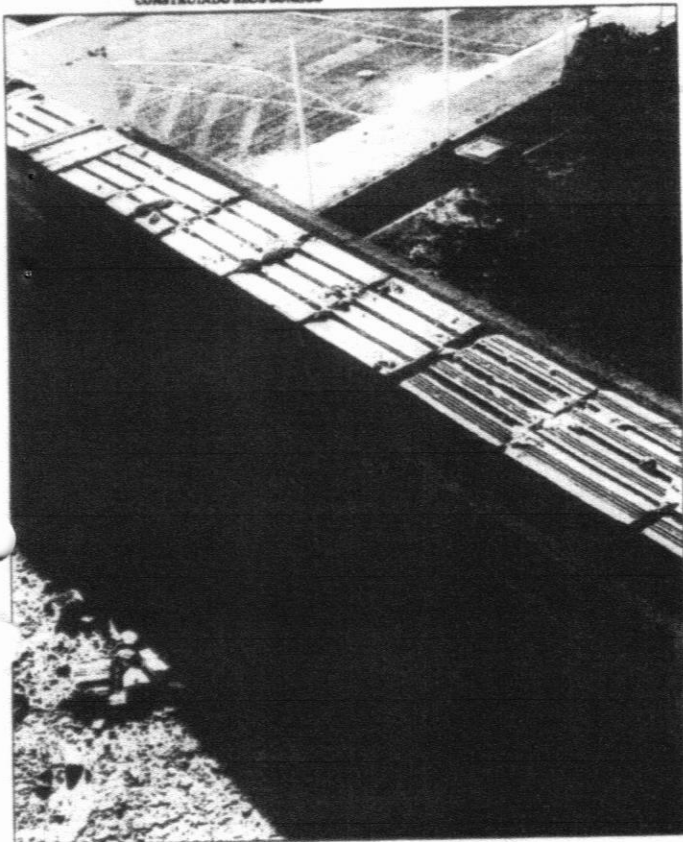




Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/n° - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000  
CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113  
Email: buenoebueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461  
BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA n° 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

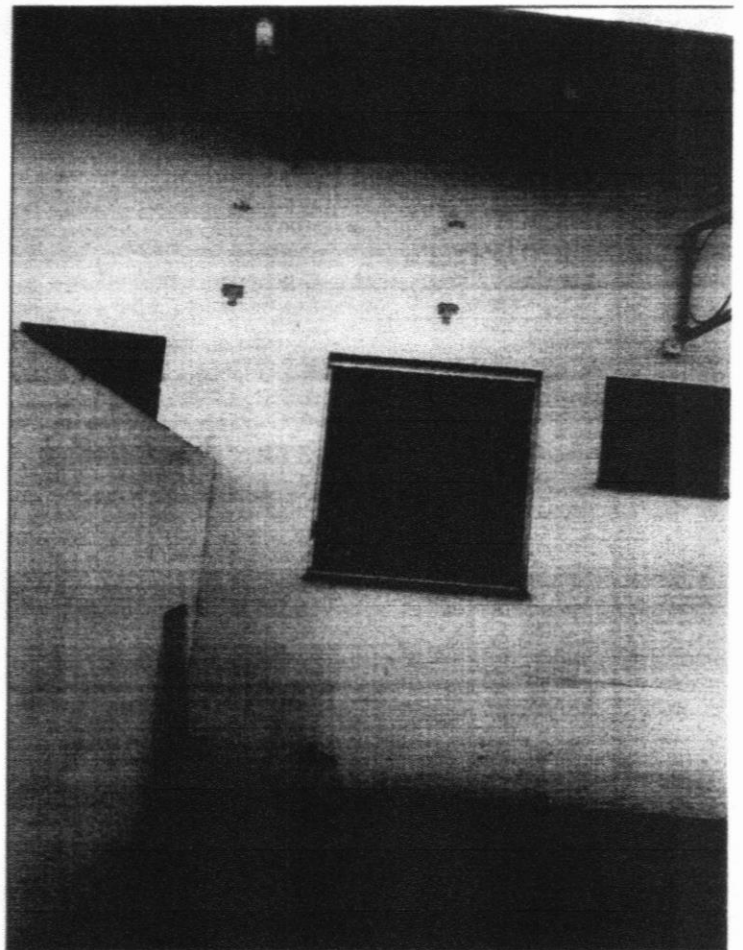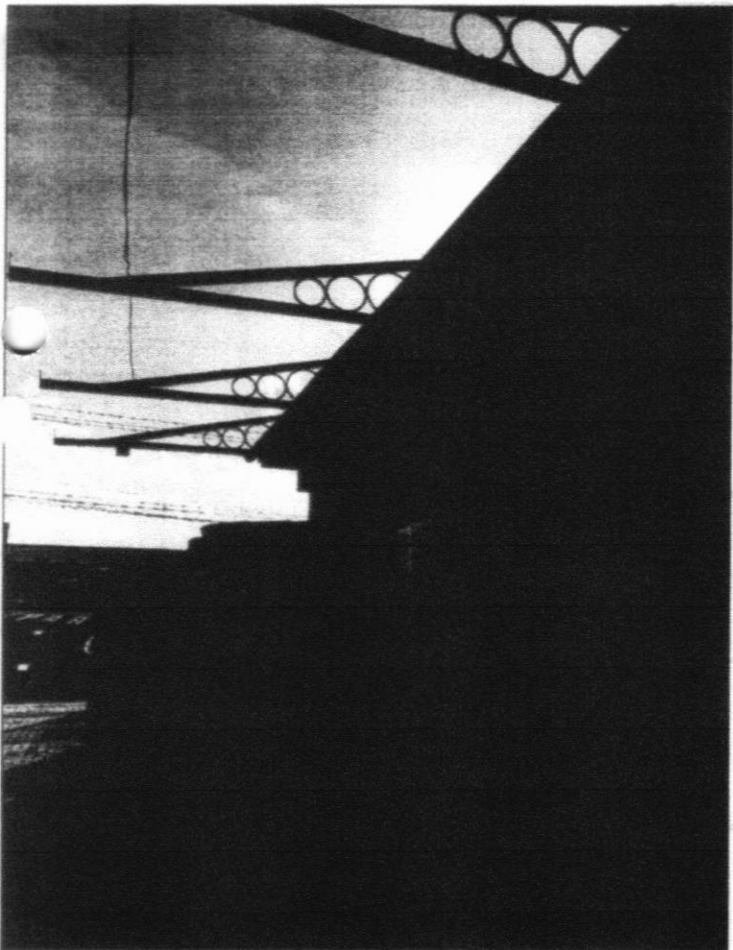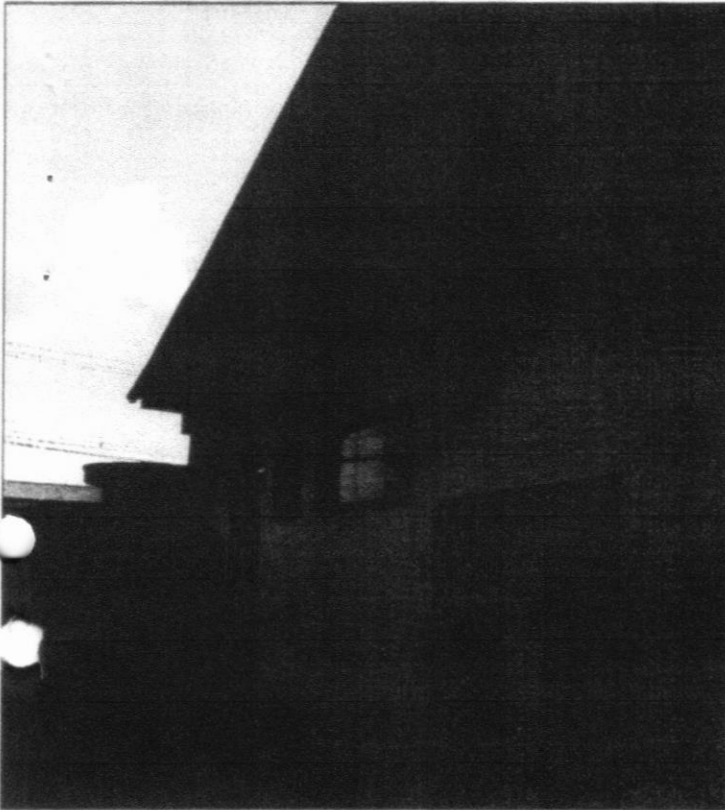

Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/n° - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000





CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113

Email: [buenoebueno.eng@outlook.com](mailto:buenoebueno.eng@outlook.com) - Fone: (19) 99289-0461

BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.





Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

4/11/2011






# CONSTRUTORA HGB

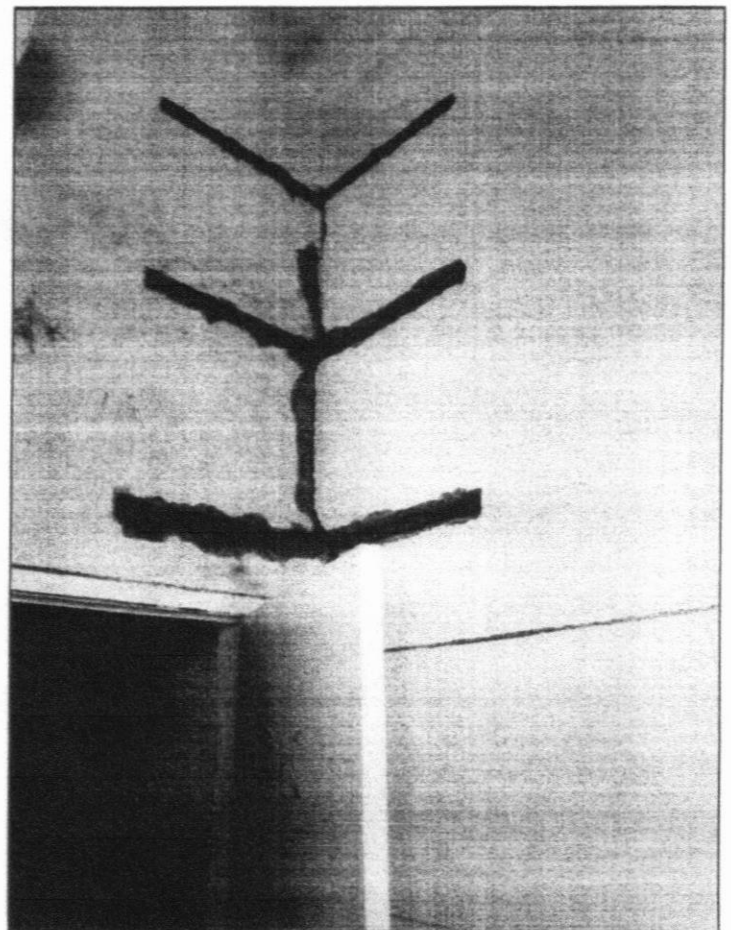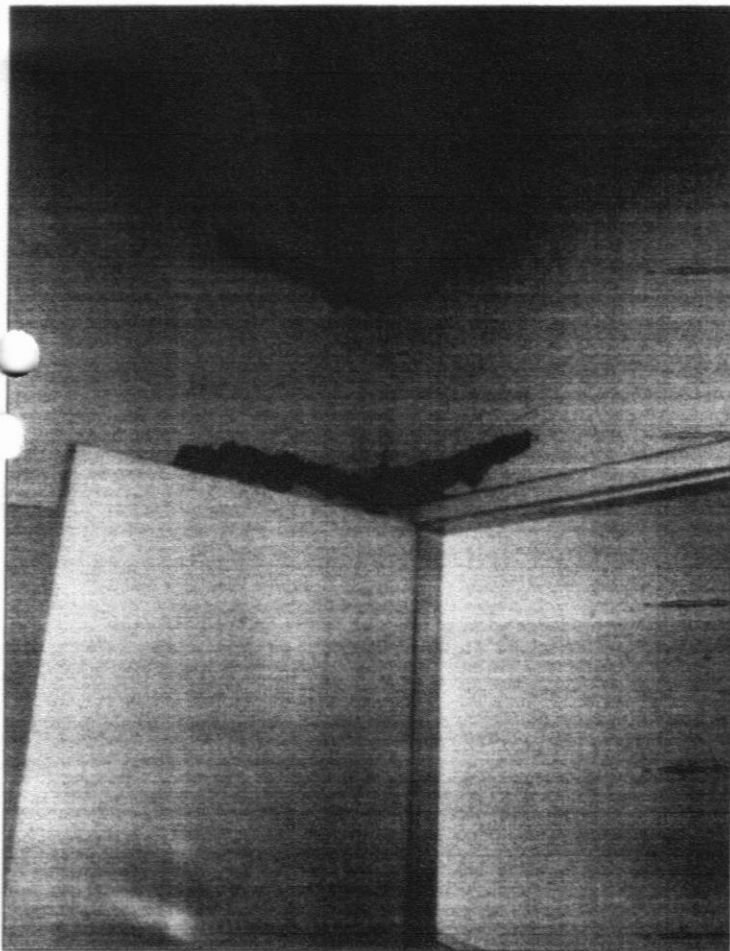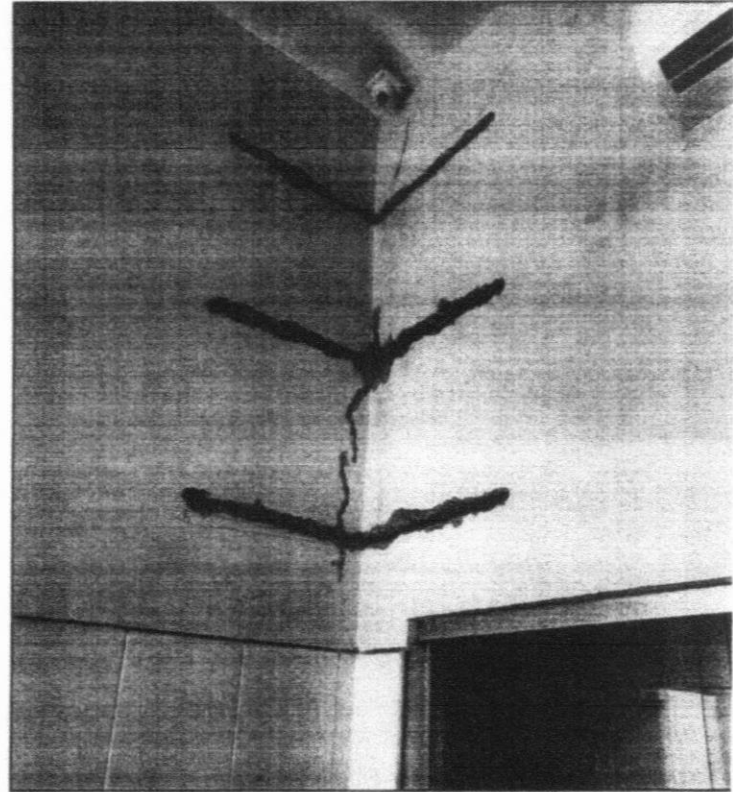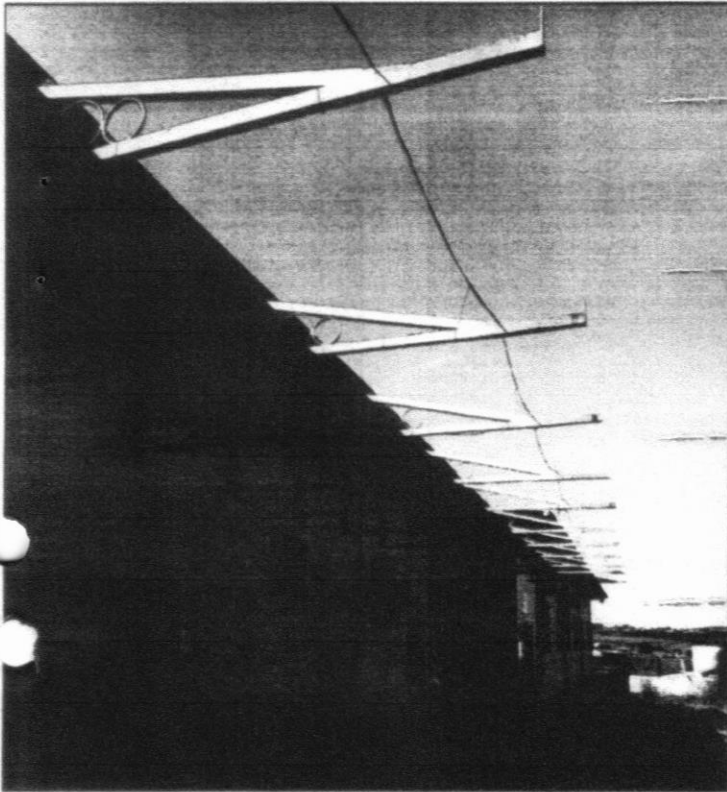





Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/n° - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000  
CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113  
Email: buenoebueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461  
BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA n° 5070547600





# CONSTRUTORA HGB

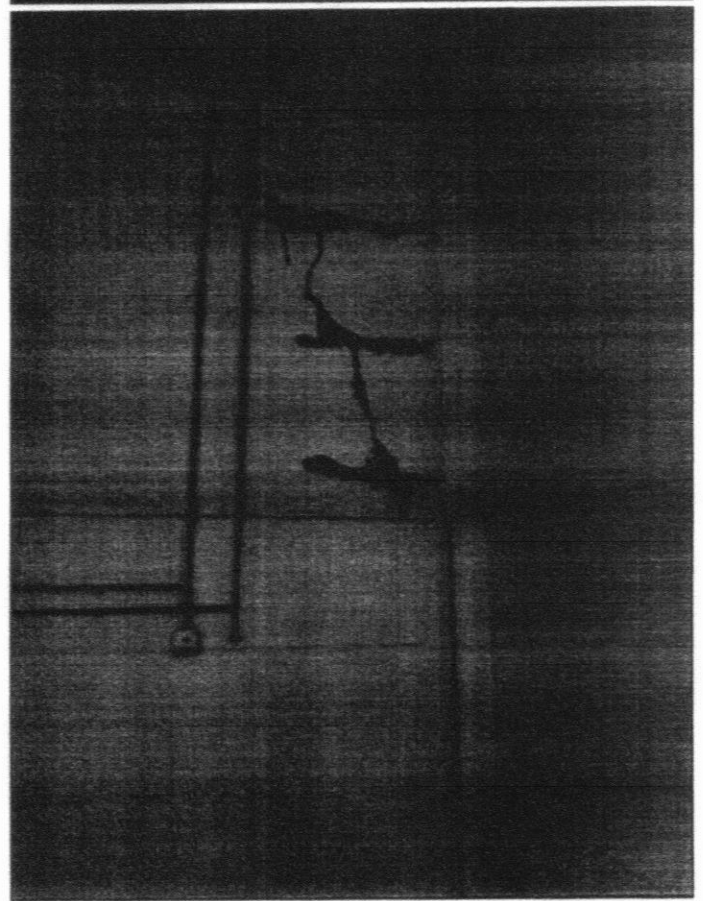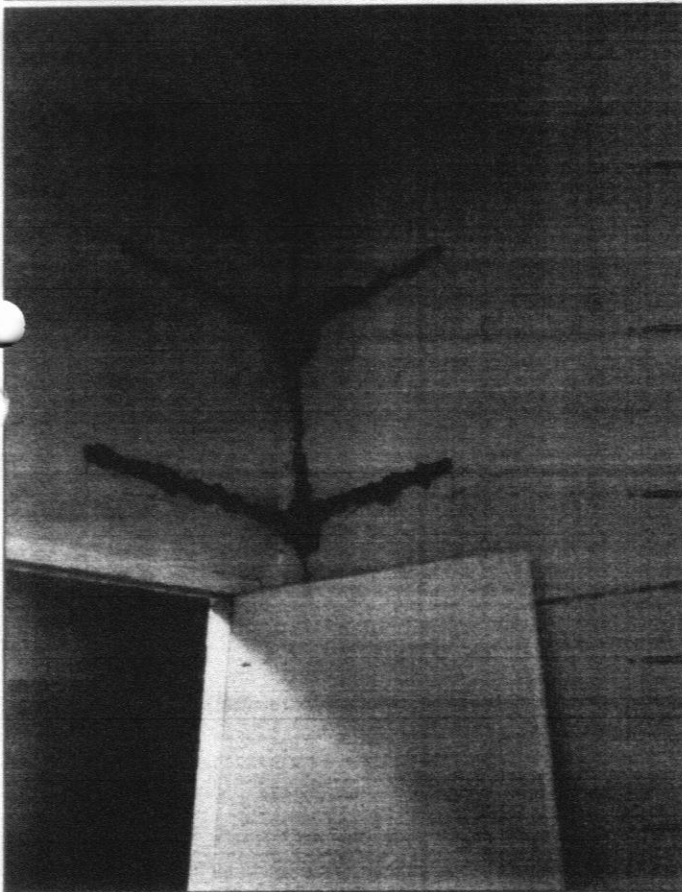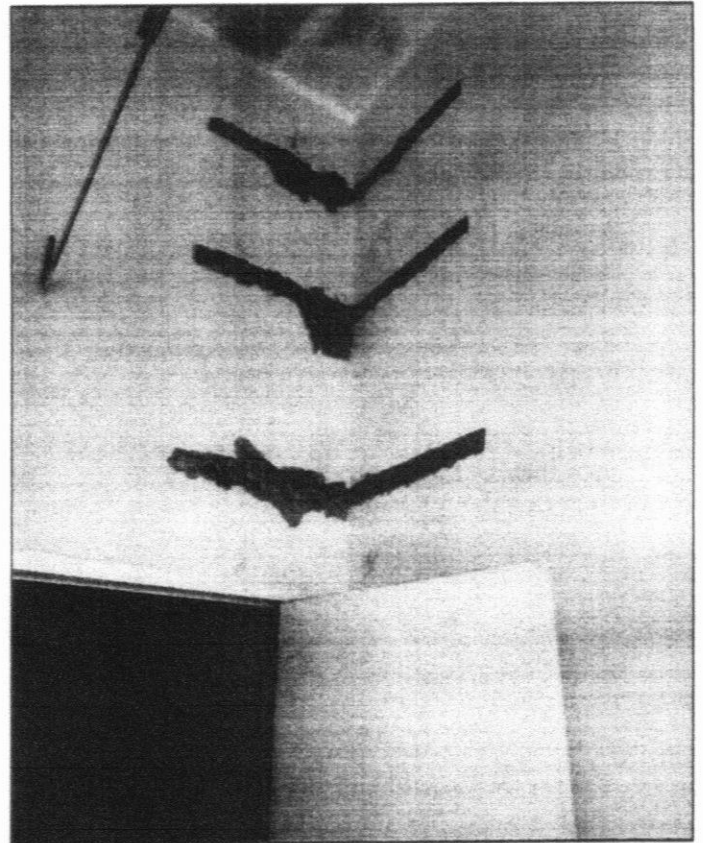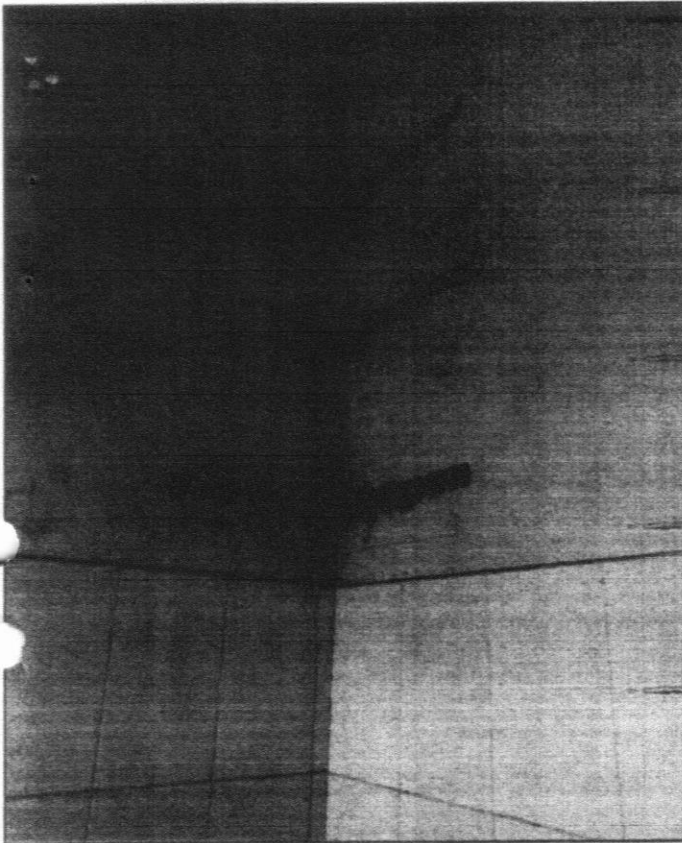


Rod Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/n° - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13.710-000

CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113

Email: buenoebueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461






BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070247600





# CONSTRUTORA HGB

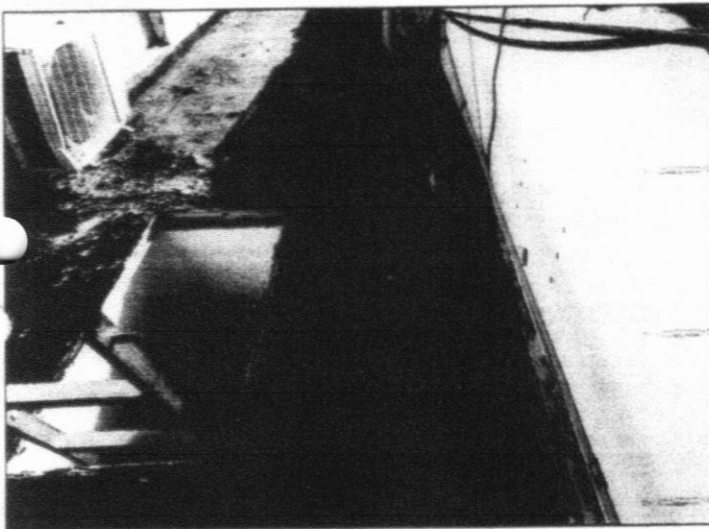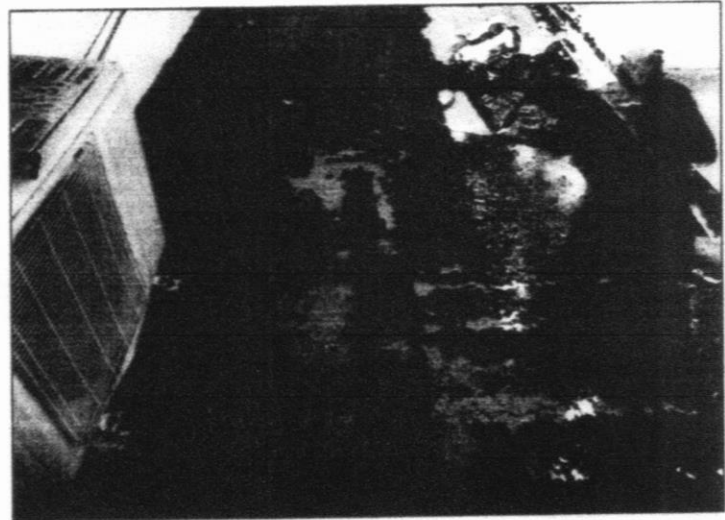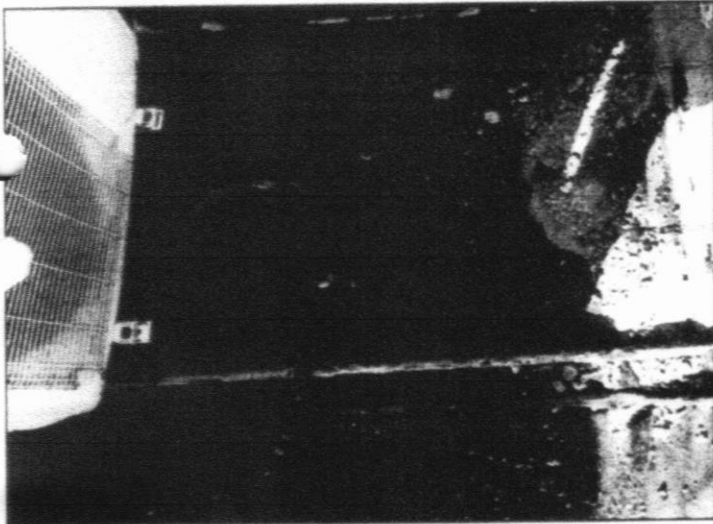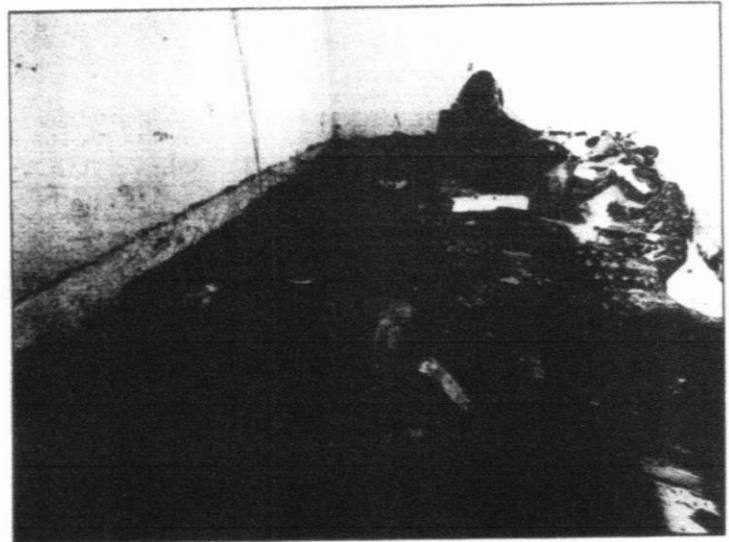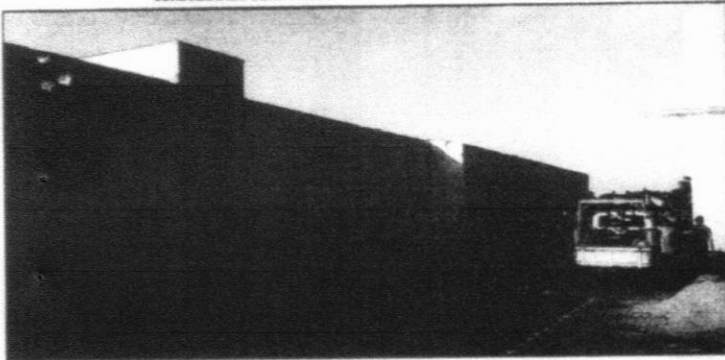

Tambaú – SP, 06 de julho de 2022.

**CONSTRUTORA HGB LTDA.**

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5070547600

16.898.251/0001-75

**CONSTRUTORA HGB LTDA**

Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural




CEP 13710-000 - Tambaú - SP

Rod. Padre Donizetti KM 1, Sala 02 s/nº - Zona Rural - Tambaú/SP - CEP 13 710-000

CNPJ 39.329.291/0001-00 - Inscrição Estadual 680.036.795.113

Email: buenobueno.eng@outlook.com - Fone: (19) 99289-0461

BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA HGB LTDA.  
CNPJ: 16.898.251/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:11:43 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **C762.60CE.9374.4CCD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.898.251/0001-75

**Razão Social:** CONSTRUTORA HGB LTDA

**Endereço:** ROD PADRE DONIZETTI SN KM1 / ZONA RURAL / TAMBAU / SP /  
13710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/06/2022 a 18/07/2022

**Certificação Número:** 2022061904235507226186

Informação obtida em 06/07/2022 09:05:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA HGB LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.898.251/0001-75

Certidão n°: 21174482/2022

Expedição: 06/07/2022, às 09:06:15

Validade: 02/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA HGB LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **16.898.251/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 16.898.251

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 37500101

Data e hora da emissão 06/07/2022 09:05:07

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Rendas Municipal


### Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 5943-0170-9377  
Contribuinte : CONSTRUTORA HGB LTDA  
CNPJ / CPF : 16.898.251/0001-75  
Inscrição : 24854  
Endereço : ROD: PADRE DONIZETTI - SP 332, 0 Compl.: KM 1.  
Barro : ZONA RURAL, CEP: 13710-000.  
Cidade : TAMBAÚ - SP.  
Emitida em : 06/07/2022 às 09:06:39  
Válida até : 05/08/2022

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;  
Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.  
As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida *via Internet*

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://138.0.102.2:12000/issonline/servlet/haenticadocumento>)





# CONSTRUTORA HGB

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ALOCADOS EM OBRA

REF.: TP 03/2022 – CONTRATO Nº 011/2022.

OBRA: REFORMA DA UPB "UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO".

Prezados Srs,

A **CONSTRUTORA HGB LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.898.251/0001-75, sediada na Rod. Padre Donizetti Km 1, S/N, Zona Rural, Tambaú/SP, vem através de seu representante legal abaixo assinado relacionar os funcionários alocados na obra em referência e também anexar as devidas folhas de pagamento, Atestados de Saúde Ocupacional e Controle de Fichas de EPI:

- 1) Marcos Antonio Batista Junior
- 2) Micael José Espedito Barbosa;
- 3) Valter Pereira dos Santos.

Sem mais para o momento,  
Atenciosamente.

Tambaú - SP, 06 de julho de 2022.

CONSTRUTORA HGB LTDA.

Guilherme Henrique Bueno  
Engenheiro Civil  
CREA 156070547600

16.898.251/0001-75  
CONSTRUTORA HGB LTDA  
Rod. Padre Donizetti, Km 1, S/N  
Zona Rural  
CEP 13710-000 - Tambaú - SP

0293-CONSTRUTORA HGB LTDA  
CONSTRUTORA HGB LTDA Tambau SP  
CNPJ 16.898.251/0001-75

Recibo de Pagamento de Salario  
06/2022 Adiantamento Sala

151 MARCOS ANTONIO BATISTA JUNIOR 717020 293 1 001.070 01  
SERVENTE DE PEDREIRO Data Admissao: 24/05/2022

B0 Adiantamento Salarial 40,00 % 667,56

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA GRAMA

667,56 0,00

667,56

1.668,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
CREDITO EM 20/06/2022

0293-CONSTRUTORA HGB LTDA  
CONSTRUTORA HGB LTDA Tambau SP  
CNPJ 16.898.251/0001-75

Recibo de Pagamento de Salario  
05/2022 Mensal

151 MARCOS ANTONIO BATISTA JUNIOR 717020 293 1 001.070 01  
SERVENTE DE PEDREIRO Data Admissao: 24/05/2022

Horas Normais Diurnas 8 Dias 430,68  
225 Contribuicao Assistencial % 1,50 % 6,46  
39% INSS 7,50 % 32,30

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA GRAMA

430,68 38,76

391,92


1.668,89 430,68 430,68 34,45 398,38 0,00

Marcos A. Batista Jr

21 06 22

Marcos A. Batista Jr

07 06 22



**Atestado de Saúde Ocupacional**

Admissional

Nome **MARCOS ANTONIO BATISTA JR**  
CPF **446.042.748-60**

**00000000000CHGB105 0**  
Nascimento **01/09/1993**

Empresa **CONSTRUTORA HGB LTDA**  
Setor **OBRAS**  
Profissão/ Função **SERVENTE DE PEDREIRO**

CNPJ **16.898.251/0001-75**

Em cumprimento à Portaria 3214/78 do MTb e Portaria 24/94 da SSST, que regulamentam o art. 168 da Consolidação das Leis Trabalhistas, atesto que o(a) paciente acima, foi examinado(a) clinicamente, goza atualmente de aparente estado de saúde física e mental.

Resultado  Apto(a)  Inapto(a) para admissão

**Exames Complementares para P.C.M.S.O.**

**Riscos Ocupacionais**

0296 ACUIDADE VISUAL - CONSULTA ELETIVA em 20/05/2022  
0281 AUDIOMETRIA em 20/05/2022  
0530 ELETROCARDIOGRAMA em 20/05/2022  
0536 ELETROENCEFALOGRAMA em 20/05/2022  
1057 ESPIROMETRIA em 20/05/2022  
0295 EXAME CLINICO em 20/05/2022  
0658 GLICOSE em 20/05/2022  
0693 HEMOGRAMA COMPLETO em 20/05/2022  
1078 RAIOS X TÓRAX em 20/05/2022

FÍSICOS: RUÍDOS, AERODISPERSÓIDES FIBROGENICO, AERODISPERSÓIDES NÃO FIBROGENICOS  
QUÍMICOS: FUMOS, AERODISPERSÓIDES FIBROGENICOS, AERODISPERSÓIDES NÃO FIBROGENICOS, SOLVENTES 1  
ERGONÔMICOS: OUTRAS SIT. CAUSADORAS STRESS  
FÍSICO/PSÍQUICO  
PREVENÇÃO: PREVENÇÃO, PREVENÇÃO 2, PREVENÇÃO 3

Santa Cruz das Palmeiras, 20 de maio de 2022


**GABRIEL PICOLO FILHO**  
MÉDICO DO TRABALHO CRM 54.189  
RUA SANTA CRUZ 500  
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP Fone 19 3672-2483

Ciente dos resultados dos exames e recebi cópia de igual teor

*Marcos Antonio Batista Jr*  
MARCOS ANTONIO BATISTA JR

*20, 5, 22*





0293-CONSTRUTORA HGB LTDA  
 CONSTRUTORA HGB LTDA Tambau SP  
 CNPJ 16.898.251/0001-75

Recibo de Pagamento de Salario  
 06/2022 Adiantamento Sala

150 MICAEL JOSE ESPEDITO BARBOSA 717020 293 1 001.070 01  
 SERVENTE DE PEDREIRO Data Admissao: 23/05/2022

80 Adiantamento Salarial	40,00 %	667,56			
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA GRAMA		667,56	0,00		
		→	667,56		
1.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO EM 20/06/2022					

21 06 22

0293-CONSTRUTORA HGB LTDA  
 CONSTRUTORA HGB LTDA Tambau SP  
 CNPJ 16.898.251/0001-75

Recibo de Pagamento de Salario  
 05/2022 Mensal

150 MICAEL JOSE ESPEDITO BARBOSA 717020 293 1 001.070 01  
 SERVENTE DE PEDREIRO Data Admissao: 23/05/2022

1 Horas Normais Diurnas	9 Dias	484,52			
Contribuinte Assistencial %	1,50 %		7,27		
INSS	7,50 %		36,33		
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA GRAMA		484,52	43,60		
		→	440,92		
1.668,89	484,52	484,52	38,76	448,19	0,00
CREDITO EM 06/06/2022					

07 06 22

# META

Mais saúde, mais resultado

META - Medicina do Trabalho Pícolo Ltda.

Rua Santa Cruz, 500

Bairro: Centro

CNPJ: 02.270.651/0001-27

Fone: 19 3672-2483

Santa Cruz das Palmeiras - SP

E Isenta

## Atestado de Saúde Ocupacional

Admissional

Nome MICHAEL JOSE ESPEDITO BARBOSA DOS SANTOS

CPF

00000000000CHGB104 0

Identidade 52585357816

Nascimento 04/05/2002

Empresa CONSTRUTORA HGB LTDA

Setor OBRAS

CNPJ 16.898.251/0001-75

Profissão/ Função SERVENTE DE PEDREIRO

Em cumprimento à Portaria 3214/78 do MTb e Portaria 24.94 da SSST, que regulamentam o art. 158 da Consolidação das Leis Trabalhistas, atesto que o(a) paciente acima, foi examinado(a) clinicamente, goza atualmente de aparente estado de saúde física e mental.

Resultado  Apto(a)  Inapto(a) para admissão

### Exames Complementares para P.C.M.S.O.

0296 ACUIDADE VISUAL - CONSULTA ELETIVA em 18/05/2022  
0281 AUDIOMETRIA em 18/05/2022  
0630 ELETROCARDIOGRAMA em 18/05/2022  
0536 ELETROENCEFALOGRAMA em 18/05/2022  
1057 ESPIROMETRIA em 18/05/2022  
0285 EXAME CLINICO em 18/05/2022  
0693 HEMOGRAMA COMPLETO em 18/05/2022  
1078 RAIO X TÓRAX em 18/05/2022

### Riscos Ocupacionais

FÍSICOS: RUÍDOS, AERODISPERSÓIDES FIBROGÊNICO  
AERODISPERSÓIDES NÃO FIBROGÊNICOS  
QUÍMICOS: FUMOS, AERODISPERSÓIDES FIBROGÊNICOS  
AERODISPERSÓIDES NÃO FIBROGÊNICOS, SOLVENTES,  
ERGONÔMICOS, OUTRAS SIT. CAUSADORAS STRESS  
FÍSICO/PSÍQUICO  
PREVENÇÃO: PREVENÇÃO 1 PREVENÇÃO 2 PREVENÇÃO 3

Santa Cruz das Palmeiras, 18 de maio de 2022

GABRIEL PÍCOLO FILHO

MÉDICO DO TRABALHO CRM 54.189

RUA SANTA CRUZ 500

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP Fone 19 3672-2483

Ciente dos resultados dos exames e recebi cópia de igual teor

MICHAEL JOSE ESPEDITO BARBOSA DOS SANTOS





# CONSTRUTORA HGB

CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP  
 Rod. Padre Donizetti, Km 01, S/N  
 Bairro: Zona Rural- Tambau SP

## FICHA DE CONTROLE E. P. I. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Funcionário: Michael José Expedito Barbosa dos Santos

Cargo/Função: Servente de Pedreiro

Setor: Obra Civil

Admissão: 23/05/2022

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins ter recebido da empresa CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) gratuitamente nos termos do artigo 166 da CLT e NR-6 item 6.3 e 6.2. conforme discriminados, onde terei que cumprir rigorosamente as exigências quanto ao uso, o qual recebi orientação e treinamento. Igualmente, estou ciente que de acordo com o artigo 158 da CLT parágrafo único, alínea "b" NR-6 item 6.7.1 e das normas vigentes, devo obrigatoriamente fazer uso dos EPI's durante toda jornada de trabalho, sendo este adequado para cada atividade laboral e que na ocorrência de qualquer fato que considere impeditivo a sua utilização, deverei informar imediatamente meu superior, para as providências que se fizerem necessárias e o devolverei após o vencimento de duração estipulada, afastamento ou em caso de dispensa, reembolsando a empresa no caso de danos por uso inadequado ou extravio, autorizando a empresa a realizar o desconto em meus vencimentos, conforme rege o artigo 46 parágrafo primeiro da CLT.

Ciente: [Assinatura]

DESCRIÇÃO DO E.P.I.	MOTIVO	Nº DO	RECEBIMENTO		
			DATA	QTDE.	ASSINATURA
Capacete Amarelo	A		20/05/22	1	[Assinatura]
Óculos proteção visua	A	34082	20/05/22	1	[Assinatura]
Óculos proteção transparente	A	24082	20/05/22	1	[Assinatura]
Máscara proteção PFF2 (S)	A	38503	20/05/22	1	[Assinatura]
Órteses auditivo	A	5745	20/05/22	1	[Assinatura]
Botina	A	12015	20/05/22	1	[Assinatura]
Uniforme	A	M	20/05/22	20	[Assinatura]
Luva emborrachada	A	45996	20/05/22	1	[Assinatura]
Luva emborrachada	B	45996	04/07/22	1	[Assinatura]
Óculos proteção visua	B	34082	04/07/22	1	[Assinatura]

Calça:

P M G GG XG

Calçado:

Camisa:  M


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Outro

Observações:

MOTIVO:

A -RecebimentoInicial  
 B- Troca

C -Extravio  
 D - Devolução



0293-CONSTRUTORA HGB LTDA  
CONSTRUTORA HGB LTDA Tambau SP  
CNPJ 16.898.251/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário  
06/2022 Adiantamento Sala

141 VALTER PEREIRA DOS SANTOS 715210 293 1 001.070 01  
PEDREIRO Data Admissao: 29/03/2022

80 Adiantamento Salarial 40,00 % 812,08

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA GRAMA

812,08 0,00

812,08

2.030,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
CREDITO EM 20/06/2022

*01 de 06 20027 Valter dos S*

0293-CONSTRUTORA HGB LTDA  
CONSTRUTORA HGB LTDA Tambau SP  
CNPJ 16.898.251/0001-75

Recibo de Pagamento de Salario  
05/2022 Mensal

141 VALTER PEREIRA DOS SANTOS 715210 293 1 001.070 01  
PEDREIRO Data Admissao: 29/03/2022

Horas Normais Diurnas 30 Dias 2.030,19  
Convenio 195,17  
Contribuicao Assistencial % 1,50 % 30,45  
Desconto Adiantamento Salarial 812,08  
INSS 9,00 % 184,53

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA GRAMA

2.030,19 1.202,83

827,96

2.030,19 2.030,19 2.030,19 162,41 1.865,65 0,00  
CREDITO EM 06/06/2022

*7 de 06 2022 Valter dos S*



**META - Medicina do Trabalho Pícolo Ltda.**

Rua Santa Cruz, 500

Bairro Centro

CNPJ: 02.270.651/0001-27

Fone: 19 3672-2483

Santa Cruz das Palmeiras - SP

I.E.: Isenta

**Atestado de Saúde Ocupacional**

Admissional

Nome VALTER PEREIRA DOS SANTOS  
CPF 346.521.008-50  
Identidade  
Empresa CONSTRUTORA HGB LTDA  
Setor OBRAS  
Profissão/ Função PEDREIRO

000000000000CHGB93 0  
Nascimento 18/09/1986  
CNPJ 16.898.251/0001-75

Em cumprimento à Portaria 3214/78 do MTb e Portaria 24/94 da SSST, que regulamentam o art. 168 da Consolidação das Leis Trabalhistas, atesto que o(a) paciente acima foi examinado(a) clinicamente, goza atualmente de aparente estado de saúde física e mental.

Resultado  Apto(a)  Inapto(a) para admissão

**Exames Complementares para P.C.M.S.O.**

0296 ACUIDADE VISUAL - CONSULTA ELETIVA em 23/03/2022  
0261 AUDIOMETRIA em 23/03/2022  
0530 ELETROCARDIOGRAMA em 23/03/2022  
0538 ELETROENCEFALOGRAMA em 23/03/2022  
1057 ESPIROMETRIA em 23/03/2022  
0295 EXAME CLINICO em 23/03/2022  
0658 GLICOSE em 23/03/2022  
0693 HEMOGRAMA COMPLETO em 23/03/2022  
1078 RAIOS X TÓRAX em 23/03/2022

**Riscos Ocupacionais**

FÍSICOS: RUÍDOS, AERODISPERSÓIDES FIBROGÊNICO, AERODISPERSÓIDES NÃO FIBROGÊNICOS  
QUÍMICOS: FUMOS, AERODISPERSÓIDES FIBROGÊNICOS, AERODISPERSÓIDES NÃO FIBROGÊNICOS, SOLVENTES 1  
ERGONÔMICOS: OUTRAS SIT. CAUSADORAS STRESS FÍSICO/PSÍQUICO  
PREVENÇÃO: PREVENÇÃO 1, PREVENÇÃO 2, PREVENÇÃO 3

Santa Cruz das Palmeiras, 23 de março de 2022

**GABRIEL PÍCOLO FILHO**

MÉDICO DO TRABALHO CRM 54.189

RUA SANTA CRUZ 500

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP Fone 19 3672-2483

Ciente dos resultados dos exames e recebi cópia de igual teor

*Valter Pereira dos Santos*  
VALTER PEREIRA DOS SANTOS



# CONSTRUTORA HGB

CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP  
 Rod. Padre Donizetti, Km 01, S/N  
 Bairro: Zona Rural- Tambau SP

## FICHA DE CONTROLE E. P. I. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Funcionário: Valter Pereira dos Santos

Cargo/Função: Pedreiro

Setor: \_\_\_\_\_ Admissão: 25/03/2022

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins ter recebido da empresa CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) gratuitamente nos termos do artigo 166 da CLT e NR-6 item 6.3 e 6.2, conforme discriminados, onde terei que cumprir rigorosamente as exigências quanto ao uso, o qual recebi orientação e treinamento. Igualmente, estou ciente que de acordo com o artigo 158 da CLT parágrafo único, alínea "b" NR-6 item 6.7.1 e das normas vigentes, devo obrigatoriamente fazer uso dos EPI's durante toda jornada de trabalho, sendo este adequado para cada atividade laboral e que na ocorrência de qualquer fato que considere impeditivo a sua utilização, deverei informar imediatamente meu superior, para as providências que se fizerem necessárias e o devolverei após o vencimento de duração estipulada, afastamento ou em caso de dispensa, reembolsando a empresa no caso de danos por uso inadequado ou extravio, autorizando a empresa a realizar o desconto em meus vencimentos, conforme rege o artigo 4º parágrafo primeiro da CLT

Ciente: Valter Pereira dos Santos

DESCRIÇÃO DO E.P.I.	MOTIVO	Nº DO	RECEBIMENTO		
			DATA	QTDE.	ASSINATURA
2 laminais Manga longa	A	M	25/03/2022	2	x Valter
Capacete Verde	A	31469	25/03/2022	1	x Valter
Luva emborrachada	A	34082	25/03/2022	1	x Valter
Óculos auditivos	A	14470	25/03/2022	1	x Valter
Impacador PFF2	A	34129	25/03/2022	1	x Valter
Óculos proteção visua	A	34082	25/03/2022	1	x Valter
Óculos proteção transparente	A	34082	25/03/2022	1	x Valter
Armadilha	A	-	25/03/2022	1	x Valter
Luvas	A	-	25/03/2022	1	x Valter
Bateria segurança	A	17015	25/03/2022	1	x Valter

Calça:  P  M  G  GG  XG

Camisa:  M            40  41  42  43  Outro

Calçado:  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  Outro

Observações: \_\_\_\_\_

MOTIVO:  
 A - Recebimento Inicial  
 B - Troca  
 C - Extravio  
 D - Devolução



**CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA**



**Informações da obra**

Número de inscrição da obra 90.011.31721/78 Nome da obra CONSTRUTORA HGB LTDA. Data do cadastramento 06/07/2022 10:31

Origem do cadastramento e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 08/06/2022 CNAE 4120400 Construção de edifícios

**Situação da obra**

Situação Ativa Data 08/06/2022

**Endereço**

País BRASIL Município MOCOCA UF SP CEP 13.737-632

Bairro CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI Logradouro AVENIDA MONSENHOR DEMOSTHENES PARANA BRASIL PONTES

Número 1655 Complemento AREA A4

**Responsável**

Nome CONSTRUTORA HGB LTDA. CPF/CNPJ 16.898.251/0001-75 Vínculo Construtora

Data de início da responsabilidade 08/06/2022 Data de término da responsabilidade

**Contratantes**

CPF/CNPJ	Nome
44.763.928/0001-01	MUNICIPIO DE MOCOCA

**Áreas Principais**

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	1.022,55 m <sup>2</sup>
Reforma	Comercial salas e lojas	Mista	1.022,55 m <sup>2</sup>

**Área Resultante**

Área Resultante da Obra 1.022,55 m<sup>2</sup>

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 TOMADOR

EMPRESA: CONSTRUTORA HGB LTDA  
 COM: 06/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA HGB OPA MOCOCA Nº CONTROLE: HSELP630G00000-1 INSCRIÇÃO: 16.898.251/0001-75  
 LOGRADOURO: Rodovia PADRE DONIZETTI KM 1 0 SN CEP: 13710-000 BAIRRO: ZONA RURAL. CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: Tambaú UF: SP TELEFONE: 0019-36733021 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL.

SEGURO	Empregados/Avulsos	486,71	0,00	0,00	0,00	486,71
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	Empregados/Avulsos	1.202,80	0,00	0,00	0,00	1.202,80
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	90,21	0,00	0,00	0,00	90,21
	RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.779,72	0,00	0,00	0,00	1.779,72
	OUTRAS ENTIDADES	348,81	0,00	0,00	0,00	348,81
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	348,81	0,00	0,00	0,00	348,81
	TOTAL A RECOLHER	2.128,53	0,00	0,00	0,00	2.128,53

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000290 129001802202 707666200817 689825100011

EMPRESA: CONSTRUTORA HGB LTDA INSCRIÇÃO: 16.898.251/0001-75 N° ARQUIVO: FQAMGADDFR200000-1  
 EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 06/2022 N° CONTROLE: K8ZAYVEAYOX0000-1  
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA HGB UPA MOCOCA INSCRIÇÃO: 900113172178 N° CONTROLE: HSLPWC50GUN0000-1  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 AVENIDA MONSENHOR DEMOSTHENES PARANA BRASIL PONT 1 CONJUNTO MOCOCA 13737632 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.014,01	REM SEM 13º SALÁRIO	6.014,01
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	481,10
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.014,01	REM SEM 13º SALÁRIO	6.014,01
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	486,71	DEPÓSITO	481,10
VAL DEVIDO PREV SOC	2.128,53	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REMBOLSO
CONSTRUTORA HGB LTDA	CONSTRUTORA HGB LTDA	CONSTRUTORA HGB LTDA	DEP FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
152,63	408,05	110,08	900007311174	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						
CONSTRUTORA HGB LTDA	189,61	496,39	133,91	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						
CONSTRUTORA HGB LTDA	502,21	1.330,05	358,80	0,00	2.191,06	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						
CONSTRUTORA HGB LTDA	910,20	2.383,00	642,85	0,00	3.936,05	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						
CONSTRUTORA HGB LTDA	381,56	1.016,89	274,32	0,00	1.672,77	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						
CONSTRUTORA HGB LTDA	340,79	900,98	243,05	0,00	1.484,82	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						
CONSTRUTORA HGB LTDA	486,71	1.293,01	348,81	0,00	2.128,53	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA HGB LTDA - 16.898.251/0001-75						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/07/2022  
HORA: 15:51:42  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA HGB LTDA  
COMPETÊNCIA: 06/2022

COD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 16.898.251/0001-75  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	36.411,30
DEPÓSITO	2.912,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.912,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858500000290 129001802202 707666200817 689825100011

EMPRESA: CONSTRUTORA HGB LTDA	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 16.898.251/0001-75	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA HGB UPA MOCOCA						INSCRIÇÃO: 900113172178		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO JAM
			BASE CAL PREV SOCIAL					
MARCOS ANTONIO BATTISTA JUNIOR	1.851,58	0,00	164.37098.15-6	24/05/2022	01		148,12	07170
MICHEL JOSE ESPEDITO BARBOSA DOS SANTOS	1.853,60	0,00	164.77845.97-1	23/05/2022	01		148,28	07170
VALTER PEREIRA DOS SANTOS	2.308,83	0,00	134.92168.77-8	29/03/2022	01		184,70	07152
								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.014,01

0,00

486,71

481,10

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000290 129001802202 707666200817 689825100011

EMPRESA: CONSTRUTORA HGB LTDA  
COMP: 06/2022 COD REC: 155  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA HGB UPA MOCOCA  
LOGRADOURO: RODOVIA PADRE DONIZETTI KM 1 0 SN  
CIDADE: TAMBÁU

COD GPS: 2208  
FPAS: 507  
OUTRAS ENT: 0079  
SIMPLES: 1  
RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: HSLFwc50GUNG0000-1  
UF: SP  
CEP: 13710-000  
BAIRRO: ZONA RURAL

Nº ARQUIVO: FQAMGADFR20000-1  
INSCRIÇÃO: 16.898.251/0001-75  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO: 9001151/2178  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	3	6.014,01	0,00	6.014,01	0,00
TOTAIS:	3	6.014,01	0,00	6.014,01	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA HGB LTDA COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 COMP: 06/2022 COD REC: 155 Nº DE CONTROLE: HSIPLWCSOGUN0000-1  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA HGB UPA MOCOCA BAIRRO: ZONA RURAL  
 LOGRADOURO: RODOVIA PADRE DONIZETTI KM 1 0 SN CEP: 13710-000 TELEFONE: 0019 3673 3021  
 CIDADE: TAMBÁU UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.128,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																							
H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 N7:	0 N8:	0 N9:	0 N10:	0 N11:	0 N12:	0 N13:	0 N14:	0 N15:	0 N16:	0 N17:	0 N18:	0 N19:	0 N20:	0 N21:	0 N22:	0 N23:	0 N24:	0 N25:	0 N26:	0 N27:	0 N28:	0 N29:	0 N30:	0 N31:	0 N32:	0 N33:	0 N34:	0 N35:	0 N36:	0 N37:	0 N38:	0 N39:	0 N40:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:	0 Q23:	0 Q24:	0 Q25:	0 Q26:	0 Q27:	0 Q28:	0 Q29:	0 Q30:	0 Q31:	0 Q32:	0 Q33:	0 Q34:	0 Q35:	0 Q36:	0 Q37:	0 Q38:	0 Q39:	0 Q40:	
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T10:	0 T11:	0 T12:	0 T13:	0 T14:	0 T15:	0 T16:	0 T17:	0 T18:	0 T19:	0 T20:	0 T21:	0 T22:	0 T23:	0 T24:	0 T25:	0 T26:	0 T27:	0 T28:	0 T29:	0 T30:	0 T31:	0 T32:	0 T33:	0 T34:	0 T35:	0 T36:	0 T37:	0 T38:	0 T39:	0 T40:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:	0 Z22:	0 Z23:	0 Z24:	0 Z25:	0 Z26:	0 Z27:	0 Z28:	0 Z29:	0 Z30:	0 Z31:	0 Z32:	0 Z33:	0 Z34:	0 Z35:	0 Z36:	0 Z37:	0 Z38:	0 Z39:	0 Z40:





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2022 - 12:47:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA HGB LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0019)36733021
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.354,97	06-OTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 16.898.251/0001-75	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 24/06/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 1.148,39	14-ENCARGOS 64,24	15-TOTAL A RECOLHER 1.212,63
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/06/2022\*\*

858200000120 126301802203 624665183815 689825100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2022 - 12:56:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA HGB LTDA				02-DDD/TELEFONE (0019)36733021
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.579,73	06-OTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 16.898.251/0001-75	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 24/06/2022

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 2.126,37	14-ENCARGOS 118,94	15-TOTAL A RECOLHER 2.245,31
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/06/2022\*\*

858300000220 453101802206 624665203816 689825100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comptroller of the Treasury  
State of Maryland

Revenue Administration

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]
